

廉政平台第二次聯繫會報

花蓮縣政府政風處
副處長吳冠雋

主持人
局長吳勁毅

花蓮縣審計室
副主任游春桃

花蓮地方檢察署
政風室主任黃雅萱

花蓮縣政府政風處
科員林侑祥

本局圖資科
科長簡哲士

本局圖資科
秘書黃子誠

本局政風室
主任賴英傑

花蓮縣審計室
課長朱宗毓

花蓮縣審計室
課長曾佳媛

本局行政科科長
科長曾俊翔

本局行政科
約用人員郭苓珊

專案管理廠商
監造高倫宇

統包廠商
經理藍灝紘

座次表

會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
10:00-10:05	5分鐘	主席致詞	主席：吳勁毅局長
10:05-10:10	5分鐘	來賓致詞	
10:10-10:15	5分鐘	上次會議決議事項執行進度	政風室
10:15-10:20	5分鐘	工程督導、材料檢驗與品質管制執行情形	行政科
10:20-10:30	10分鐘	目前工程執行進度與未來半年預計進度	統包廠商
10:30-10:40	10分鐘	各項工程文件審查情形、監造所見問題與年監造執行重點	專管廠商
10:40-10:45	10分鐘	提近半年民意調查問卷統計結果與風險態樣(案例)報告	政風室
10:45-10:55	5分鐘	提案討論	與會人員

會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
10:55-11:00	5分鐘	臨時動議	與會人員
11:00-11:05	5分鐘	主席結論	主席
11:05		散會	

主席致詞



來賓致詞



上次會議決議事項執行進度

(政風室)

項次	決議事項	辦理單位	執行情形	管制建議
1	請統包廠商定期（每季）提供施工縮時攝影檔案予行政科，剪輯成3分鐘之短片，交由圖資科上傳官網廉政平臺專區。	統包廠商 行政科 圖資科	112年第4季已上傳	解除列管
2	為強化聯繫會報各單位問題或意見反映與交流，由政風室擔任廉政平臺聯繫窗口。	政風室	依會議決議函發各與會機關單位與廠商，目前尚無反映事項。	解除列管
3	本聯繫會報定期召開之期間由每季一次變更為每半年召開。	政風室	依會議決議辦理，原則每年4月、10月召開。	解除列管
4	召開統包工程工務會議請行政科跟圖資科評估討論內容，視需要通知政風室與會，提供相關意見。	行政科 圖資科 政風室	依會議決議辦理，已配合監辦材料檢驗1次，尚無通知政風室參加工務會議之需求	解除列管

工程督導、材料檢驗與 品質管制執行情形

(行政暨文化設施科)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約工期



規劃設計期：決標日起350日

新建工程施工：機關通知日起7日內開工，計850日

取得使用執照：竣工次日起60日

完成接水送電：取得使用執照起90日

工期合計：1200日

完成建管程序合計：1350日

預計115年11月13日完成



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程規模

金額規模：8億4,542萬9,000元。

決標金額：4億2,271萬4,500元。

後續擴充金額：4億2,271萬4,500元。

契約總價金：4億2,271萬4,500元。

設計契約價金(總包價法)：2,476萬1,200元。

工程契約價金(總包價法)：3億9,995萬3,300元。

樓地板面積：約1萬3,000坪。

樓層：地上四層，地下一層。



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約執行現況

拆除工程

拆除執照：於112年5月12日取得。

拆除開工：於112年6月26日完成建物報廢程序，112年9年20日開工。

拆除完工：於112年11月4日申報竣工，113年3月4日建管解列。

新建工程

建造執照：於112年10月11日取得。

工程開工：於113年2月7日開工。

預定完工：於116年6月06日竣工，115年11年06日開放使用。

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程督導執行概況

工程督導執行概況

工程督導小組：本小組設置召集人1人，小組成員由主辦科科長、承辦人員及協辦承辦科科長、承辦人員等4人擔任。

工程督導時機：於新建工程基礎施工起每月督導1次。

擴大督導：於新建工程基礎施工起每年視工程進度節點辦理2次，邀集外關委員及本局政風單位。


花蓮縣新建圖書館統包工程 - 材料檢驗與品質管制執行情形

項次	項目	辦理情形	備註
1	混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料送審:於113年1月5日提送，1月9日廠驗試拌，1月19日核定。 2. 試驗報告:試驗結果合格，於113年4月2日備查 	
2	基礎鋼筋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料送審:於112年12月29日提送，1月8日核定 2. 材料取樣:於113年2月22日取樣，2月26日試驗 3. 試驗報告:試驗結果合格，於113年4月2日備查 	
3	鋼筋續接器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料送審:於112年12月29日提送，1月8日核定 2. 材料取樣:尚未。 3. 試驗報告:尚未。 	
4	基地混凝土澆置(大底)	<ol style="list-style-type: none"> 1.取樣日期:113年4月15日。 2.試驗報告:尚未。 	


目前工程執行進度與 未來半年預計進度

(聚全營造股份有限公司-統包廠商)


全案預定期程

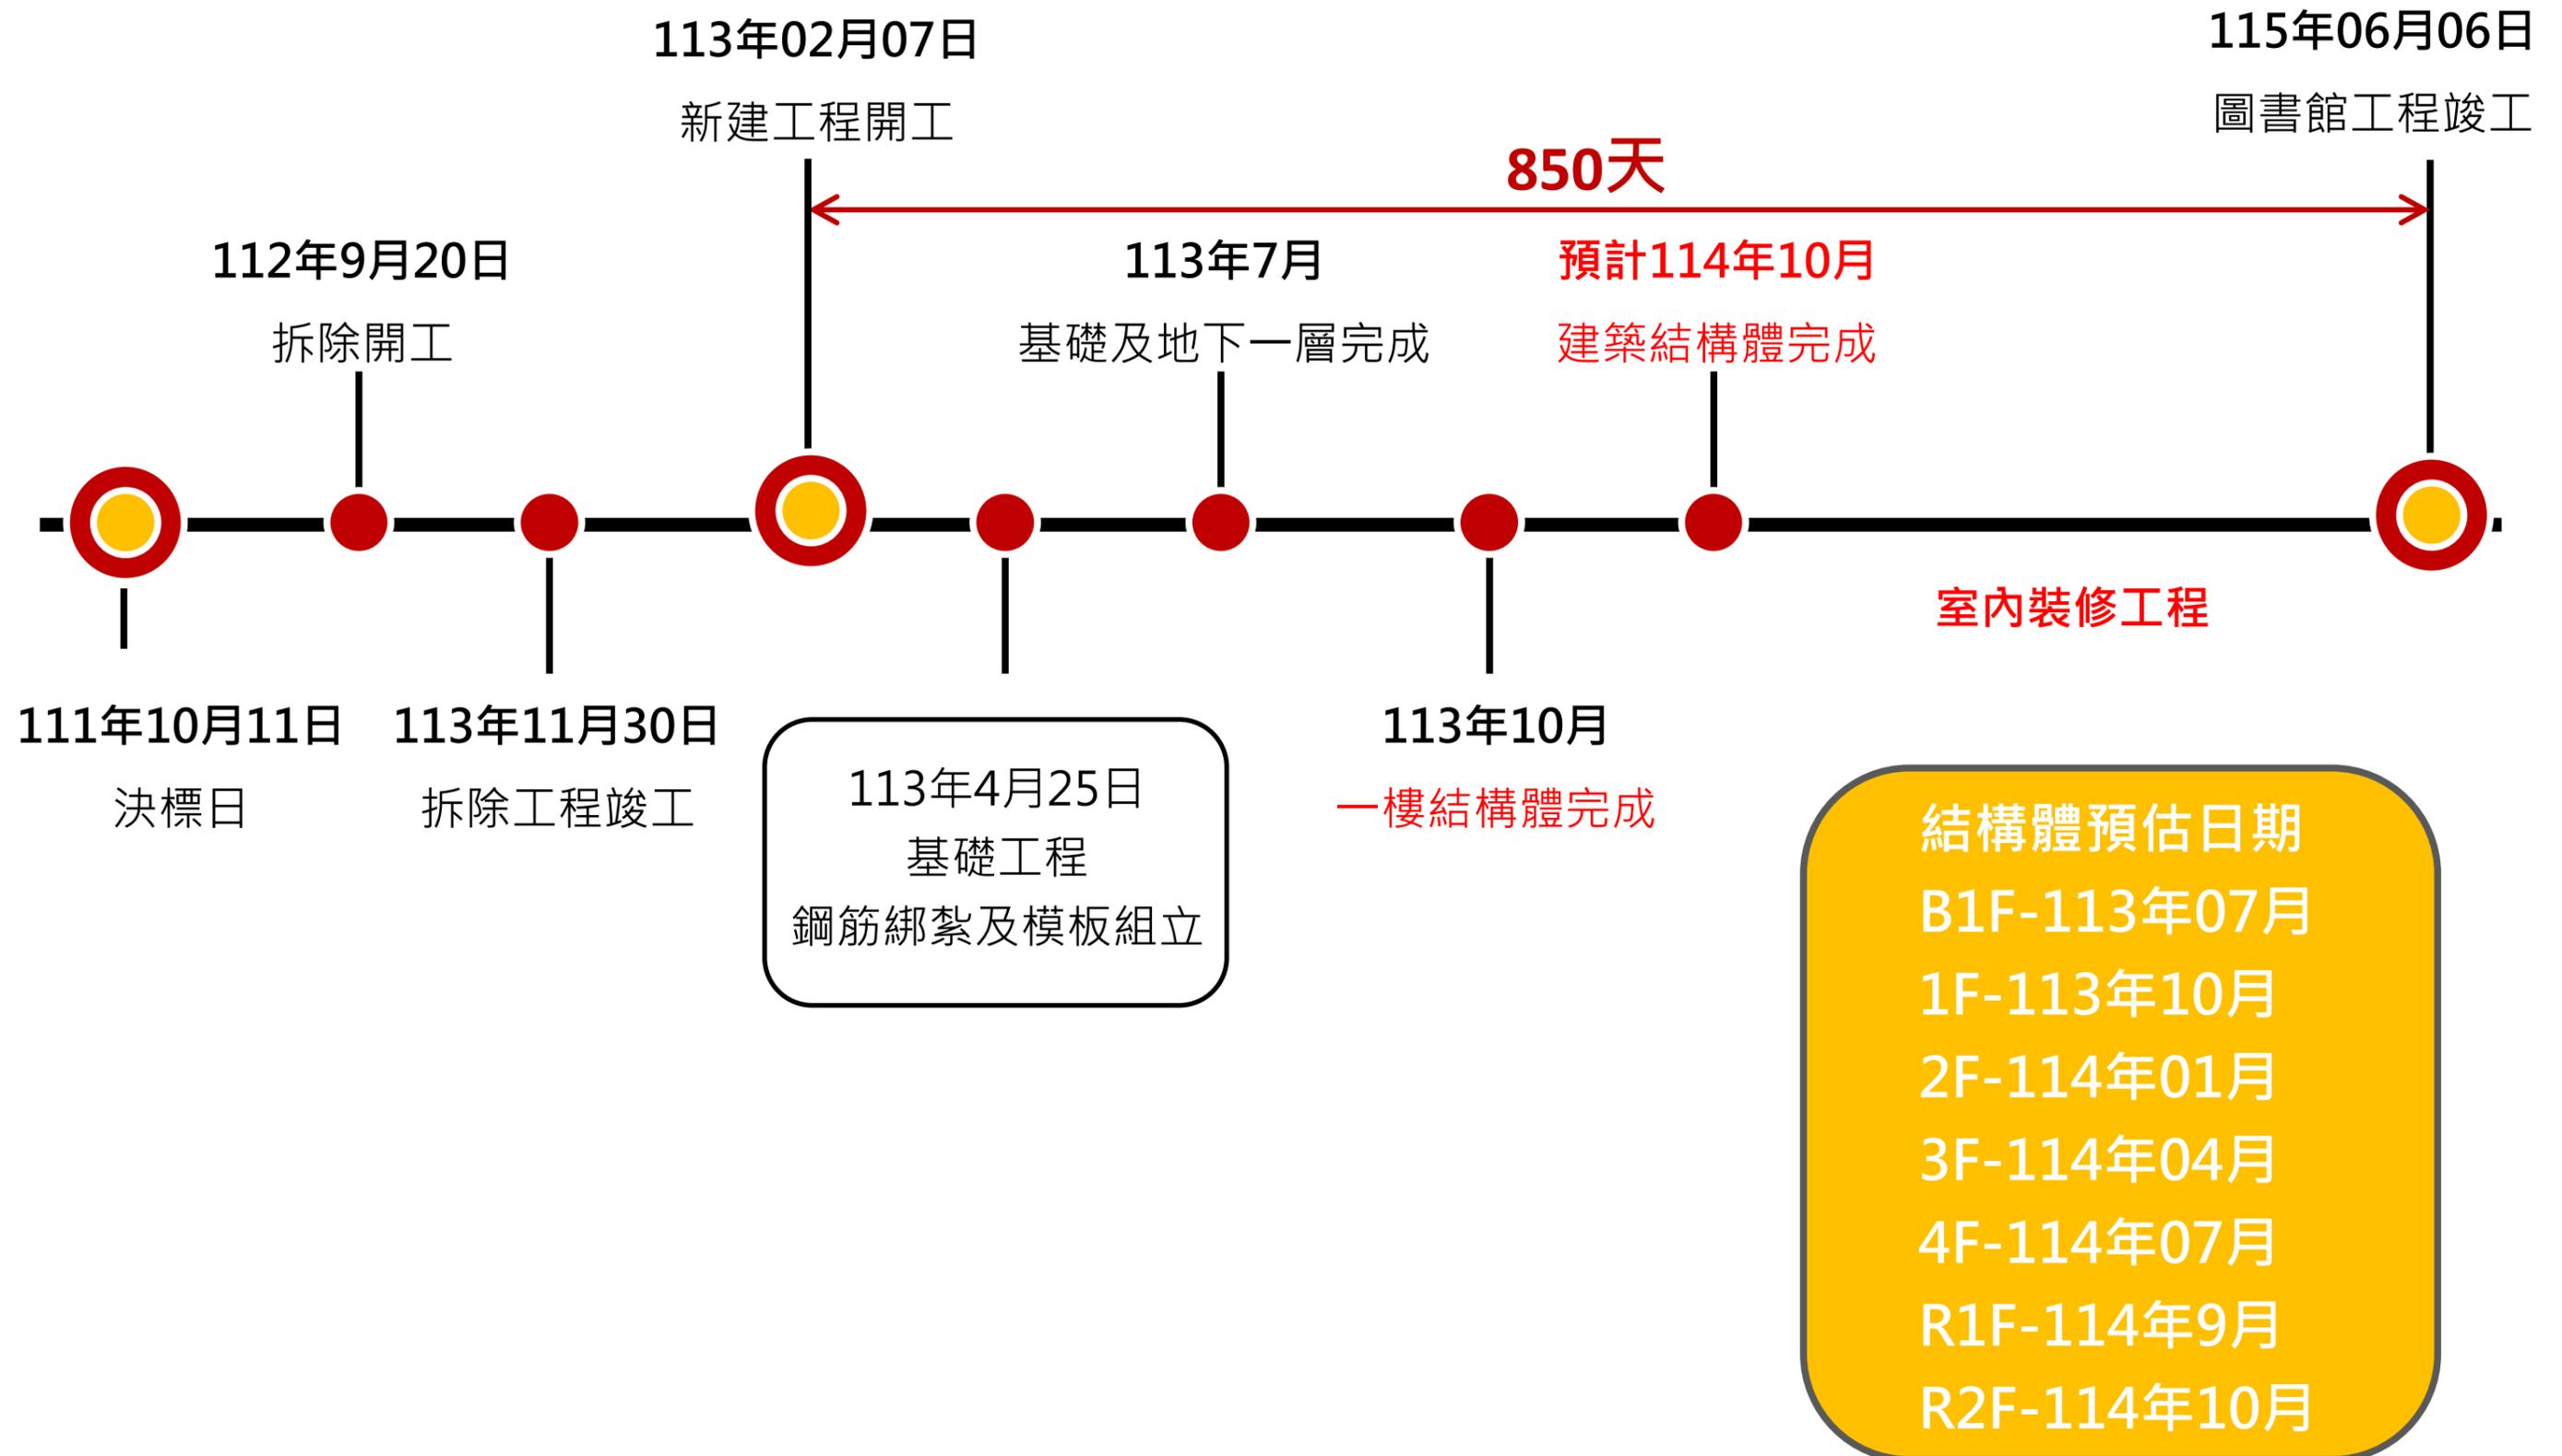

新建工程-113年02月07日至115年06月13日

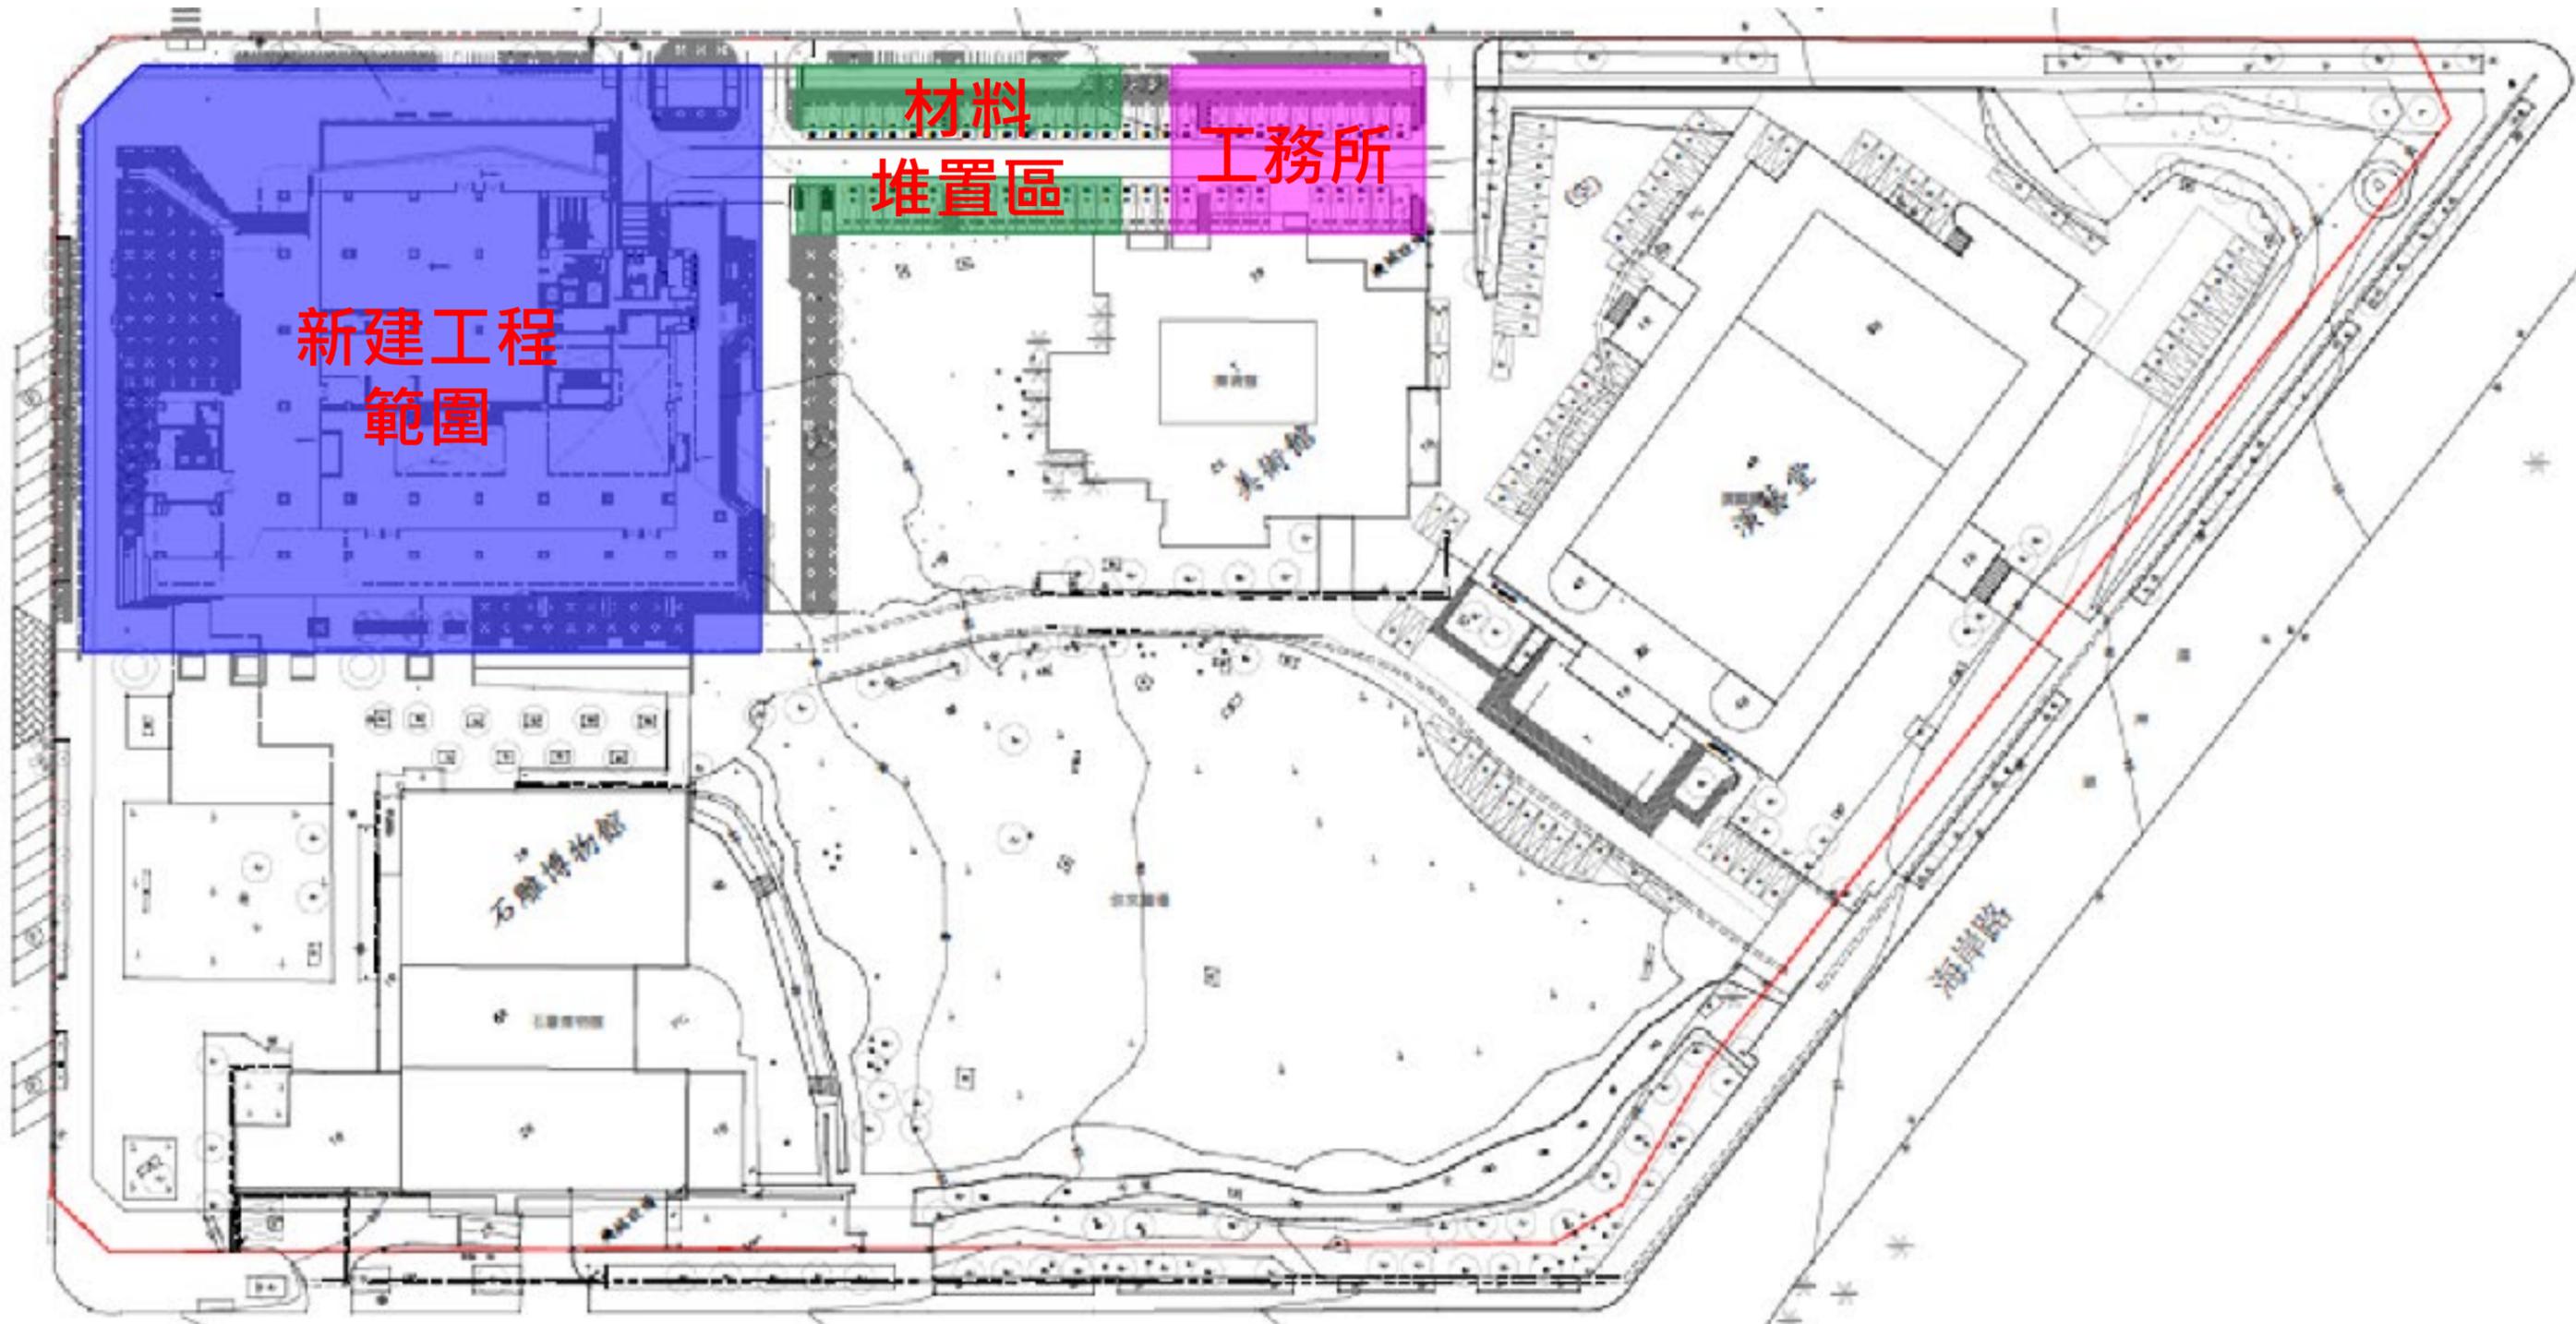

花蓮縣新建圖書館統包工程之拆除工程

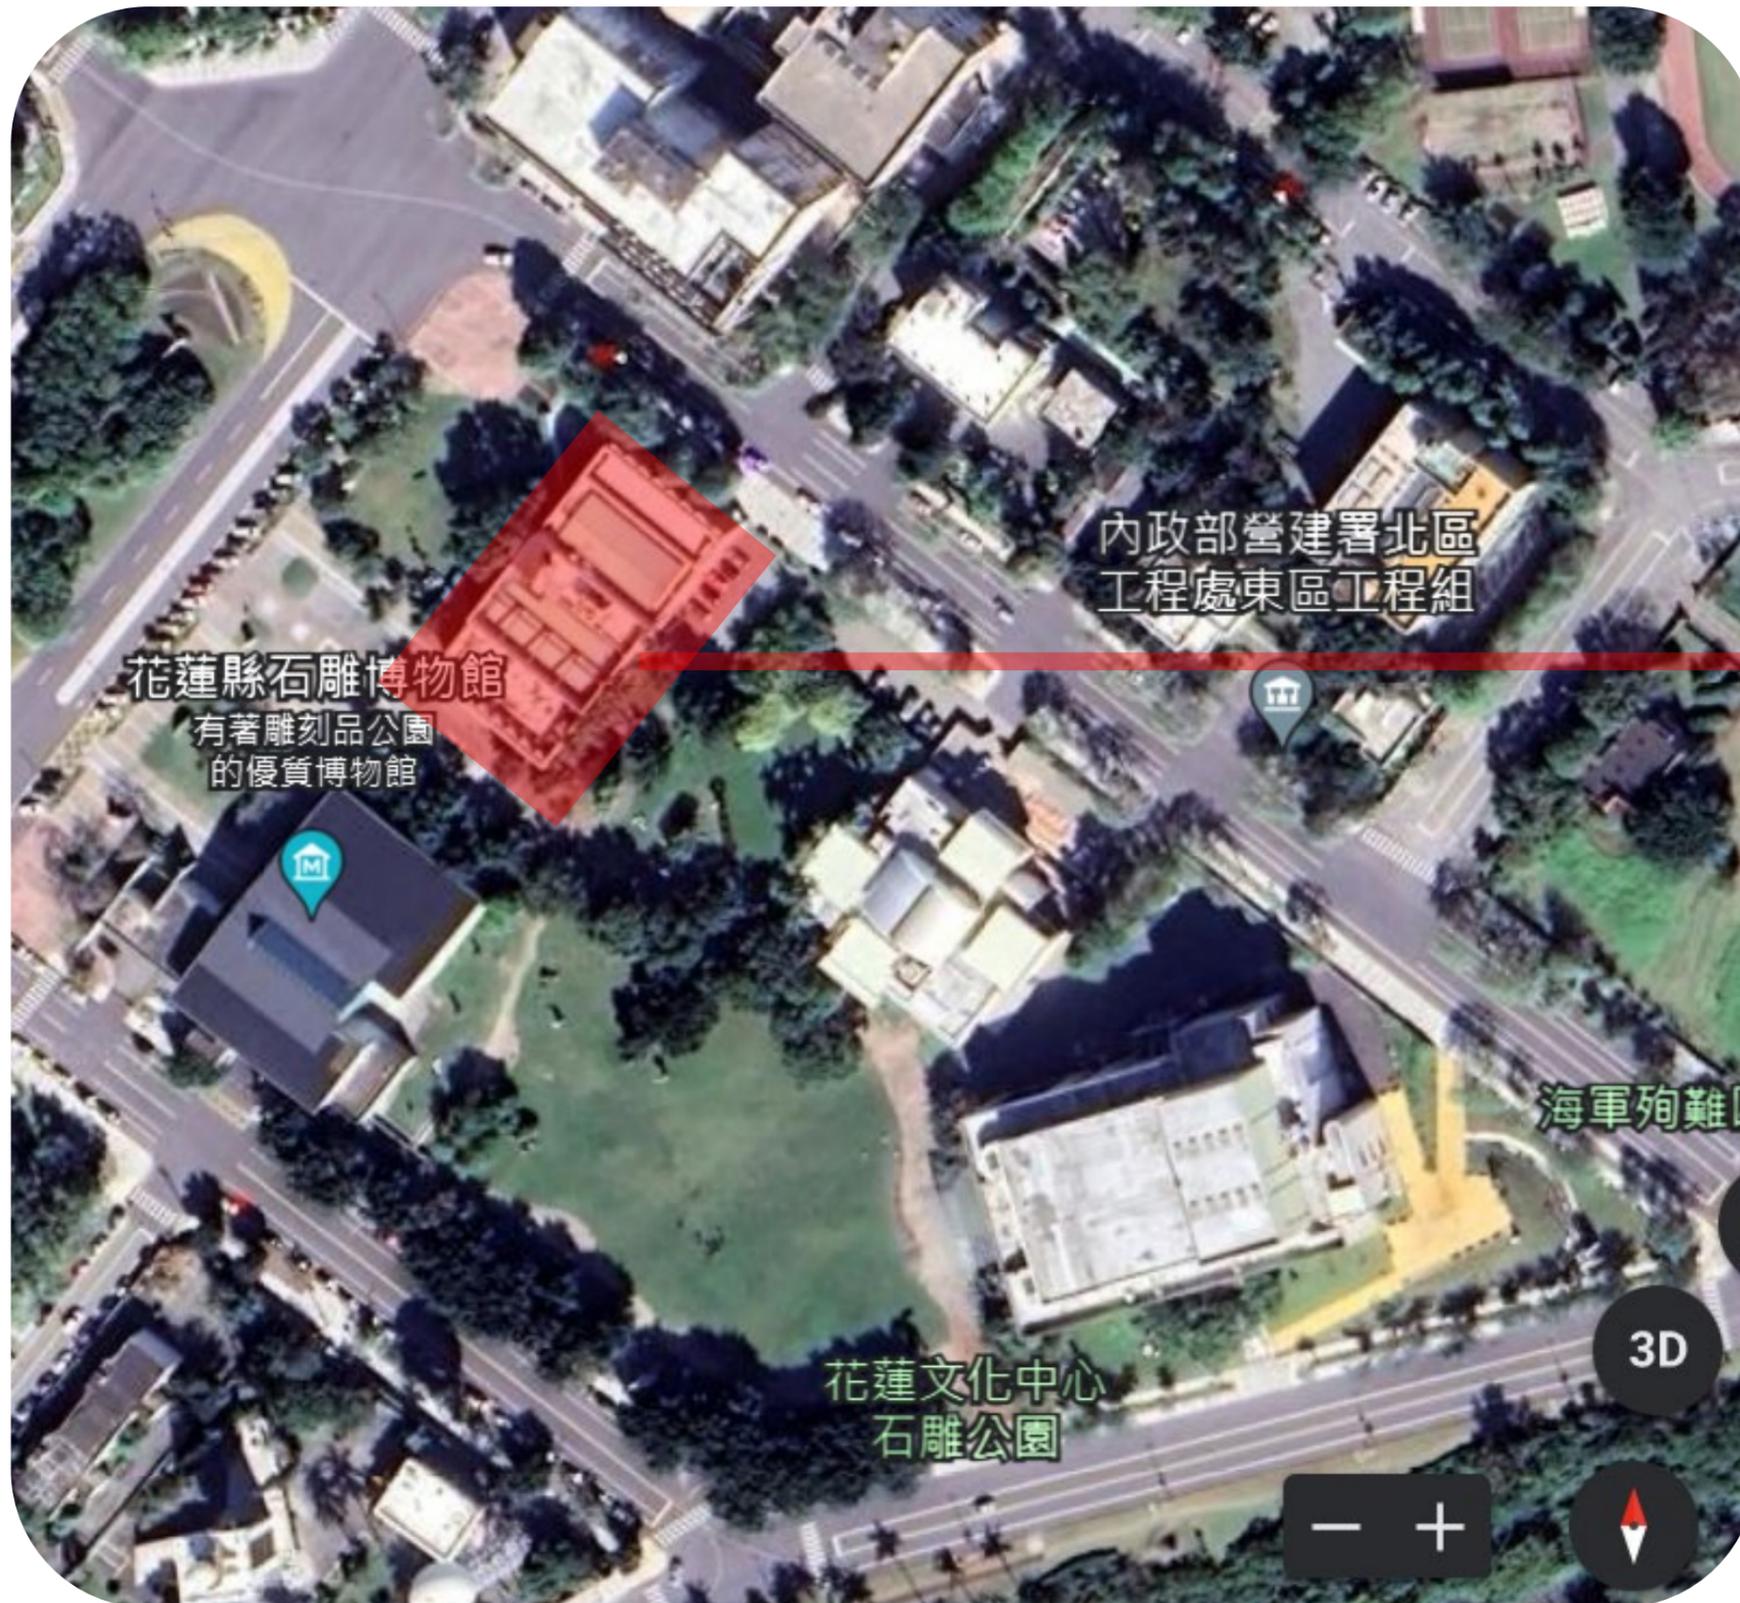


項目

- 1.開挖工程
- 2.土方工程
- 3.臨時擋土設施工程
- 4.接地工程
- 5.筏基PC打底


拆除工程-拆除工程竣工確認



開挖工程-基地放樣開挖(112/12/01~113/01/15)

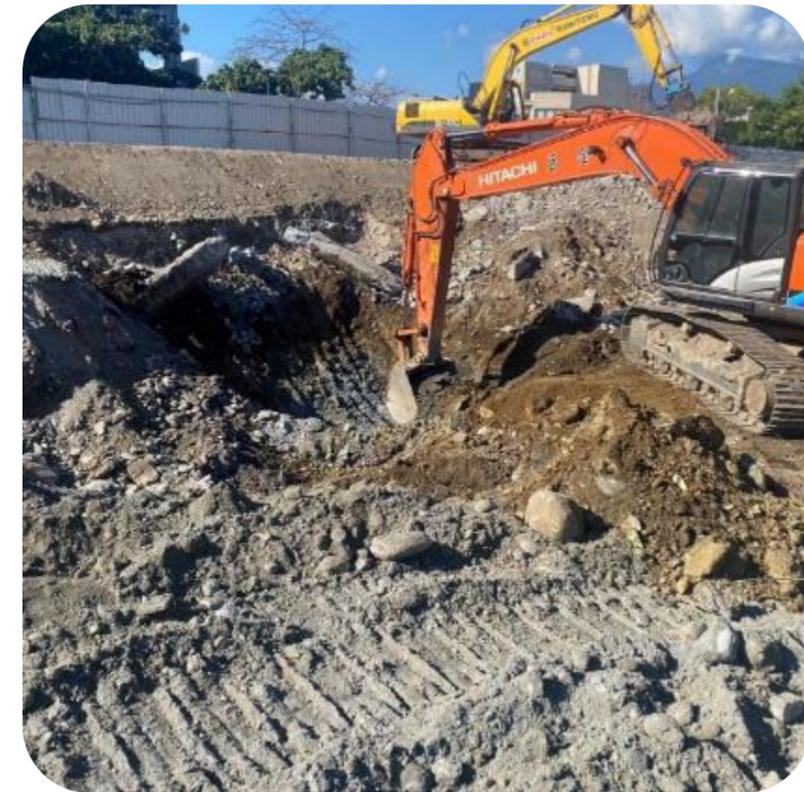

開挖工程-基地放樣開挖(113/01/16~113/02/05)

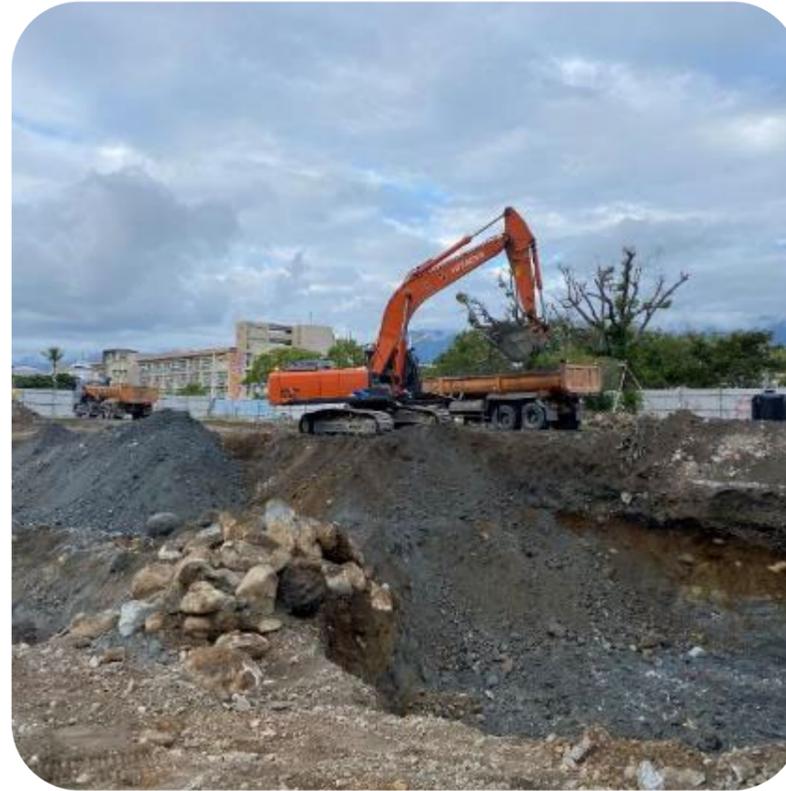

土方工程-餘土遠運(113/01/16~113/02/16)



土方工程-餘土遠運(113/02/17~113/03/19)



道路清洗



臨時抽排水



臨時擋土設施



接地工程



筏基PC打底



混凝土廠驗及廠拌取樣



混凝土試體製備
工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程
主辦機關：花蓮縣文化局
監造單位：梁貞誠建築師事務所、梁山紅建築師事務所
承包廠商：巨全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所
抽樣部位：廠拌
試驗日期：113.01.09
設計強度：140 kgf/cm²
會驗人員：王中明 王中明 王中明



混凝土試體製備
工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程
主辦機關：花蓮縣文化局
監造單位：梁貞誠建築師事務所、梁山紅建築師事務所
承包廠商：巨全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所
抽樣部位：廠拌
試驗日期：113.01.09
設計強度：280 kgf/cm²
會驗人員：王中明 王中明 王中明





鋼筋取樣



監測系統-沉陷釘測打及傾度盤裝設



混凝土圓柱試體抗壓試驗

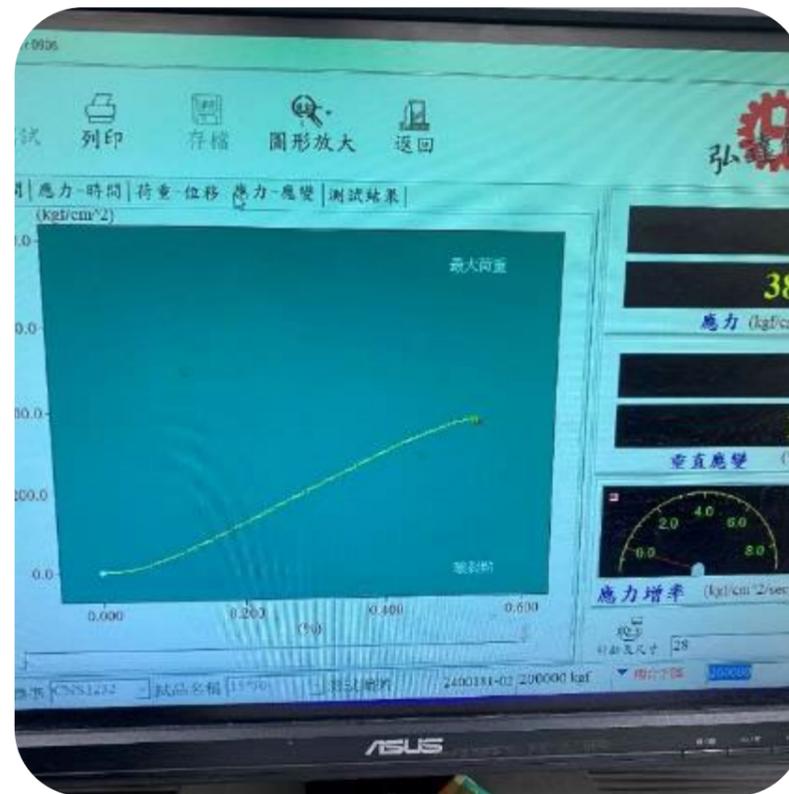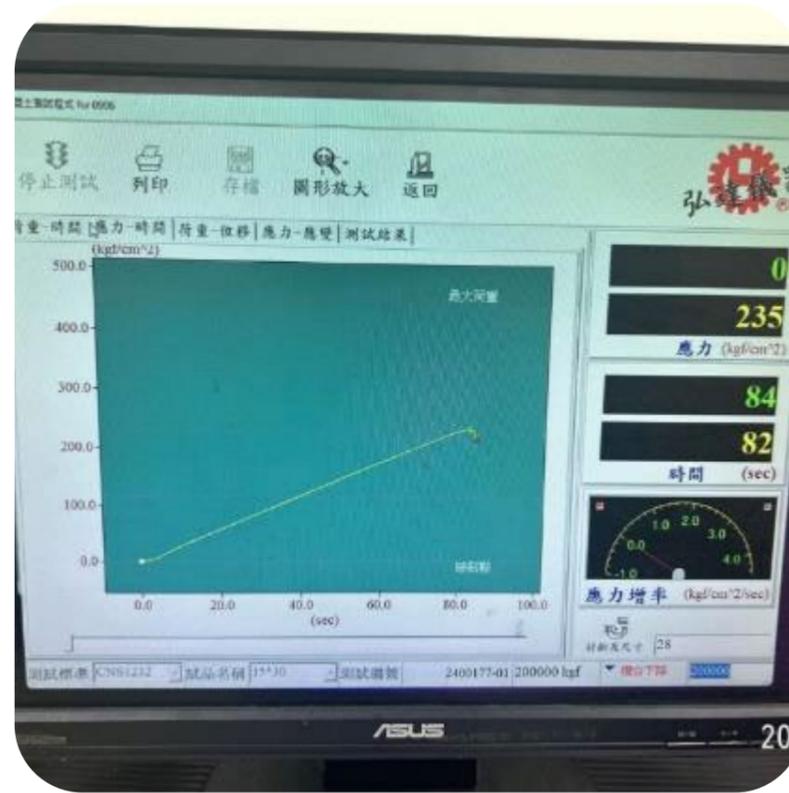

鋼筋抗拉伸、抗彎取試驗



筏基PC混凝土140kgf/cm²試體取樣



各項工程文件審查情形、 監造所見問題與年監造執 行重點

(梁貞誠建築師事務所-專案管理暨監造)

一、契約應辦事項說明

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商設計及施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	廠商提報日	有無逾期	進度說明
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	無逾期	機關同意備查
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後 20 日內 由機關於招標時載明 提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
6	地質鑽探及試驗工作計畫書		-	111.12.29	無逾期	機關同意備查
7	拆除計畫	依據核定工作執行計畫書於112.1.12	112.1.12	112.1.12	無逾期	機關同意備查
8	基本設計報告書及圖冊/ BIM基本設計報告書及模型檔	依據核定工作執行計畫書於112.2.15	112.2.15	112.2.15	無逾期	機關同意備查
9	細部設計報告書及圖冊/ BIM細部設計報告書及模型檔	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.8.5	112.7.24		審查中
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.15	112.8.15	112.8.15	無逾期	審查中
11	樹木移植計畫書			112.2.6	無逾期	機關同意備查
12	地質鑽探及試驗地基調查報告書			112.3.2	無逾期	機關同意備查
13	拆除工程分項施工計畫書	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.1	112.8.1	112.5.24	無逾期	機關同意備查
14	建造執照申辦	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.23	112.8.23	112.6.27	無逾期	已於112.10.16取得

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案
統包廠商設計階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度 說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21					111.11.24 蓮文行字第 1110012958 號	
				(111)巨圖字第 2203-1031號	貞誠公(花圖)字第 1111107001號	(111)巨圖字第 2203-1114號	貞誠公(花圖)字第 1111121002號					同意備查	
				審查中	檢退	審查中	同意核定						
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	112.07.21							112.07.28 蓮文行字第 1120007986 號	
				(112)巨圖字第 2203-0720號	貞誠公(花圖)字第 1120721001號							同意備查	
				審查中	同意核定								
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	111.11.21							111.11.24 蓮文行字第 1110012960 號	
				(111)巨圖字第 2203-1031-01號	貞誠公(花圖)字第 1111121004號							同意備查	
				審查中	同意核定								
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21					111.11.24 蓮文行字第 1110012959 號	
				(111)巨圖字第 2203-1031-02號	貞誠公(花圖)字第 1111107003號	(111)巨圖字第 2203-1114-01號	貞誠公(花圖)字第 1111121003號					同意備查	
				審查中	檢退	審查中	同意核定						
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後20日內由機關於招標時載明提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	110.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21					111.11.24 蓮文行字第 1110012957 號	
				(111)巨圖字第 2203-1031-03號	貞誠公(花圖)字第 1111107004號	(111)巨圖字第 2203-1114-02號	貞誠公(花圖)字第 1111121001號					同意備查	
				審查中	檢退	審查中	同意核定						
6	地質鑽探及試驗工作計畫書			111.12.29	112.01.05							112.01.16 蓮文行字第 1120000271 號	
				(111)巨圖字第 2203-1229號	貞誠公(花圖)字第 1120105002號							同意備查	
				審查中	同意核定								
7	拆除計畫	統包商應按契約規定於工作執行計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報拆除計畫。	依據核定工作執行計畫書於112.1.12	112.01.12	112.01.18	112.02.10	112.02.17	112.02.24	112.03.03			112.03.22 蓮文行字第 1120002222 號	
				(112)巨圖字第 2203-0112號	貞誠公(花圖)字第 1120118001號	(112)巨圖字第 2203-0210號	貞誠公(花圖)字第 1120217001號	(112)巨圖字第 2203-0224號	貞誠公(花圖)字第 1120303001號			同意備查	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定				

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商設計階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度 說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
8	基本設計報告書及圖冊/BIM 基本設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報「基本設計報告書及圖冊」。統包商應於提送基本設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.2.15	112.02.15/ 112.02.15	112.02.22	112.04.11	112.04.18					112.04.21	
				(112)巨圖字第2203-0215號/ (112)巨圖字第2203-0215-01號	貞誠公(花圖)字第1120222001號	(112)巨圖字第2203-0411號	貞誠公(花圖)字第1120418001號					蓮文行字第1120004132號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
9	細部設計報告書及圖冊/BIM 細部設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.07.24	112.08.04	112.08.14	112.08.21	112.10.27	112.11.03			112.12.29	
				(112)巨圖字第2203-0724號	貞誠公(花圖)字第1120804001號	(112)巨圖字第2203-0814號	貞誠公(花圖)字第1120821001號	(112)巨圖字第2203-1027號	貞誠公(花圖)字第1121103002號			蓮文行字第1120012080號	
				審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中			同意備查	
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。		112.08.15	112.08.22								
				(112)巨圖字第2203-0815-02號	貞誠公(花圖)字第1120822001號								
				審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中								

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度 說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
11	樹木移植計畫書			112.02.06	112.02.13	112.02.20	112.02.24					112.03.01	
				(112)巨圖字第 2203-0206號	貞誠公(花圖)字 第1120213001 號	(111)巨圖字第 2203-0220號	貞誠公(花圖)字 第1120224001 號					蓮文行字第 1120002038 號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
12	地質鑽探及試驗 地基調查報告書			112.03.02	112.03.09							112.03.22	
				(112)巨圖字第 2203-0302號	貞誠公(花圖)字 第1120309001 號							蓮文行字第 1120002390 號	
				審查中	同意核定							同意備查	
13	拆除工程分項施 工計畫書			112.05.24	112.05.30	112.06.09	112.06.16	112.07.06	112.07.13			112.08.23	
				(112)巨圖字第 2203-0524號	貞誠公(花圖)字 第1120530001 號	(112)巨圖字第 2203-0609號	貞誠公(花圖)字 第1120616001 號	(112)巨圖字第 2203-0706號	貞誠公(花圖)字 第1120713001號			蓮文行字第 1120007682 號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
14	申請建築執照			112.06.27									112.1 0.16 日取 得
				第一次圖審									



二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度 說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
15	土方工程計畫書			112.11.30	112.11.02	112.11.24	112.11.29					112.03.01	
				(112)巨圖字第 2203-103001 號	貞誠公(花圖)字 第1121102003 號	(111)巨圖字第 2203-112403 號	貞誠公(花圖)字 第1121129001 號					蓮文行字第 1120002038 號	
				審查中	檢退	審查中	檢退					同意備查	
16	拆除土方暫置計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		112.12.07	112.12.20	113.01.08	113.01.10					113.01.18	
				(112)巨圖字第 2203-120701 號	蓮文行字第 1120013789號	(112)巨圖字第 2203-010802 號	貞誠公(花圖)字 第1120110007 號					蓮文行字第 1130000437 A號	
				審查中	檢退	審查中	同意審查					同意核定	
17	整體施工計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29	113.01.31	113.02.01			113.02.06	
				(113)巨圖字第 2203-011203 號	貞誠公(花圖)字 第1130119001 號	(113)巨圖字第 2203-012203 號	貞誠公(花圖)字 第1130129003 號	(113)巨圖字第 2203-013101號	貞誠公(花圖)字 第1130201001號			蓮文行字第 1130001338 號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
18	整體品質計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29					113.02.06	
				(113)巨圖字第 2203-011204 號	貞誠公(花圖)字 第1130119002 號	(113)巨圖字第 2203-012201 號	貞誠公(花圖)字 第1130129001 號					蓮文行字第 1130001338 號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	



二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度 說明		
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆				
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號				
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形				
19	職業安全衛生管理計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.01.22	113.01.29							113.02.06			
				(113)巨圖字第 2203-012203 號	貞誠公(花圖)字第 1130129002 號									蓮文行字第 1130001338 號	
				審查中	同意核定									同意備查	
20	接地工程分項施工計畫書			113.01.26	113.02.02							113.03.08			
				(113)巨圖字第 2203-012601 號	貞誠公(花圖)字第 1130202001 號									蓮文行字第 1130001541 號	
				審查中	同意核定									同意備查	
21	土方開挖工程分項施工計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.01.22	113.01.29	113.02.05	113.02.07					113.03.06			
				(113)巨圖字第 2203-012204 號	貞誠公(花圖)字第 1130129004 號	(113)巨圖字第 2203-020501 號	貞誠公(花圖)字第 1130207002 號							蓮文行字第 1130001731 號	
				審查中	檢退	審查中	同意審查							同意備查	
22	鋼筋工程分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.04	113.03.07	113.03.11	113.03.12					113.04.02			
				(113)巨圖字第 2203-030401 號	貞誠公(花圖)字第 1130307001 號	(113)巨圖字第 2203-031101 號	貞誠公(花圖)字第 1130312004 號							蓮文行字第 1130002864 號	
				審查中	檢退	審查中	檢退							同意備查	
23	第一階段施工要徑圖及工程預定進度網圖	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.04	113.03.07	113.03.11	113.03.12					113.04.18			
				(113)巨圖字第 2203-030401 號	貞誠公(花圖)字第 1130307001 號	(113)巨圖字第 2203-031101 號	貞誠公(花圖)字第 1130312004 號							蓮文行字第 1130003458 號	
				審查中	檢退	審查中	檢退							同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度 說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
24	混凝土澆置工程 分項施工計畫 (第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.07	113.03.12							113.04.02	
				(113)巨圖字第 2203-030701號	貞誠公(花圖)字第 1120312002號							蓮文行字第 1130002860 號	
				審查中	同意核定							同意備查	
25	汛期工地防災減 災計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.08	113.03.12							113.04.16	
				(113)巨圖字第 2203-030801號	貞誠公(花圖)字第 1120312006號							蓮文行字第 1130002863 號	
				審查中	同意核定							同意核定	
26	交通安全維持 及管制計畫	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.25	113.03.27							113.04.02	
				(113)聚圖字第 2203-032501號	貞誠公(花圖)字第 1120327001號							蓮文行字第 1130003515 號	
				審查中	同意核定							同意備查	
27	安全監測分項施 工計畫	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.28	113.03.29							113.04.16	
				(113)聚圖字第 2203-032801號	貞誠公(花圖)字第 1120329002號							蓮文行字第 1130003641 號	
				審查中	同意核定							同意備查	
28	模板工程分項施 工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.04.11	113.04.12							113.04.16	
				(113)聚圖字第 2203-041103號	貞誠公(花圖)字第 1120412001號							蓮文行字第 1130004576 號	
				審查中	同意核定							同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度 說明		
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆				
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號				
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形				
29	防水工程分項施工計畫(第一版)			113.04.12	113.04.15							113.04.18			
				(113)聚圖字第2203-041201號	貞誠公(花圖)字第1130415003號									蓮文行字第1130004626號	
				審查中	同意核定									同意備查	
30	施工架工程分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.04.12	113.04.15							113.04.18			
				(113)聚圖字第2203-041202號	貞誠公(花圖)字第1130415004號									蓮文行字第1130004627號	
				審查中	同意核定									同意備查	

結論說明:本案自開工111/10/11起除每月月報外統包商共計辦理 **30項** 契約應辦事項目前共有 **0件** 逾期提送、 **24件**核定後機關同意備查、 **建築執照**已於112年10月16日取得。細部設計等 **2件**持續辦理中。



未來半年監造執行重點

(一) 113.04.20~05.07 筏基礎板跟外圍模板

(二) 113.05.08~05.11 大底澆置+養護

(三) 113.05.12~05.27 地樑鋼筋綁紮及模板組立工程

(四) 113.05.28 筏基牆身澆置

(五) 113.05.29~06.13 模板、土方工程

(六) 113.06.14~06.29 筏基頂板地樑鋼筋綁紮及模板組立工程

(七) 113.07.01~07.07 筏基頂板澆置

(八) 113.07.08~07.18 B1F鋼筋綁紮及模板組立工程

(九) 113.07.19~07.21 B1F澆置

(十)113年10月前(依申請抽查驗時程辦理) 1F鋼筋綁紮、模板組立、澆置等



施工照片查驗紀錄表

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

日期：113.2.22

花蓮縣新建圖書館統包工程

監造計畫

表 5-6 材料設備品質(試)驗紀錄表

材料設備品質(試)驗紀錄表

工程名稱	花蓮縣新建圖書館統包工程		
材料設備名稱	竹節鋼筋 SD420W	供料廠商	旭悅鋼鐵有限公司
進場日期	113.1.16~113.1.17	進場數量	256.08T
材料設備出廠應提供證明文件	出貨單、地磅單、出貨裝車明細表、無放射性污染證明書、材質證明書(出廠證明書)		
材料堆置地點	工區東側(材料堆放處)		
材料設備契約規範	CNS560		
查驗方式	<input type="checkbox"/> 駐廠檢驗 <input type="checkbox"/> 型錄樣品審核 <input type="checkbox"/> 工地現場檢驗 <input checked="" type="checkbox"/> 材料試驗室檢驗 <input type="checkbox"/> 書面審核 <input type="checkbox"/> 其他：		
取樣	取樣數量：D16-4支, D25-1支 合計5支 樣品保存或養護地點： 取樣日期：113.2.22 送樣日期：113.2.22 試驗日期：113.2.26 會驗人員：孟幼明 混凝土澆置位置：		
試驗機構名稱	世昌檢驗科技有限公司	試驗報告編號	24S01007
試驗項目及數據	<input checked="" type="checkbox"/> 如試驗報告 <input type="checkbox"/> 其他：		
抽驗結果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格同意使用 <input type="checkbox"/> 不合格隔離退貨 <input type="checkbox"/> 數量不足 <input type="checkbox"/> 材料堆置場所不良 <input type="checkbox"/> 其他：	備註	

監造主任簽名：


孟幼明

監造現場人員簽名：

潘秉廷

備註：

1. 材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。
2. 委外試驗須檢附試驗報告。

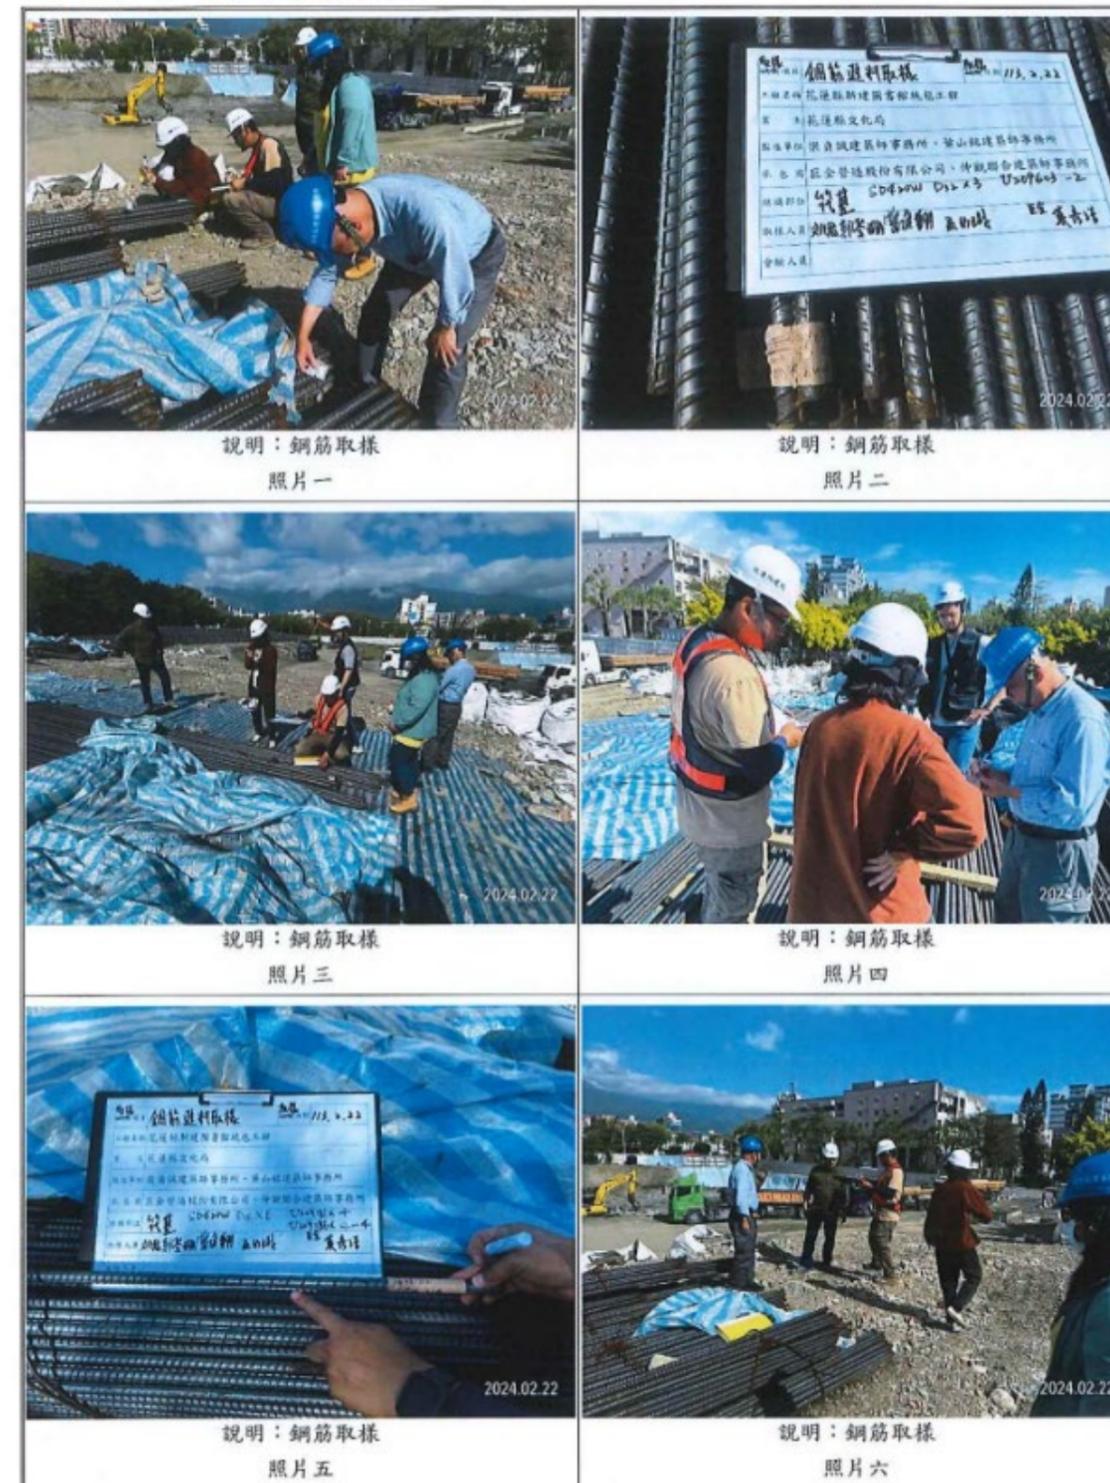

備註：本表示適用於各項施工查驗表單之佐證資料，並由監造工地現場人員實地檢查後嚴實記載簽認。

施工照片查驗紀錄表

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

日期：113.04.15

花蓮縣新建圖書館統包工程

監造計畫

表 7-9 混凝土工程施工抽查紀錄表

混凝土工程施工抽查紀錄表

編號：

第3組4車
KET-2971

工程名稱	花蓮縣新建圖書館統包工程		
分項工程名稱	PC 澆置		
抽查位置	建物開挖後PC澆置	檢查日期	113年4月15日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查結果	<input checked="" type="checkbox"/> 抽查合格 <input type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	高程標誌設置	使用標高器1.5m一支	是 0
施工中	混凝土強度是否符合	設計強度140kg/cm ²	是 0
	混凝土坍度	15cm±4cm	15cm 0
	氯離子含量	0.15kg/m ³ 以下	0.019 0
	溫度	13-32度	27.5 0
	試體取樣	每100m ³ 製作1組4個試體	是 0
	澆置方法、澆置順序	如澆置計畫書	是 0
	輸送管末端軟管之移送	避免損壞排架之鋼筋	無鋼筋 0
	混凝土出廠至澆置完成時間	90分鐘以內澆置完成	90分鐘以內完成 0
	使用振動器充分搗實	配置二台以上5-10秒/處	是 0
澆置過程不可任意加水	不得加水	無加水 0	
施工縫設置位置	應力小處、設凸榫	是 0	
施工後	澆置後養護	不織布覆蓋灑水養護	是 0

缺失複查結果：
 已完成改善 (檢附改善前中後照片)
 未完成改善，填至「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： 簽名：

備註：
 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。
 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後嚴實記載簽認。
 4. 檢查項目註記「▲」者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。

監造主任簽名：

孟幼琳
0415

監造現場人員簽名：

潘雲廷



備註：本表示適用於各項施工查驗表單之佐證資料，並由監造工地現場人員實地檢查後嚴實記載簽認。

表 7-13 避雷接地工程施工抽查紀錄表

避雷接地工程施工抽查表

編號：

工程名稱	花蓮縣新建圖書館統包工程		
分項工程名稱	接地系統		
抽查位置	全場接地	檢查日期	113年4月12日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查結果	<input checked="" type="radio"/> 抽查合格 <input type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	承商是否辦理自主檢查	承商有無檢附自主檢查表	有 0
	接地材料是否合格	600*600*15mm 3/4" x 10' 銅棒	0
施工中	接地棒埋設位置放樣	間距 ≥ 5M > 5m	0
	埋設深度	垂直埋入雙接地棒頂部 銅棒 3m 銅板 1.5m	0
施工後	避雷接地電阻測試	≤ 10 Ω	8 0
	低壓系統接地電阻測試	≤ 10 Ω	9 0
	台電系統接地電阻測試	≤ 10 Ω	7.2 0
	電信系統接地電阻測試	≤ 10 Ω	6.8 0
	發電機系統接地電阻測試	≤ 10 Ω	6.8 0
	資訊接地電阻測試	≤ 5 Ω	2.4 0

缺失複查結果：
 已完成改善 (檢附改善前中後照片)
 未完成改善，填至「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： 簽名：

備註：
 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。
 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
 4. 檢查項目註記"▲"者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。

監造主任簽名：

孟幼琳
0412

監造現場人員簽名：

齊倫宇
0412

施工照片查驗紀錄表

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

日期：113.04.12




備註：本表示適用於各項施工查驗表單之佐證資料，並由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

提近半年民意調查問卷統計 結果與風險態樣(案例)報告 (政風室)


性別

109 則回應




年齡

109 則回應




職業

109 則回應




您是否支持本局成立機關採購廉政平臺?

109 則回應




您是否清楚本局已於官網設置工程廉政平臺專區?

109 則回應




您是否願意於廉政平臺專區獲取工程最新資訊 (包括工程施工進度、會議紀錄、工程督導紀錄等) ?

109 則回應




您是否同意重大公共工程成立廉政平臺能降低外力不當干涉?

109 則回應




您是否同意重大公共工程成立廉政平臺能提昇工程整體品質?

109 則回應



如遇公務員涉犯貪瀆不法案件，是否願意向政風機構檢舉反映？

109 則回應



其他建議事項	處置建議
<p>1. 廉政平臺是否能完整反映真實狀況是其重點，如何能有效地提供第三方，甚至其他專業單位(或學術機構)之檢驗，方能求得真實。</p>	<p>依實施計畫落實持續推動各項工作，定期檢視公開資訊與蒐集民眾意見，提供承辦單位與施工廠商參考。</p>
<p>2. 對於圖書館內部設計，尤其是民眾閱覽區的設計，希望有民眾可以提供意見的機會。</p>	<p>提案問卷調查增加開放性問題選項，廣泛蒐集使用者對閱覽區之期望與需求，供設計廠商參考。</p>

政風室

(風險案例報告)

驗收不存在的燈飾 宜蘭縣前科員涉偽造驗收證明遭起訴

2024-04-18 17:19 聯合報 / 記者陳敬丰 / 宜蘭即時報導

分享 0



宜蘭縣政府前莊姓科員2017、2018年間，負責節慶氛圍營造的燈飾工程，疑因管理不善，要驗收時燈飾已經拆光了，涉嫌偽造證明書，驗收不存在的燈飾後請款。宜蘭地檢署日前偵結，依偽造文書等罪起訴莊男與另外2名縣府人員，並依違反政府採購法起訴廠商3人；縣府表示，尊重司法調查。

起訴書指出，莊男2014年到2019年間擔任工商旅遊處科員，2017年負責辦理「106年度宜蘭縣節慶氛圍營造（燈飾）工程」，製作耶誕節與年節燈飾，分為溪南溪北兩地區執行，總預算700萬元，溪北地區由錢姓女子的公司得標，溪南地區則由李姓男子、張姓男子合開的公司得標。



**各期估驗計價請確實核對
完工項目**



提案討論

提案一

案由：問卷調查新增題項，供民眾針對「民眾閱覽區」留言提出使用需求之期許。

提案單位：政風室

說明：

- 一、為回應民眾問卷調查反映事項，建請於調查問卷新增開放式題項，供使用者針對「民眾閱覽區」之使用需求提供開放留言，廣泛蒐集民眾建議供設計廠商參考。
- 二、建請設計廠商於「民眾閱覽區」設計圖定稿，經本局核定後上傳廉政平臺專區，供民眾先行閱覽。

辦法：

由政風室於網路問卷新增題項「請問您對於圖書館之民眾閱覽區的設計有什麼期許或需求？」定期將民眾留言彙整供行政科轉交設計廠商參考，設計圖經本局核定後，由行政科上傳官網廉政平臺專區。

提案二

案由：建議於官網廉政平臺專區公開各項材料檢驗測試報告。

提案單位：政風室

說明：

一、鑑於近日花蓮地區地震發生頻繁，民眾對於建築結構之重視日益關切，建請本案工程各項材料檢驗報告於機關核定後，上傳廉政平臺專區供民眾閱覽，以建立民眾對新建圖書館結構之信任，並持續推動本平臺公開透明之良善措施。

辦法：

建請行政科接獲廠商各項材料檢驗報告，審查合格無誤經核定後上傳官網廉政平臺專區。

臨時動議

會議結束
