

廉政平台第三次聯繫會報

主持人
局長吳勁毅

花蓮地方檢察署
政風室主任黃雅萱

花蓮縣政府政風處
科長張以立

花蓮縣政府政風處
專員黃正忠

本局圖資科
科長簡哲士

本局圖資科
秘書黃子誠

本局政風室
主任賴英傑

統包廠商
經理余成萬

統包廠商
品管彭彥宇

花蓮縣審計室
課長朱宗毓

花蓮縣審計室
稽察張劉權

本局行政科科長
科長曾俊翔

本局行政科
約用人員郭苓珊

專案管理廠商
專案經理林清輝

專案管理廠商
監造王泯元

座次表


會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
14:00-14:05	5分鐘	主席致詞	主席：吳勁毅局長
14:05-14:10	5分鐘	來賓致詞	
14:10-14:15	5分鐘	上次會議決議事項執行進度	政風室
14:15-14:20	5分鐘	工程督導、材料檢驗與品質管制執行情形	行政科
14:20-14:30	10分鐘	目前工程執行進度與未來半年預計進度	統包廠商
14:30-14:40	10分鐘	各項工程文件審查情形、監造所見問題與年監造執行重點	專管廠商
14:40-14:45	10分鐘	提近半年民意調查問卷統計結果與廉政平臺之推動說明	政風室、政風處
14:45-14:55	5分鐘	提案討論	與會人員


會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
14:55-15:00	5分鐘	臨時動議	與會人員
15:00-15:05	5分鐘	主席結論	主席
15:05		散會	

主席致詞



來賓致詞



上次會議決議事項執行進度


(政風室)

項次	決議事項	辦理單位	執行情形	管制建議
1	廉政平臺專區民意問卷調查新增題項，供民眾針對「民眾閱覽區」留言提出使用需求之期許。	政風室	網路民調問卷已新增開放式留言欄位	解除列管
2	請統包廠商將民眾閱覽區之設計圖與3D模型稍作調整，參考預售屋常見的標示方式製作民眾易於理解的配置圖，供民閱覽後提供意見。	統包廠商 行政科	已上傳廉政平臺專區	解除列管
3	請於官網廉政平臺專區公開各項材料檢驗測試報告，前次細部設計時，針對結構的設計有一張比較淺顯易懂的概念圖，亦可一併公開，讓民眾知悉結構的設計方式。	行政科	已上傳廉政平臺專區	解除列管

工程督導、材料檢驗與 品質管制執行情形

(行政暨文化設施科)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約工期

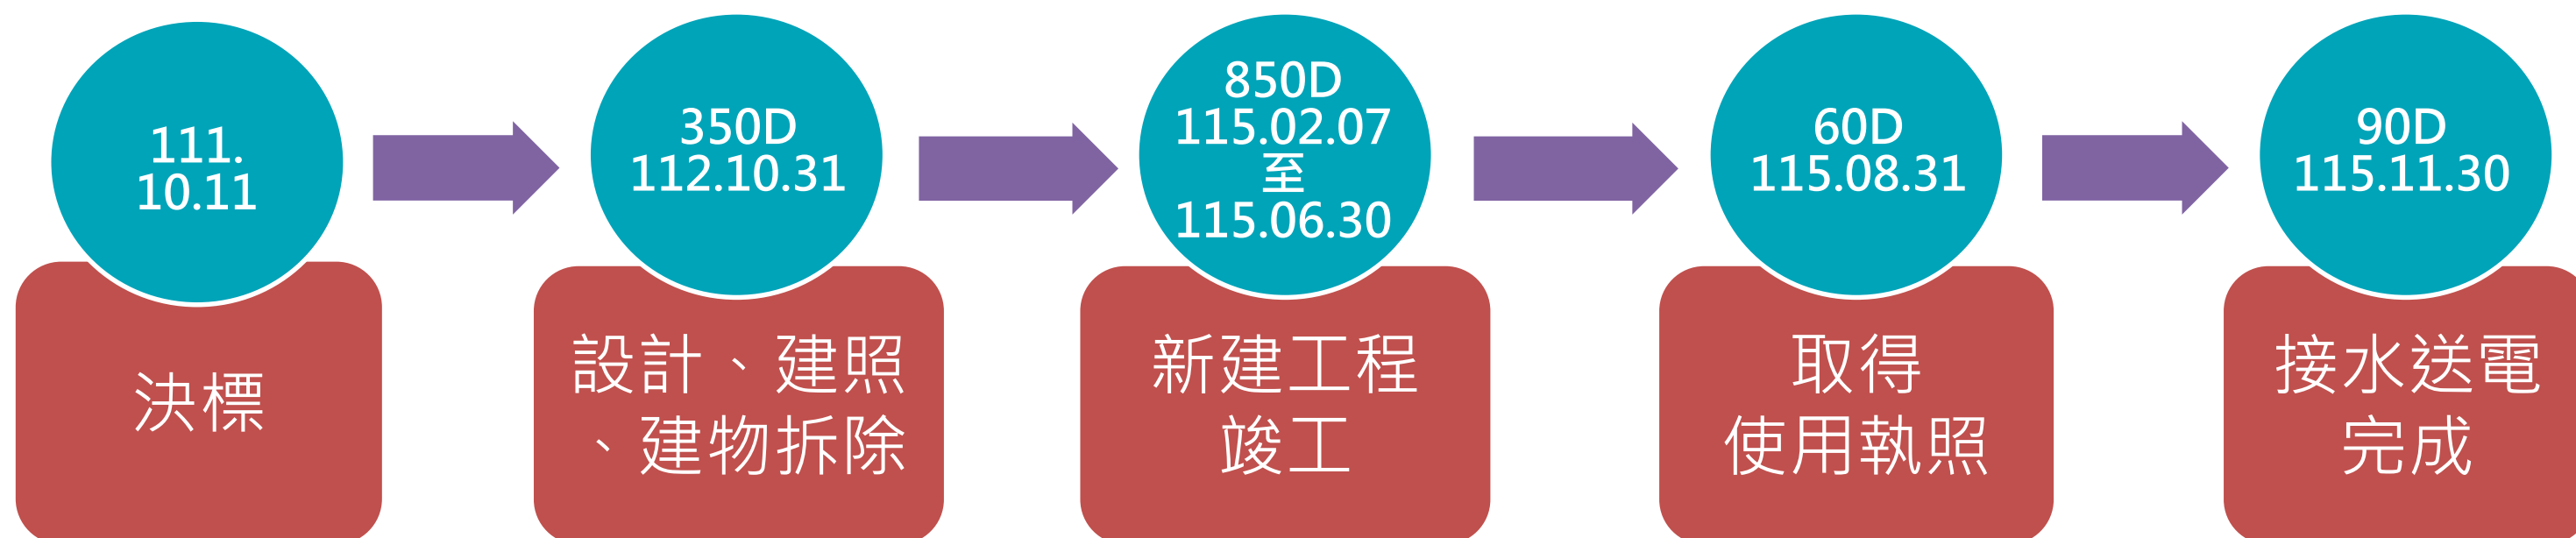

規劃設計期：決標日起350日

新建工程施工：機關通知日起7日內開工，計850日

展延及不計工期：25日(國定連假及自然災害)

取得使用執照：竣工次日起60日

完成接水送電：取得使用執照起90日

工期合計：1200日

完成建管程序合計：1350日

預計115年11月30日完成



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程規模

金額規模：8億4,942萬9,000元。

決標金額：4億2,471萬4,500元。

後續擴充金額：4億2,471萬4,500元。

契約總價金：4億2,471萬4,500元。

設計契約價金(總包價法)：2,476萬1,200元。

工程契約價金(總包價法)：3億9,995萬3,300元。

樓地板面積：約1萬3,000坪。

樓層：地上四層，地下一層。



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約執行現況

拆除工程

拆除執照：於112年5月12日取得。

拆除開工：於112年6月26日完成建物報廢程序，112年9月20日開工。

拆除完工：於112年11月4日申報竣工，113年3月4日建管解列。

新建工程

建造執照：於112年10月11日取得。

工程開工：於113年2月7日開工。

預定完工：於116年6月30日竣工，115年11月30日開放使用。

契約累計撥款：1億0,225萬9,788 元。

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程督導執行概況

工程督導執行概況

- 工程巡查36次。
- 工程督導4次。
- 工程協調會報6次(工務會議)。
- 品質抽查驗會同16次(混凝土廠驗1次及現場澆置4次、鋼筋取樣5次、施工檢驗停留點7次)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 材料檢驗與品質管制執行情形

項次	項目	辦理情形	備註
1	混凝土	1. 113年1月取樣(廠拌)-80、140、280kgf/cm。 2. 113年4月取樣(PC)-140kgf/cm。 3. 113年5月取樣(筏基礎板)-280IIkgf/cm。 4. 113年6月取樣(BS版)-280IIkgf/cm。 5. 113年9月取樣(地下室)-280IIkgf/cm。	
2	鋼筋	1. 113年4月取樣(基礎)-SD420W。 2. 113年6月取樣(BS版)-SD420W。 3. 113年7月取樣(地下室)-SD420W。 4. 113年9月取樣(一樓)-SD420W。	
3	鋼筋續接器	1. 113年5月取樣(地下室至一樓)-續接器。 2. 113年9月取樣(一樓至二樓)-續接器。	
4	密度試驗	1. 113年5月試驗(車道)。	


花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程查核情形

項次	日期	單位	查核結果	備註
1	113/06/03	花蓮縣政府	1. 查核分數78分(乙等)。 2. 專案管理暨監造單位扣5點、統包廠商扣6點。 3. 經2次提送改善對策，於113年8月30日經縣府備查。	
2	113/10/09	教育部	1. 查核分數75分(乙等)。 2. 專案管理暨監造單位扣7點、統包廠商扣7點。 3. 訂於113年12月2日前完成改善提報教育部。	

目前工程執行進度與 未來半年預計進度


(聚全營造股份有限公司-統包廠商)

全案預定期程

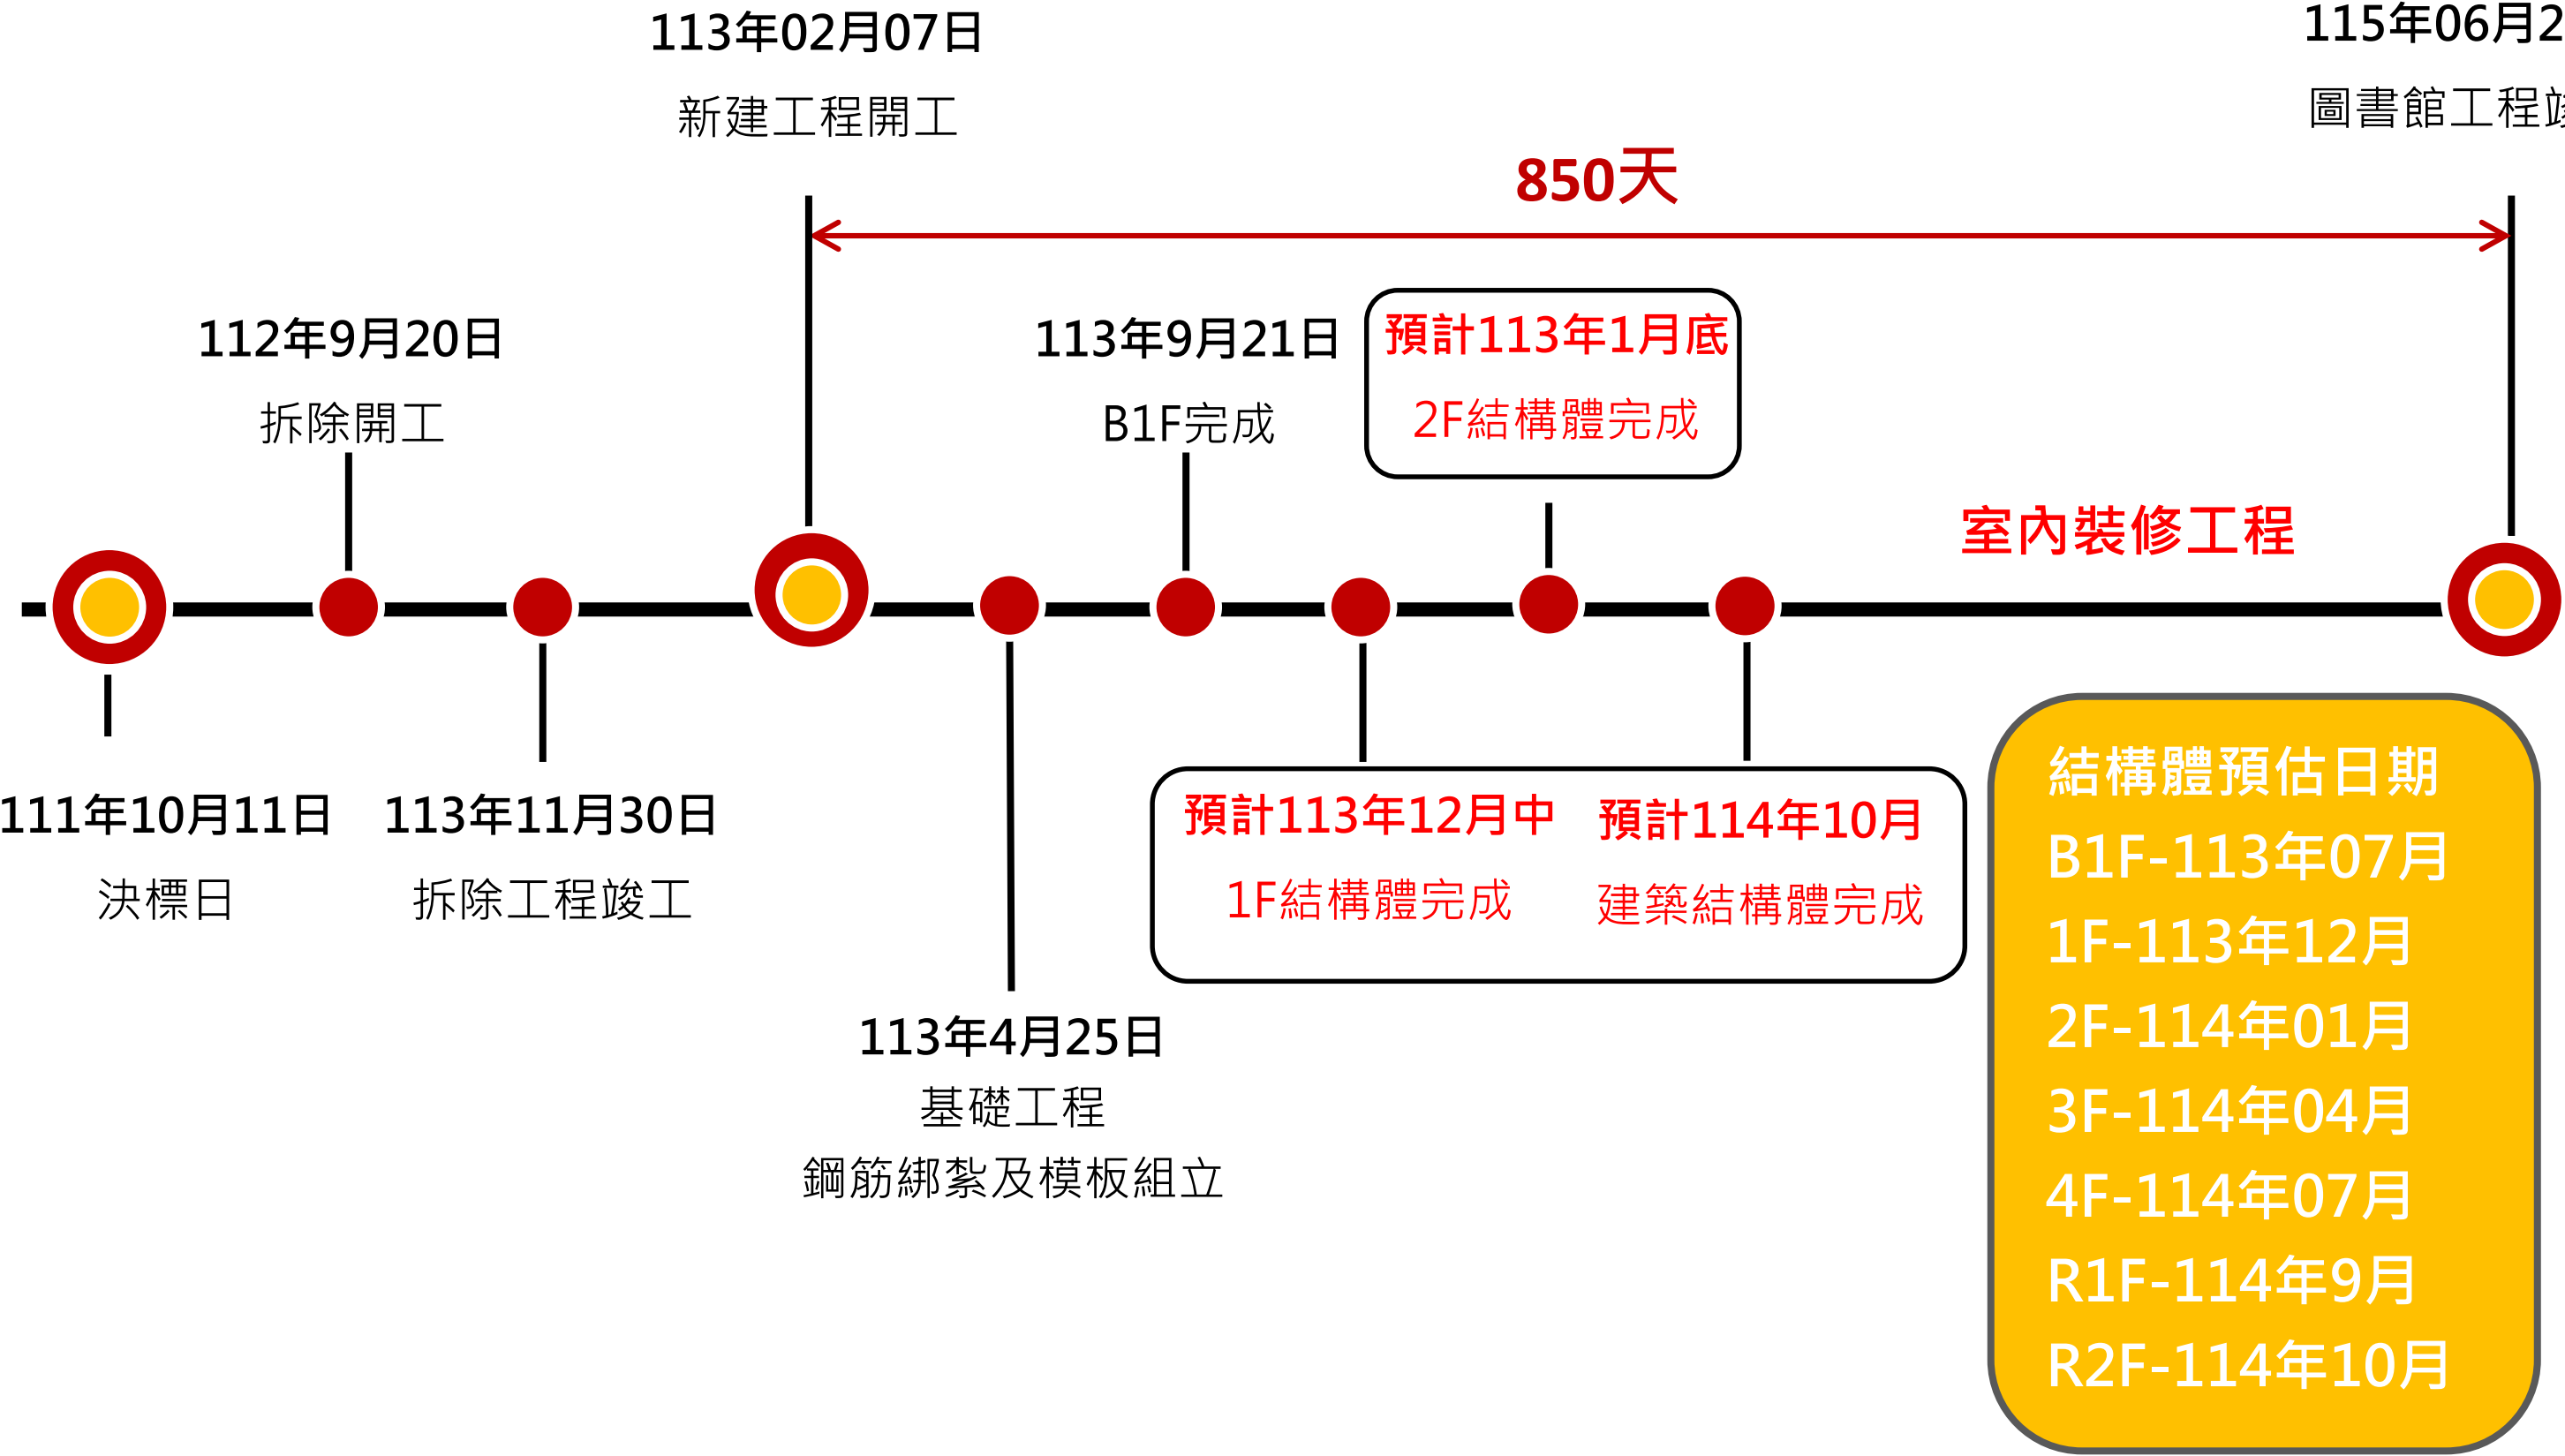


新建工程工期

工程期限：144

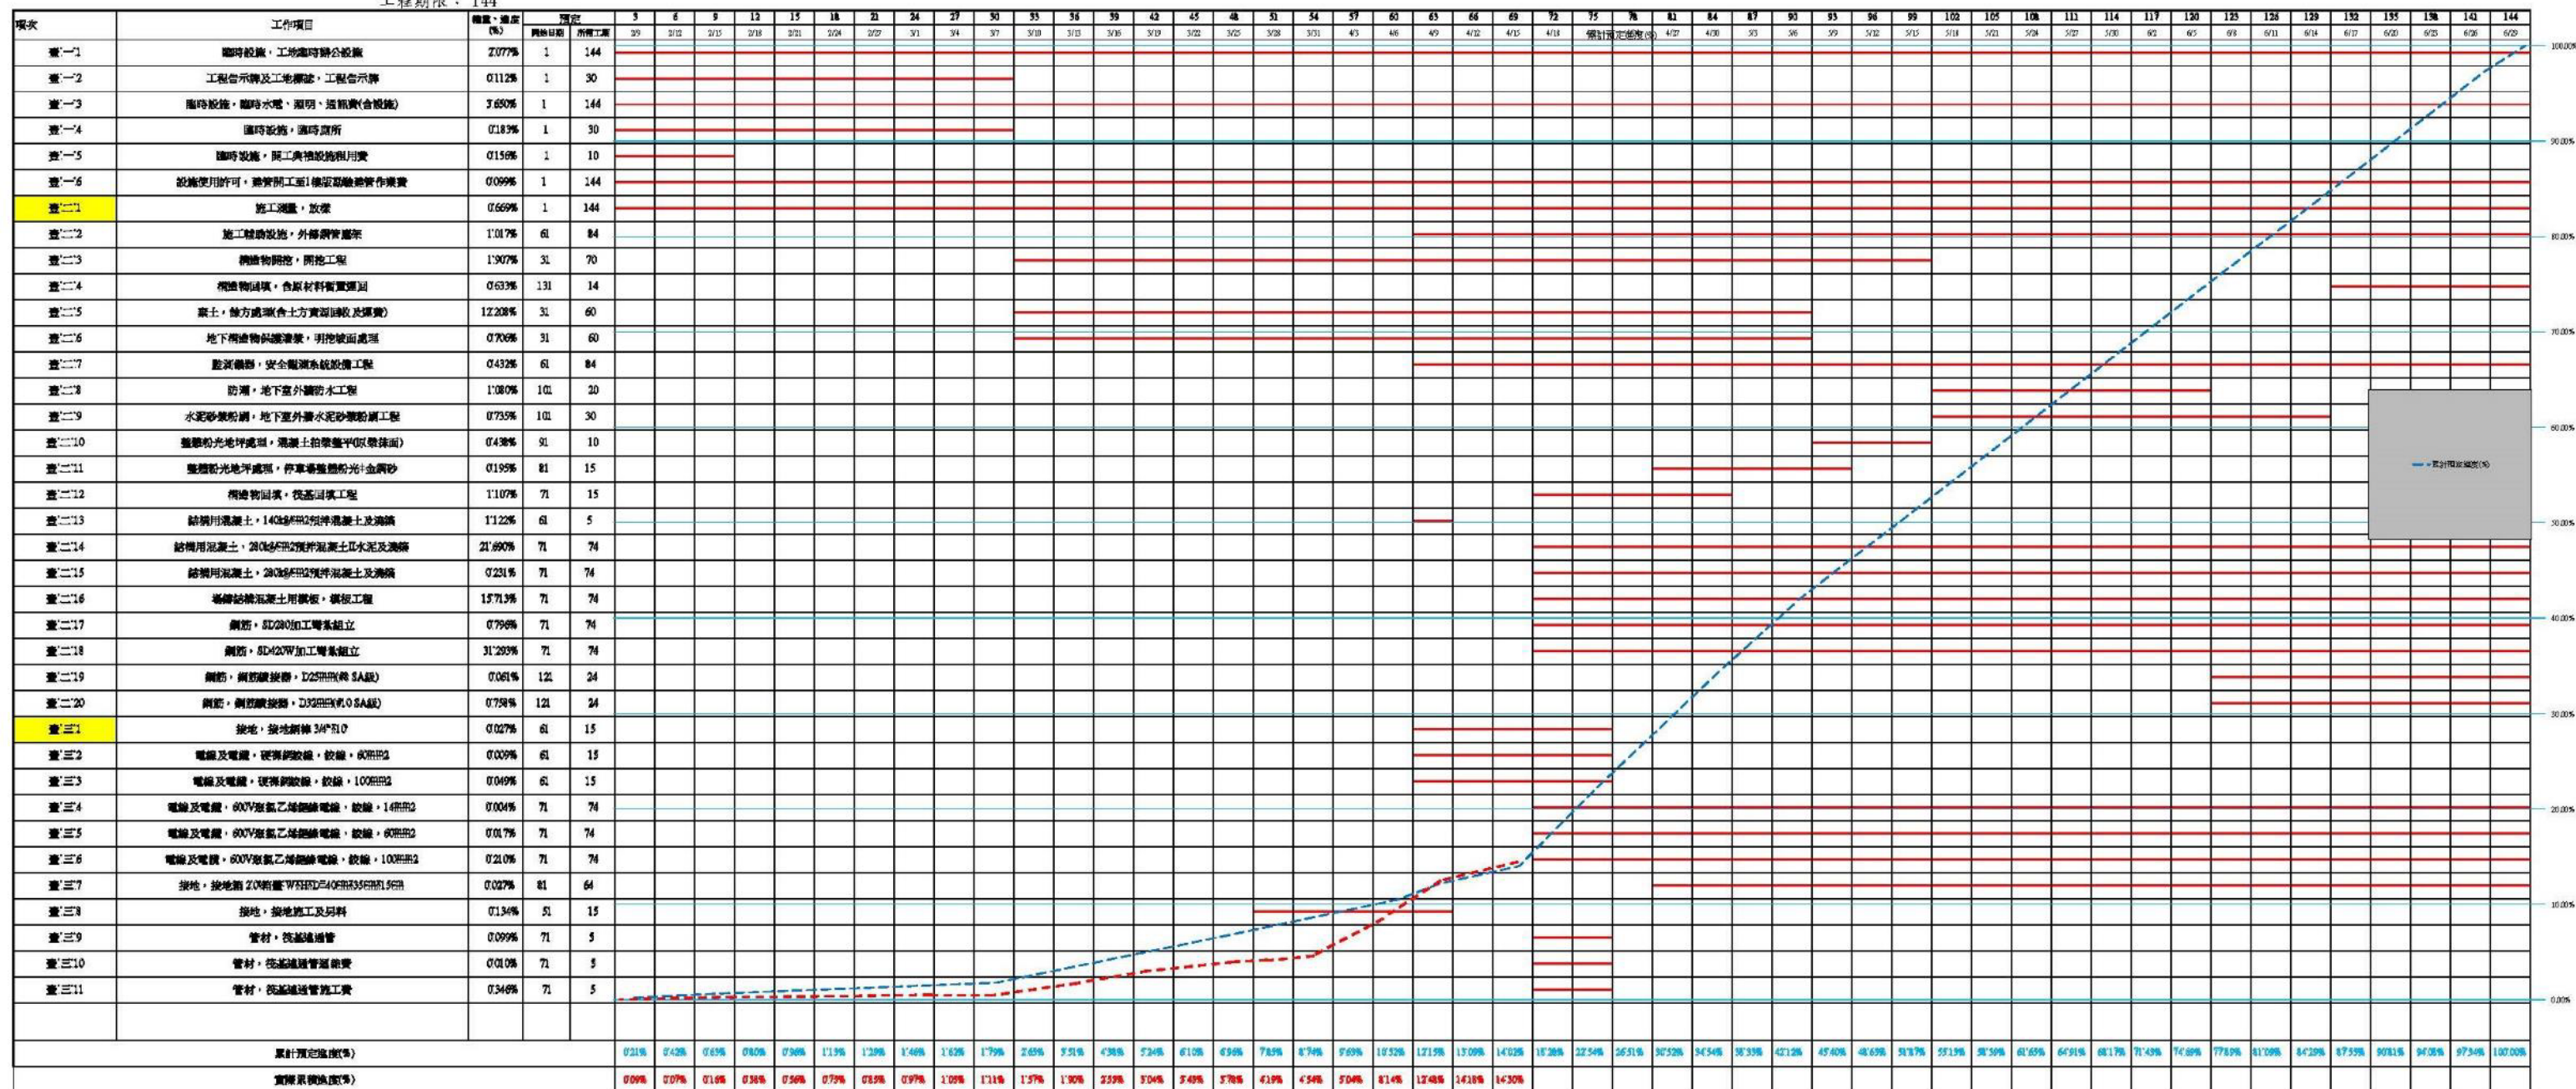

新建工程-113年02月07日至115年06月30日

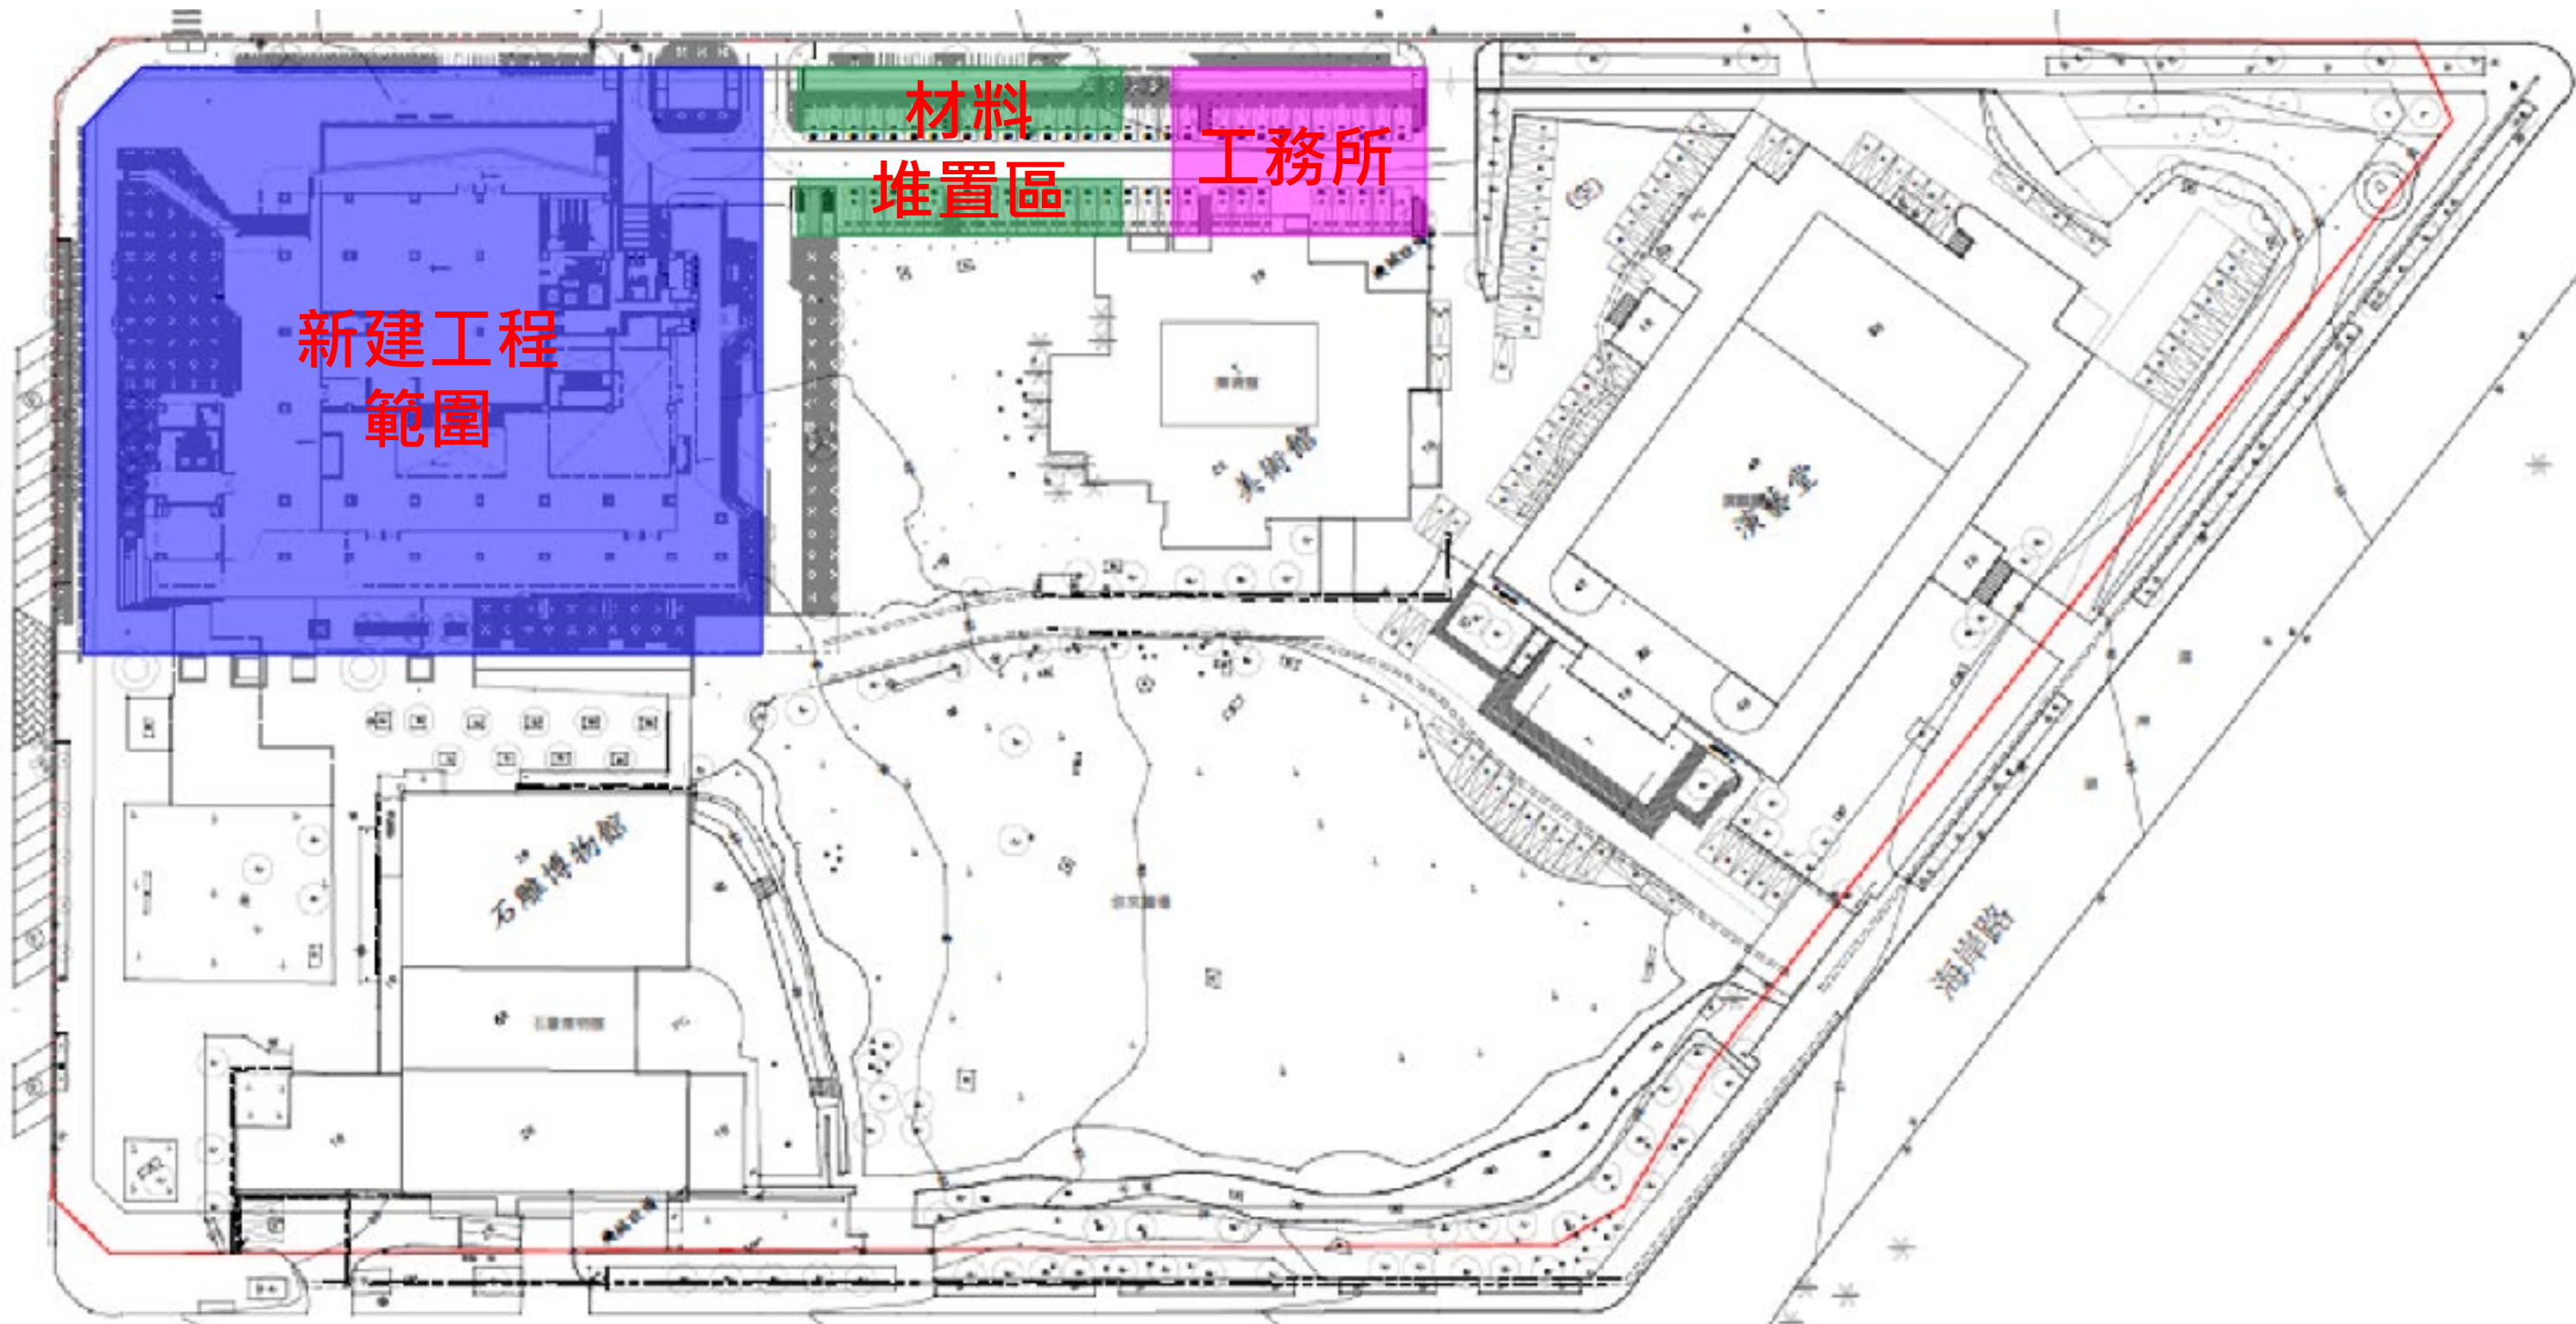

花蓮縣新建圖書館統包工程



目前已施工項目

1. 拆除階段

2. 新建結構體階段

A. 開挖工程

B. 基礎工程

C. B1F 結構體


D. 1F 結構體施作中

E. 各樓層預埋機電管線






拆除工程-拆除工程竣工確認



混凝土廠驗及廠拌取樣(113/01)

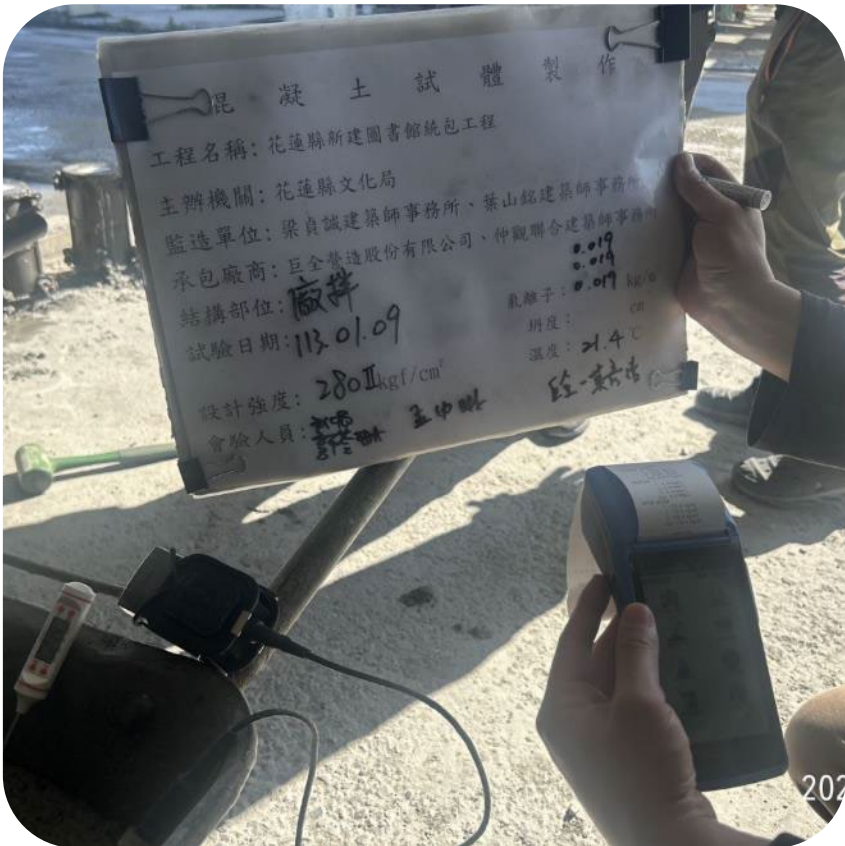

混凝土圓柱試體抗壓試驗

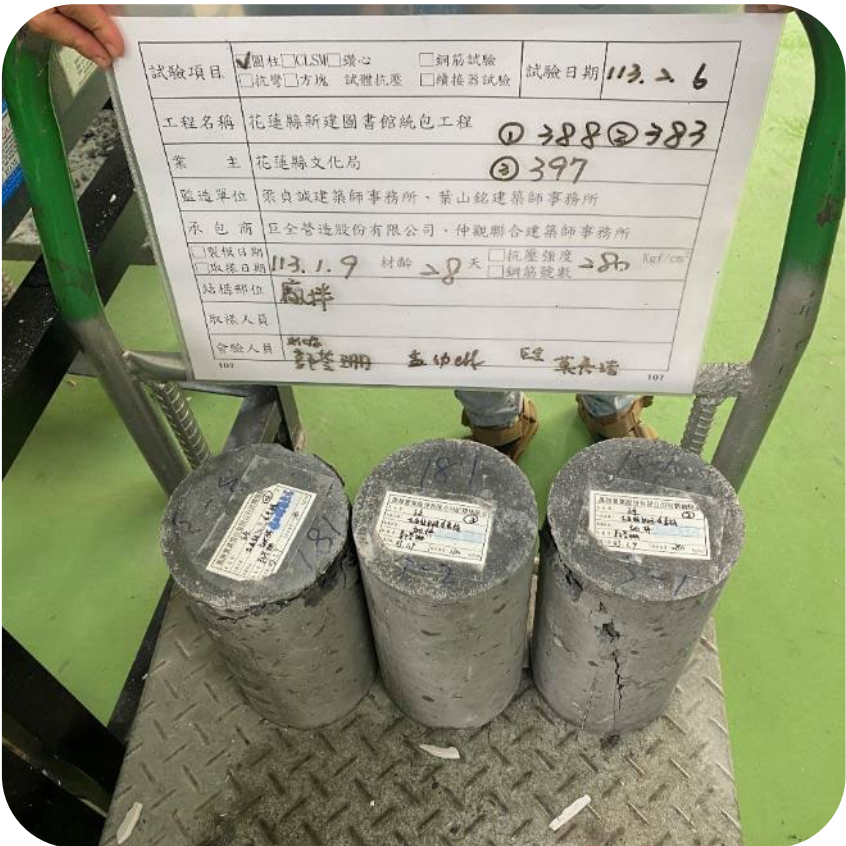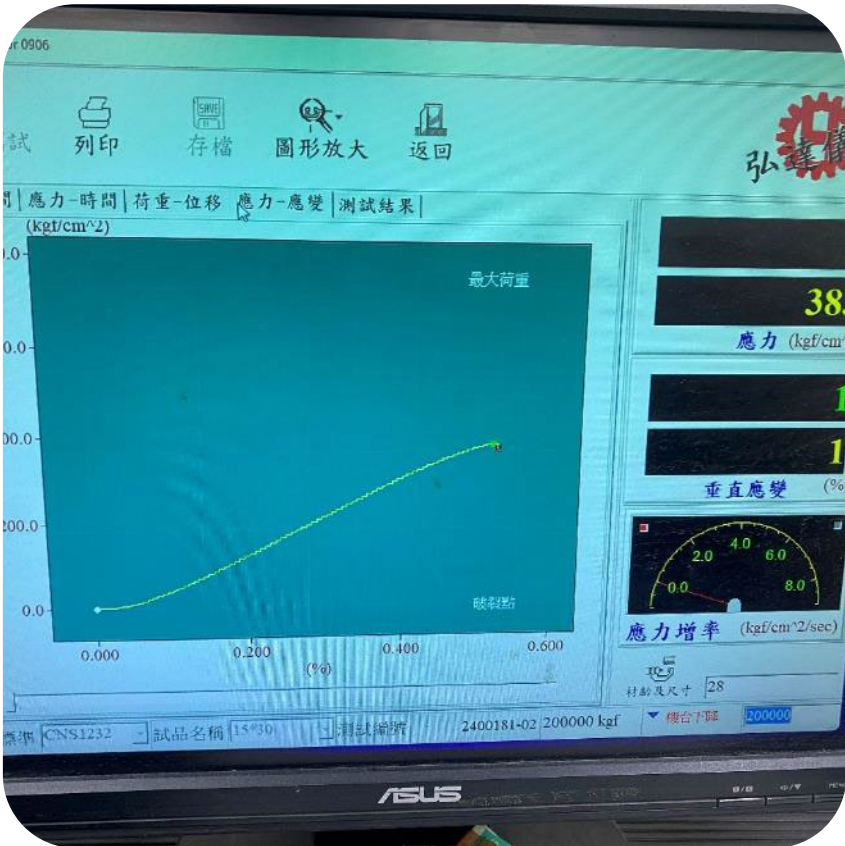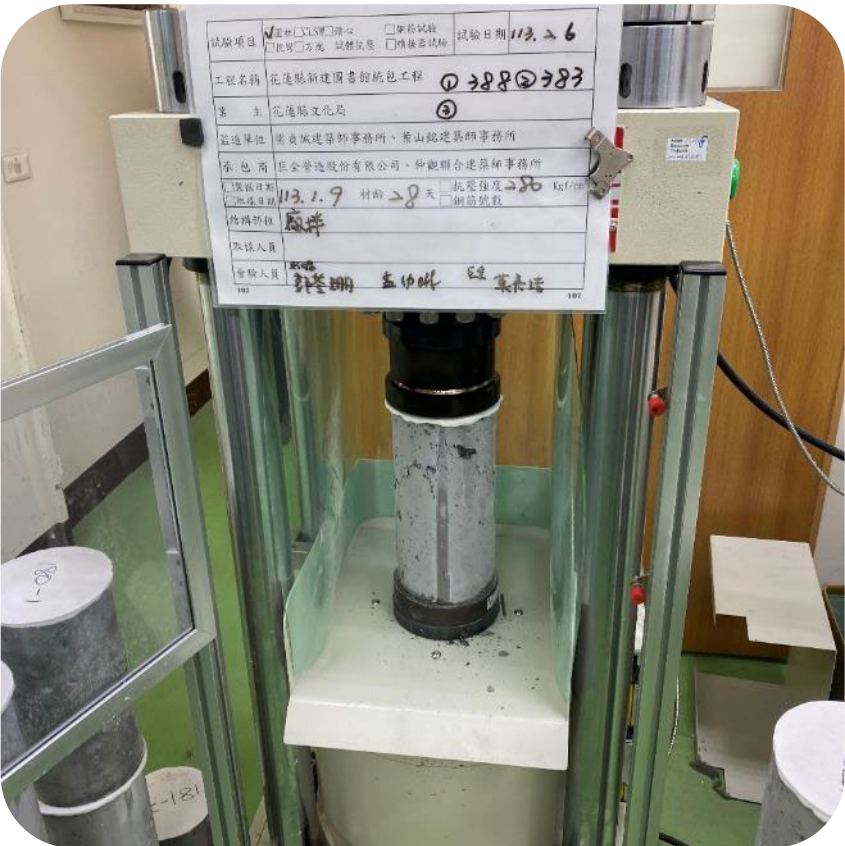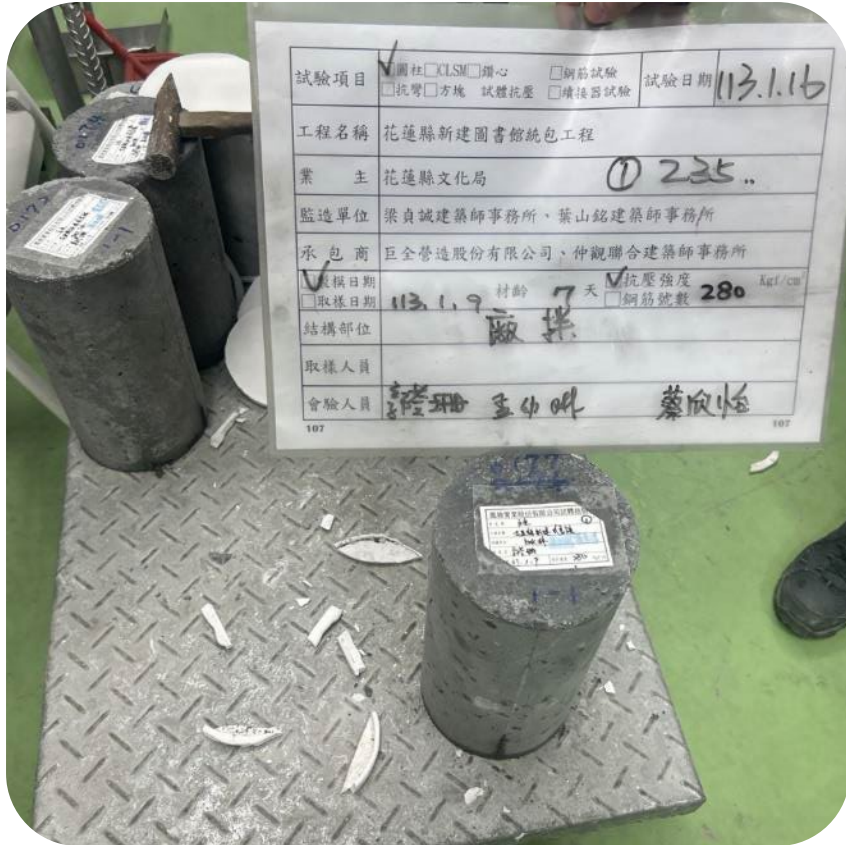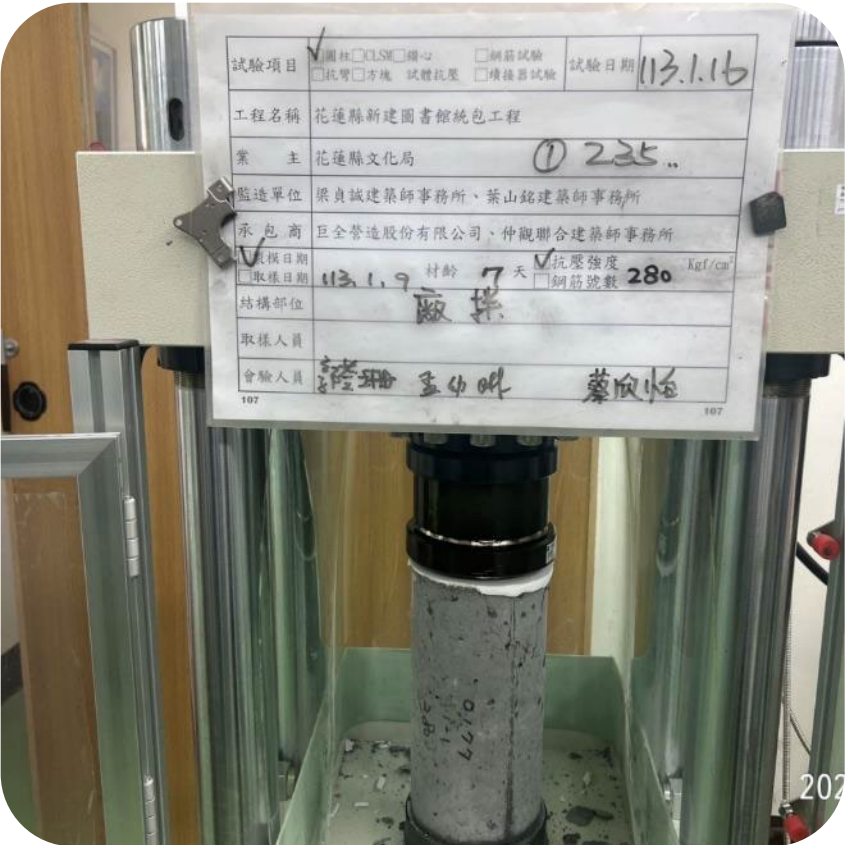

整地工程-整地放樣(113/01-02)



土方工程-餘土運送至土資場(113/02-03)




監測系統-沉陷釘測打及傾度盤裝設




臨時擋土設施(113/03)



道路清洗

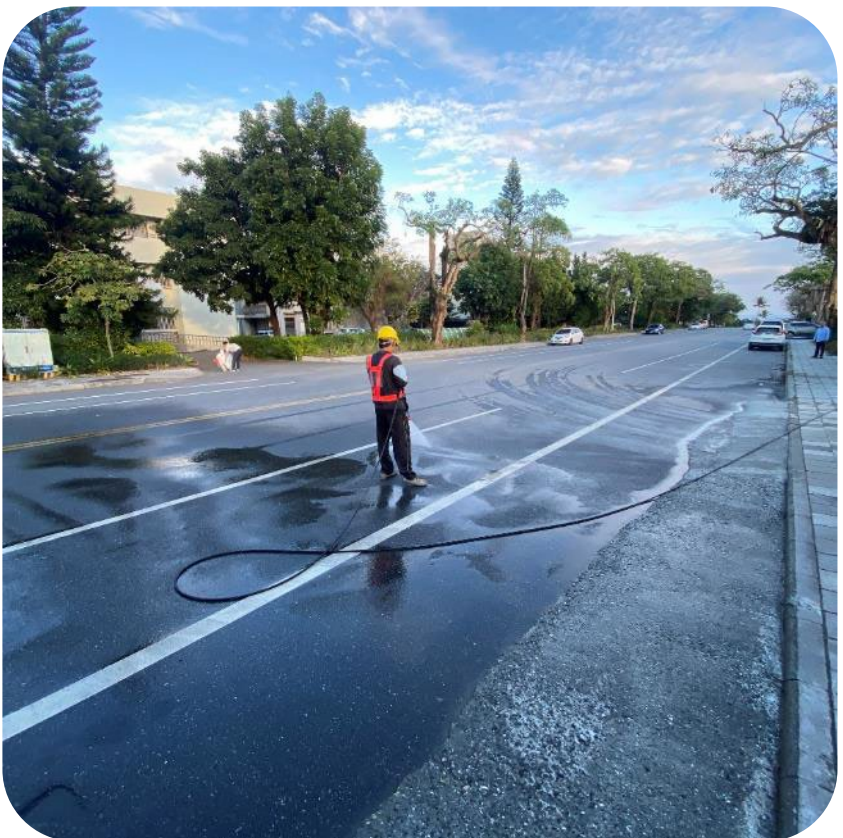

臨時抽排水

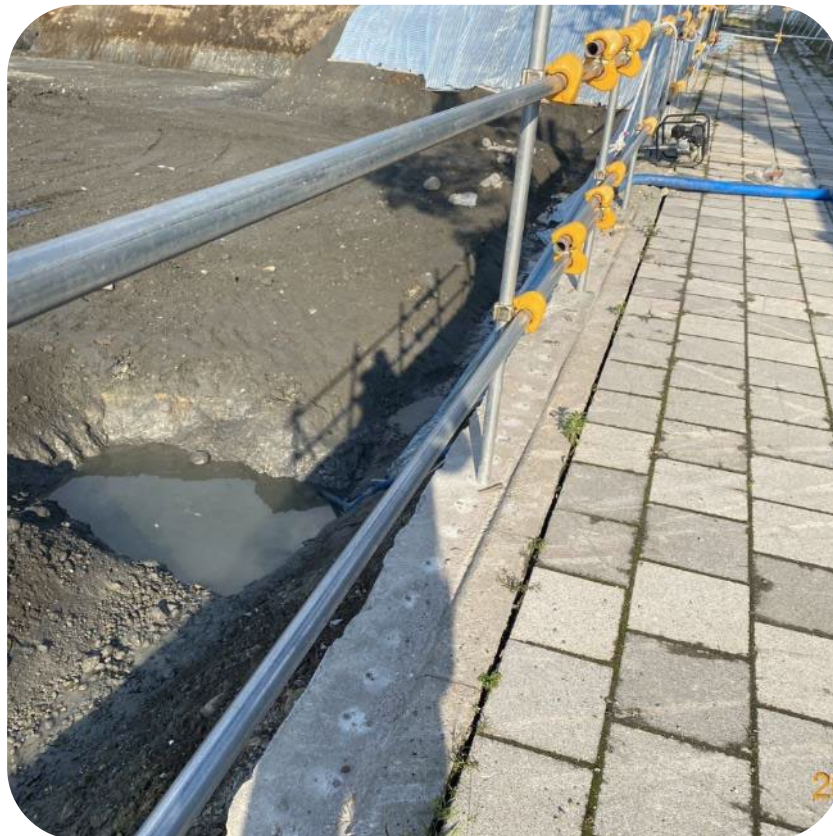

接地工程(113/04)



3. 施工範圍：近鐵路新建及舊路拓寬工程
 表：工程進度表
 監造單位：台灣公路局工程處、台北公路局工程處
 標：第 1 標
 段：第 1 段
 位：第 1 段
 人：第 1 段
 PC 流量：
 140 kg/cm²



筏基PC混凝土140kgf/cm2試體取樣




鋼筋取樣






筏式基礎鋼筋綁紮(113/04-05)

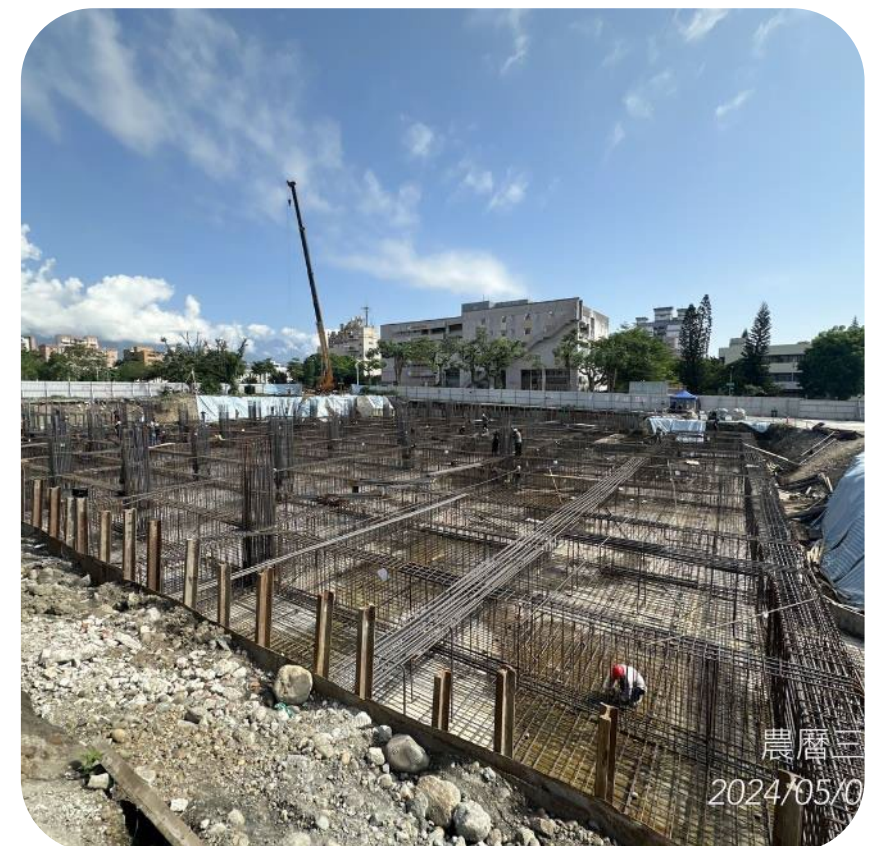


筏式基礎版混凝土280kgf/cm²澆置及品質取樣

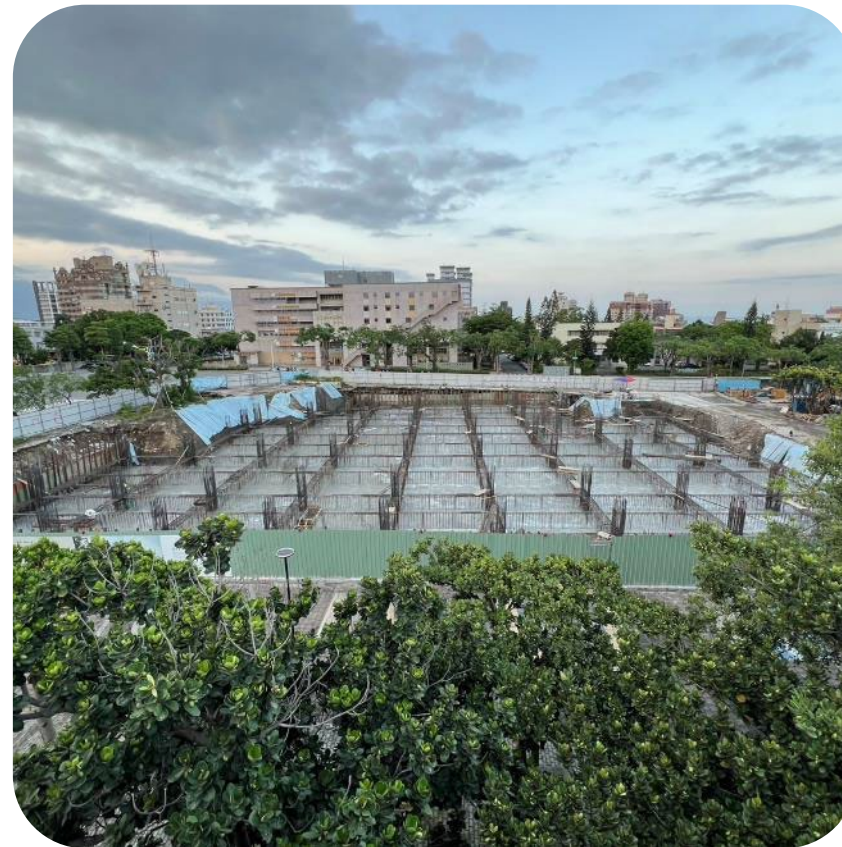

農曆四
2024/05/1



農曆四
2024/05/1

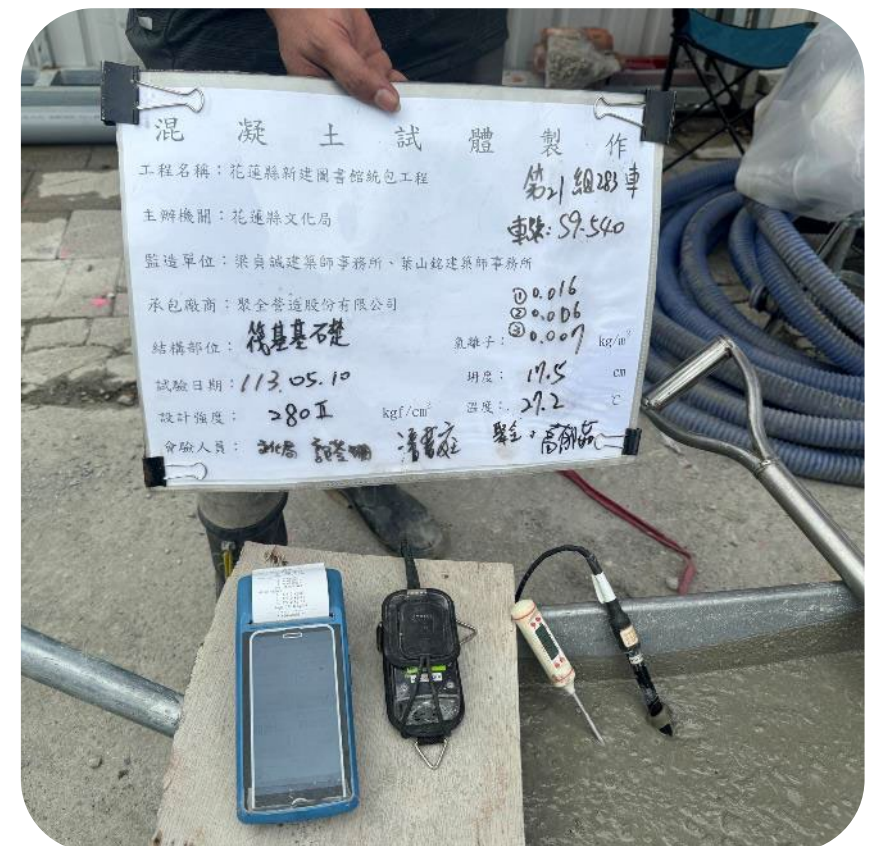




筏式基礎連通管及地樑封模板





地樑混凝土280kgf/cm2澆置及品質取樣




基礎回填、BS版封模、筏基配管(113/06)

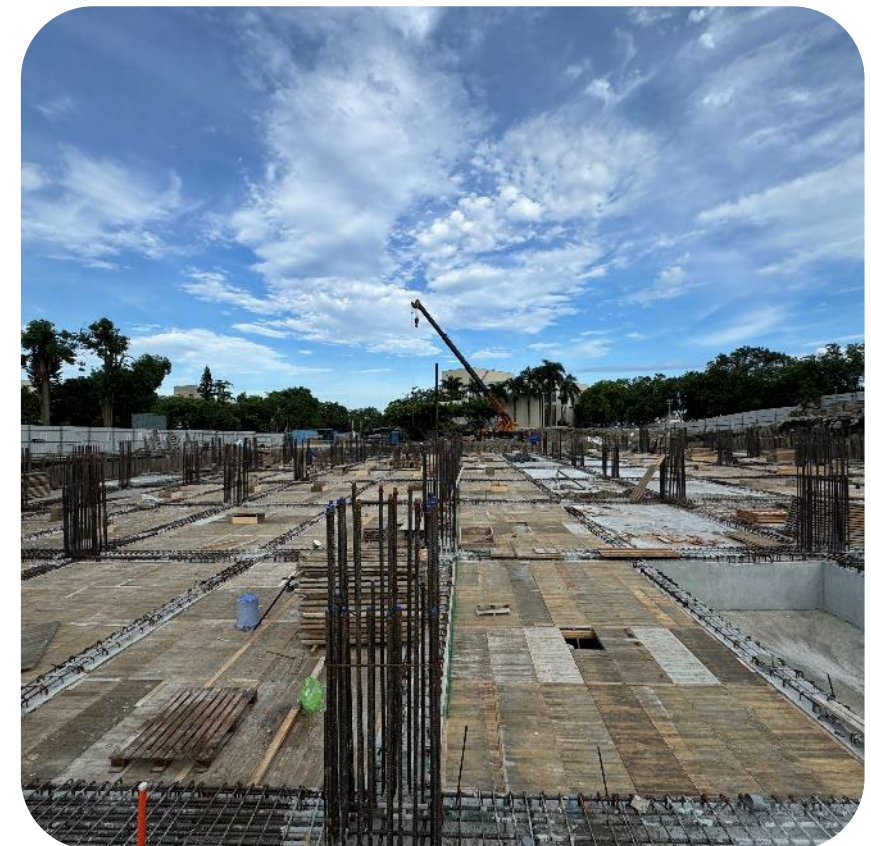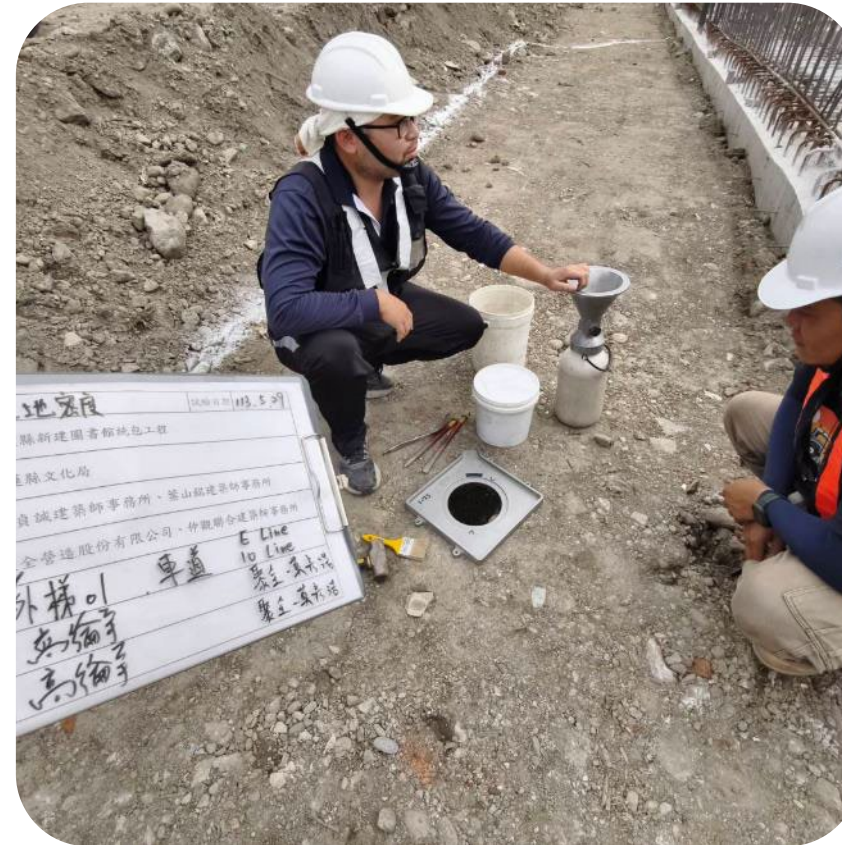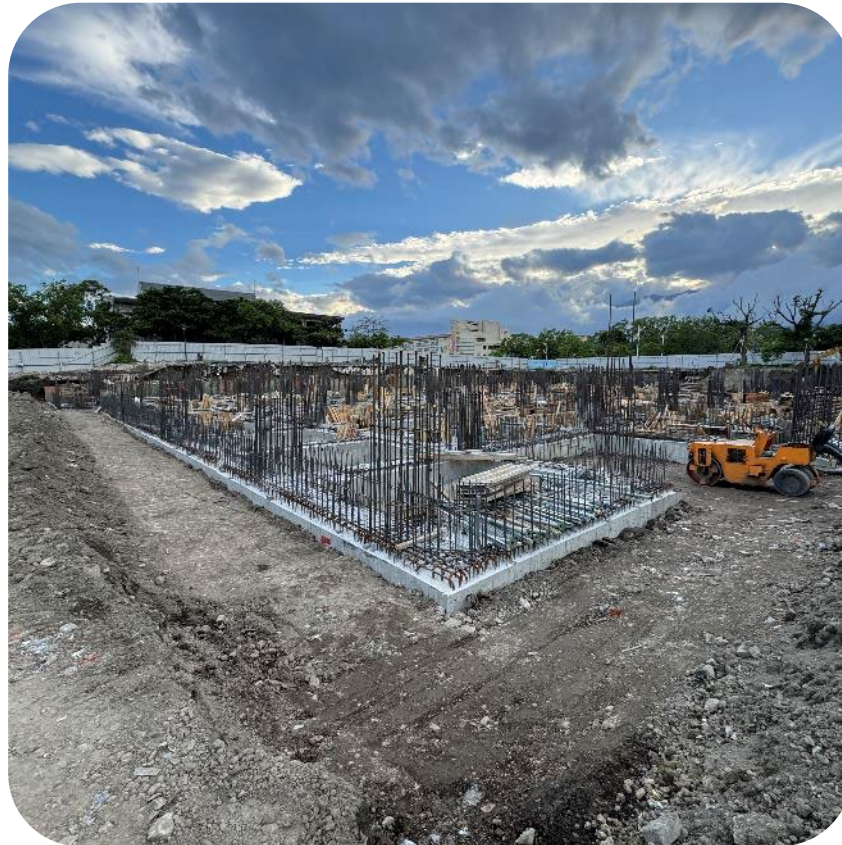



BS版鋼筋綁紮

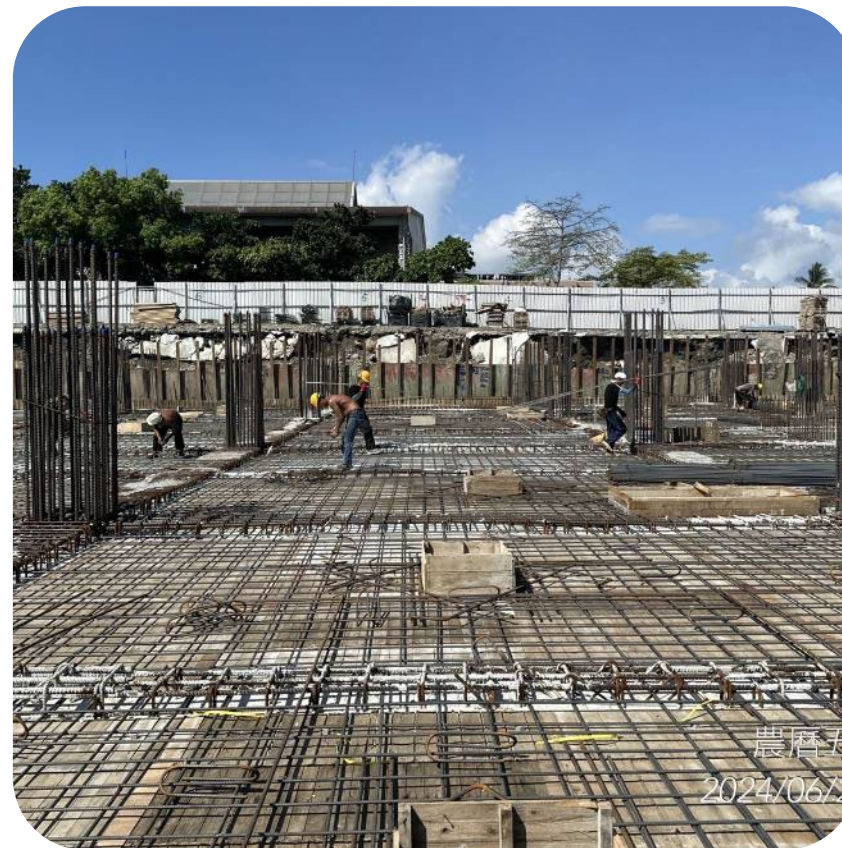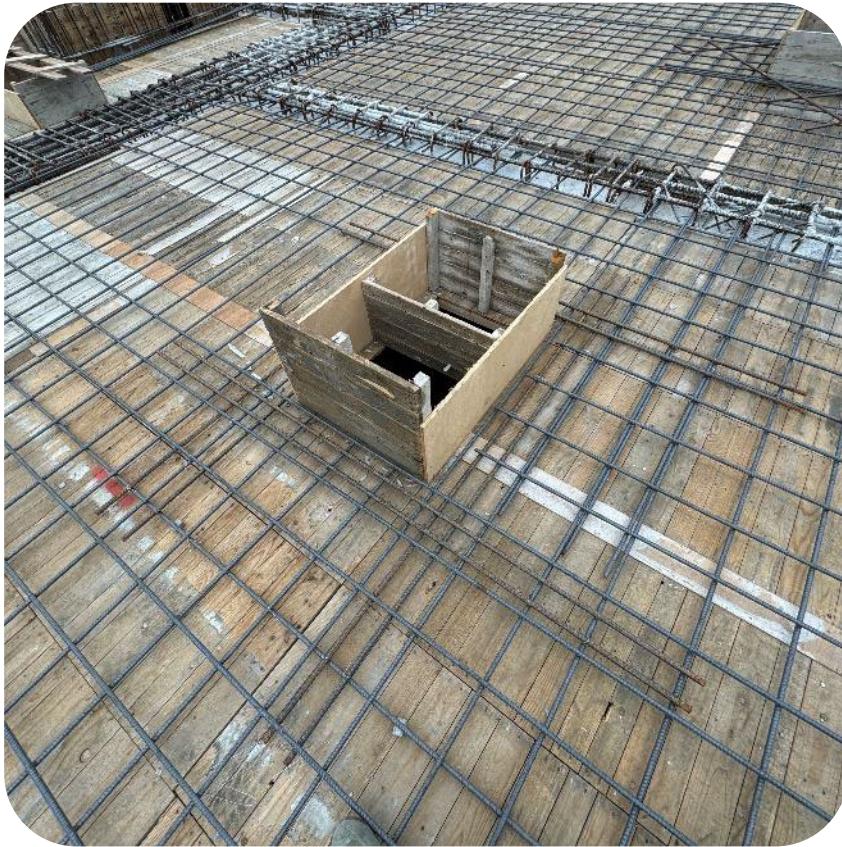






BS版混凝土280kgf/cm²澆置及品質取樣

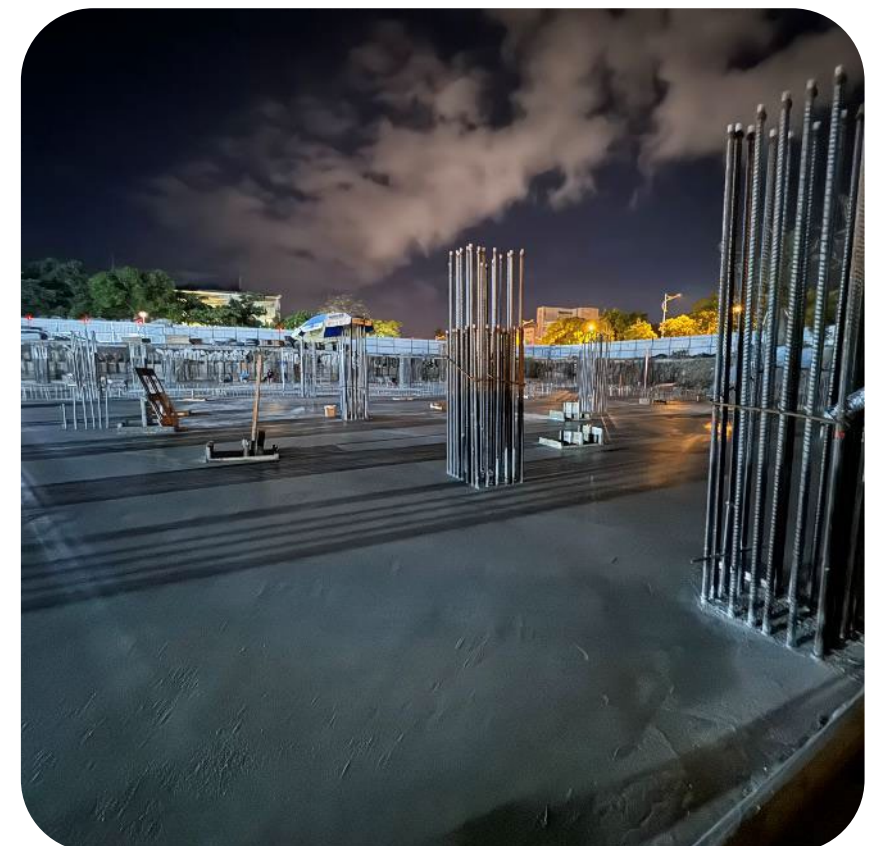


B1F柱牆鋼筋綁紮、鋼筋模板封模、水電配管(113/07-09)

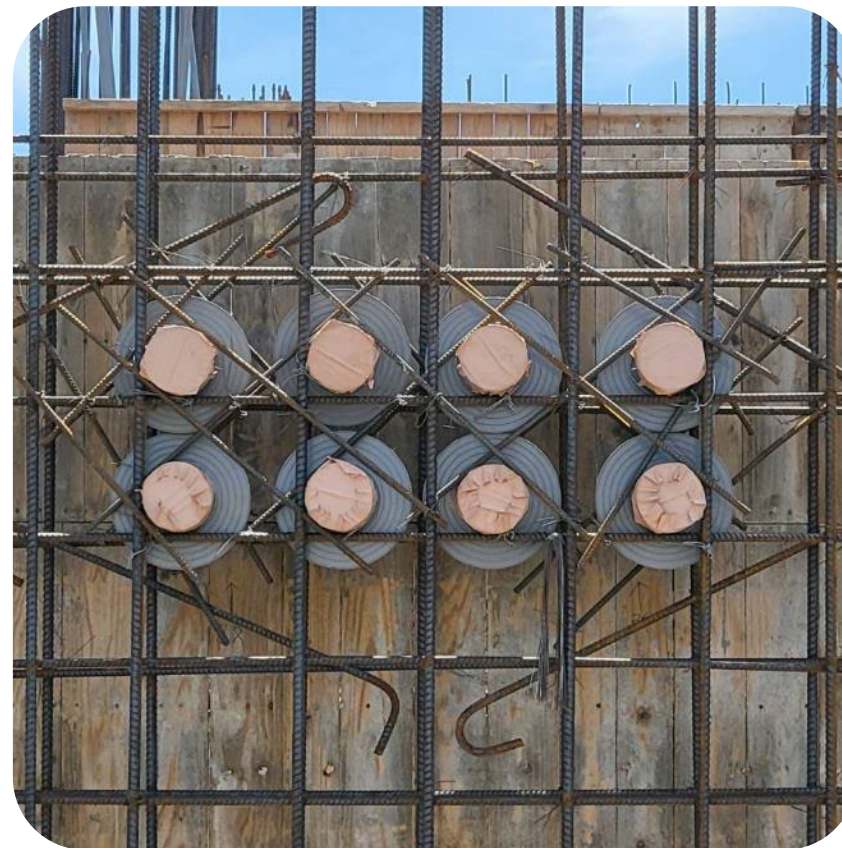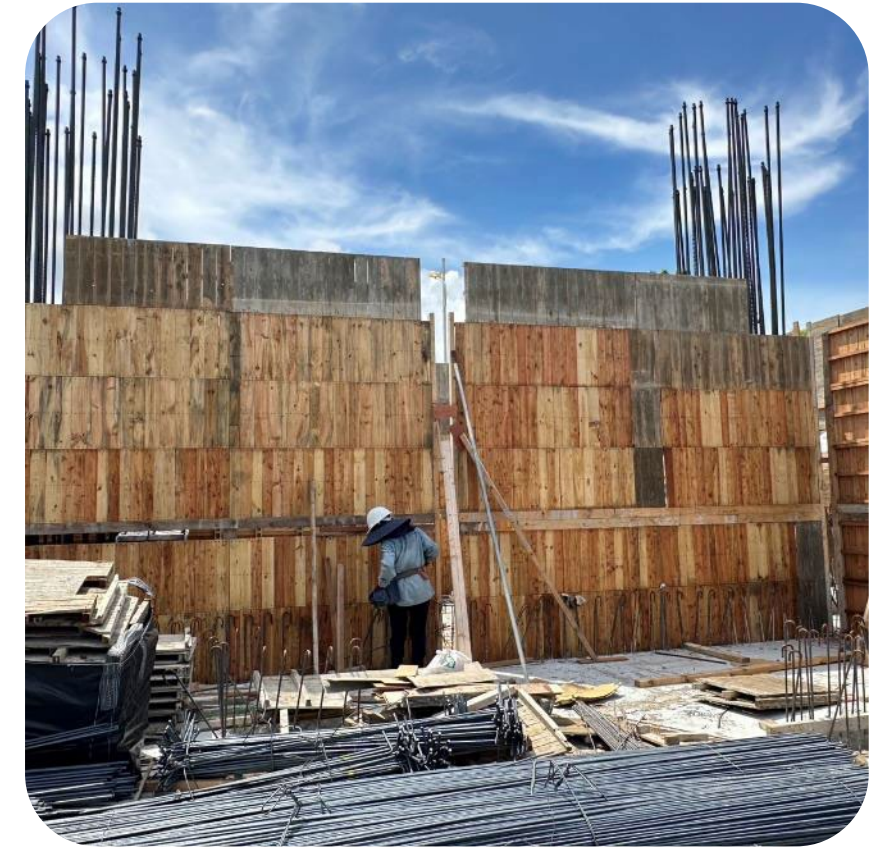


B1F樑版模板封模、樑版鋼筋綁紮、水電配管

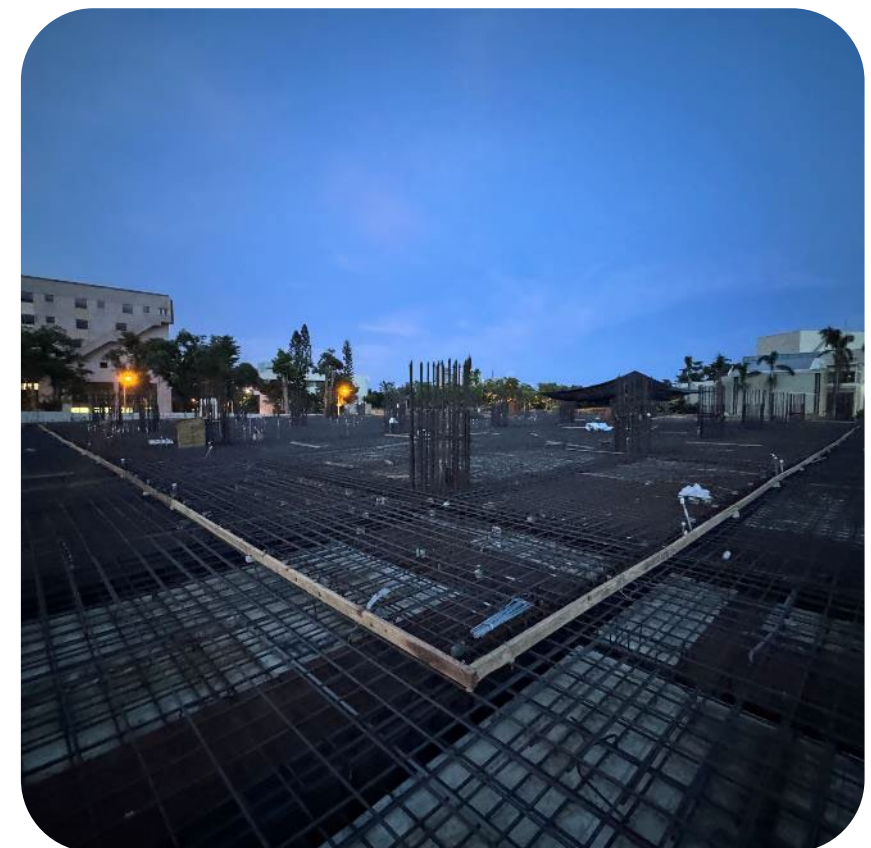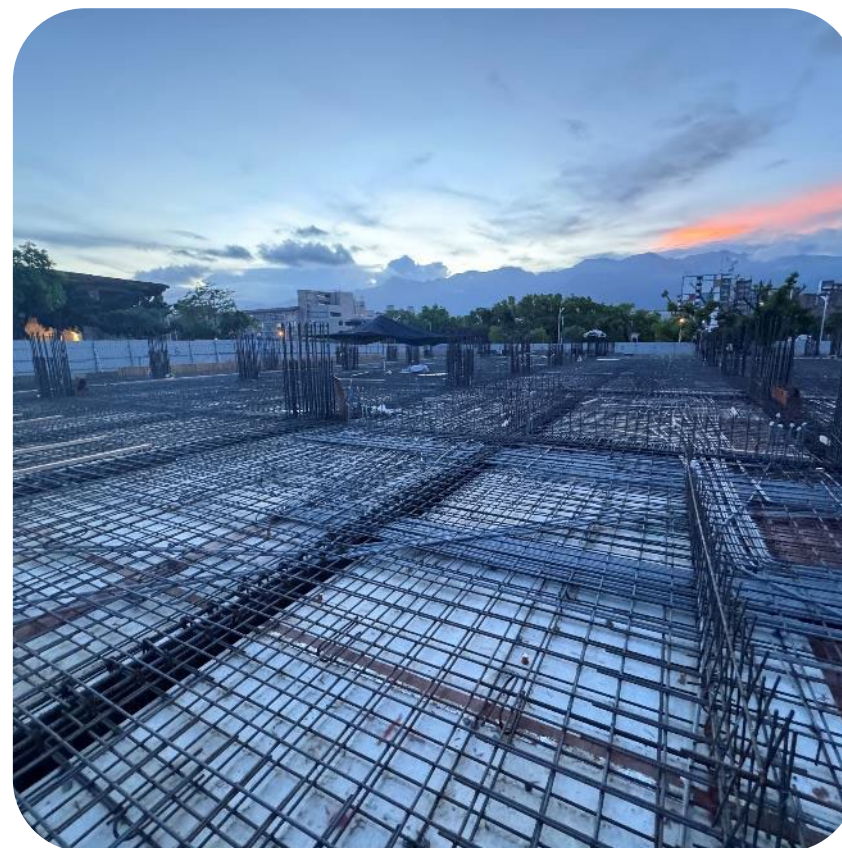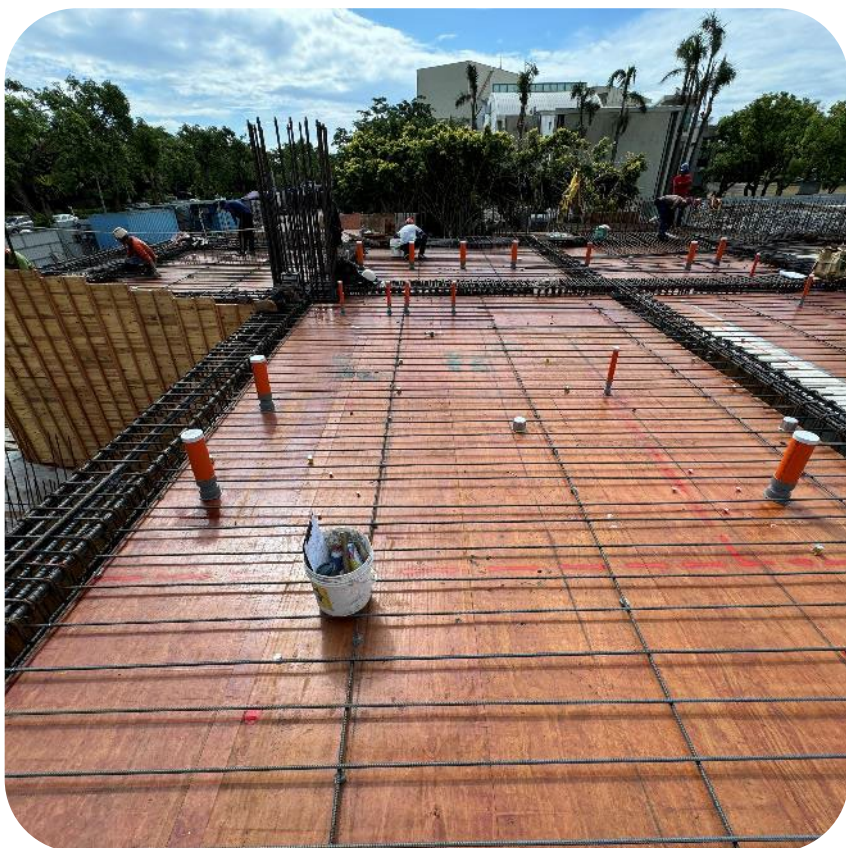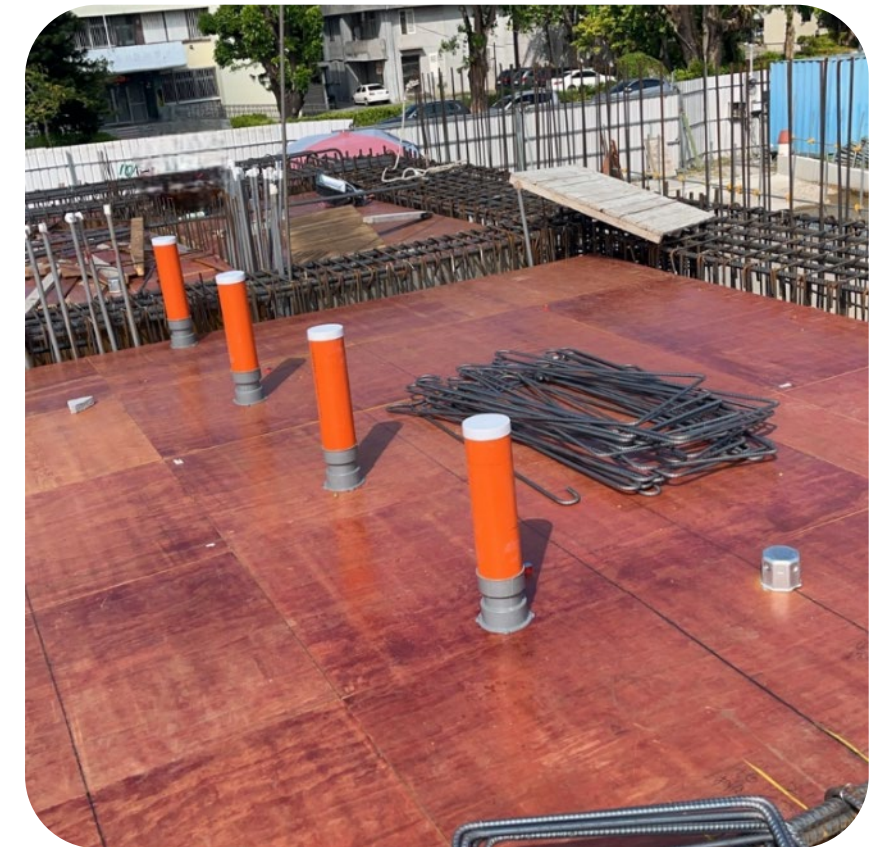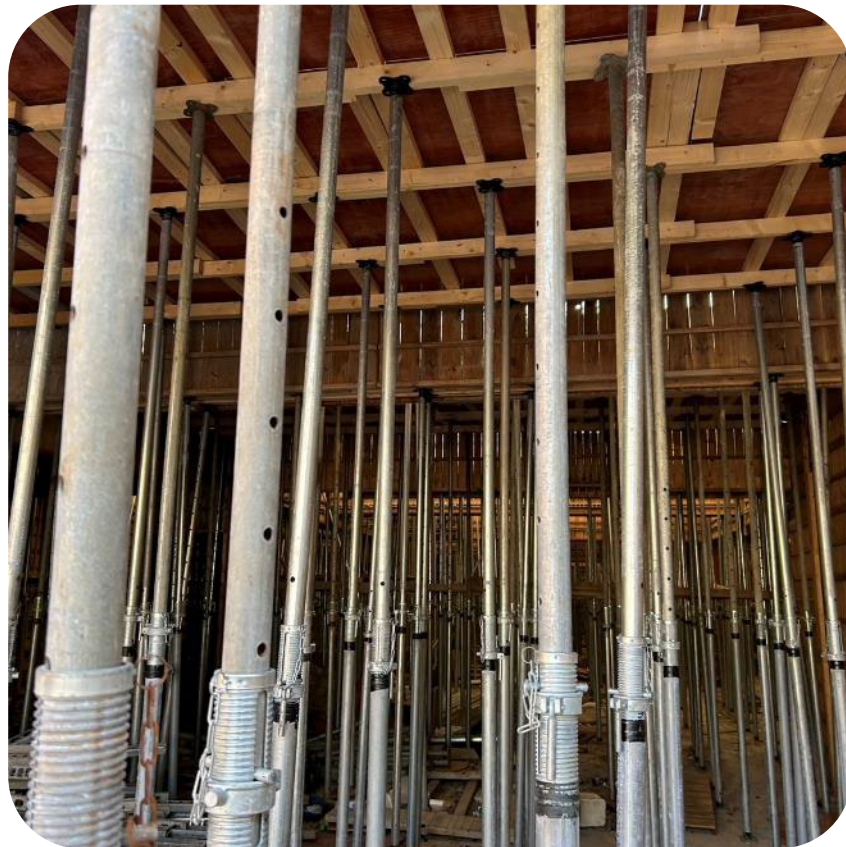

B1F混凝土280kgf/cm²澆置及品質取樣

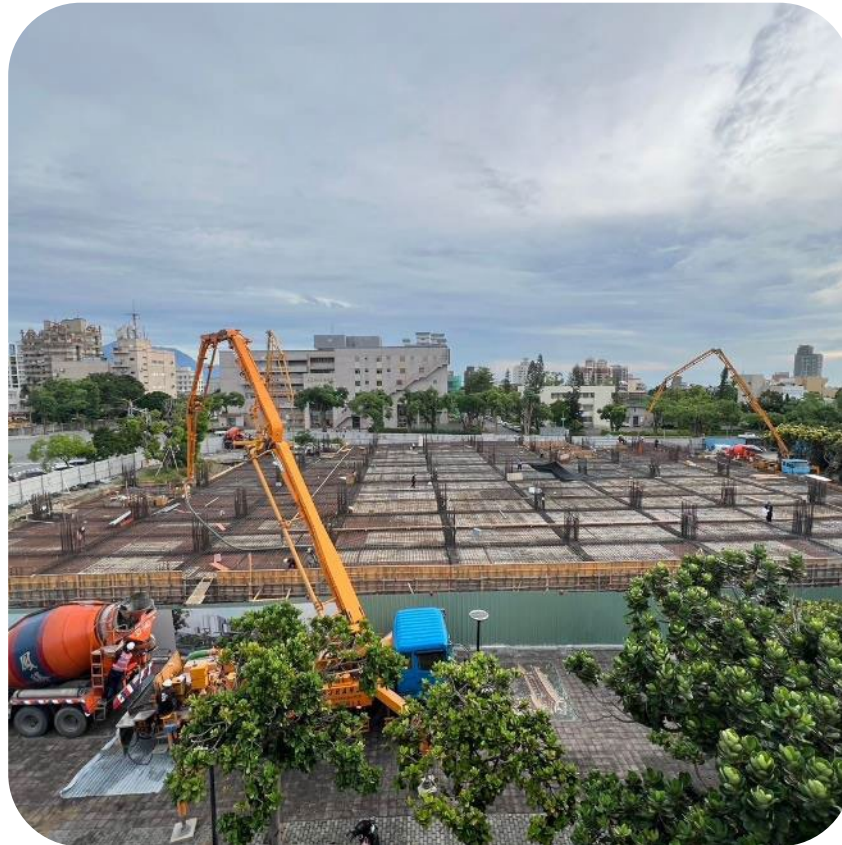

鋼筋續接器試驗

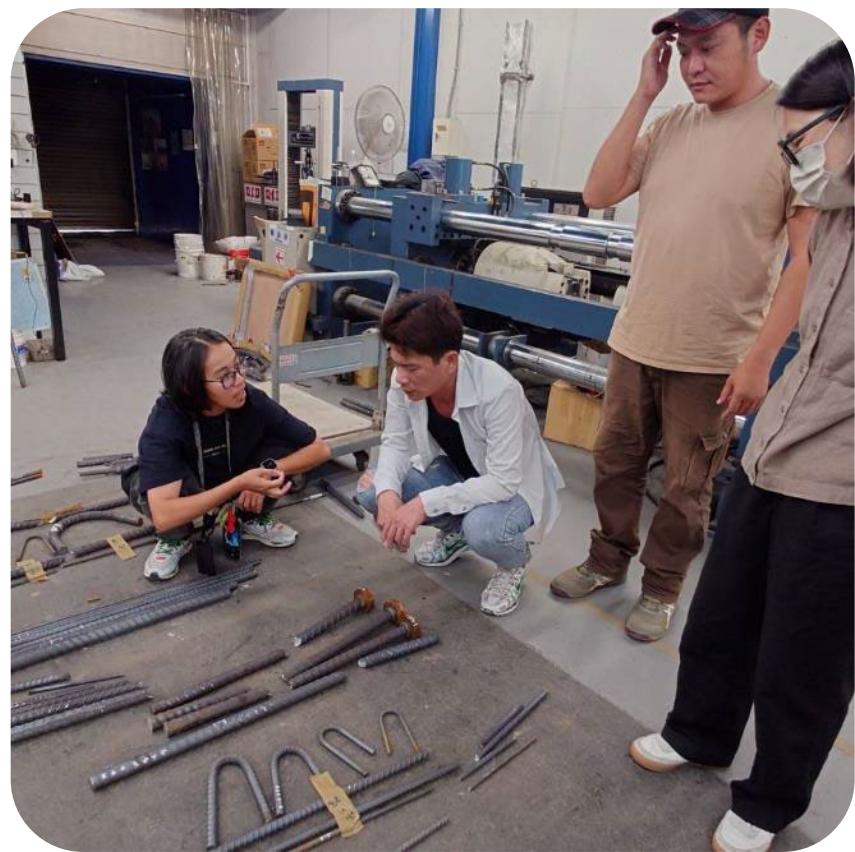

B1F外牆防水工程(113/11)



各項工程文件審查情形、 監造所見問題與年監造執 行重點

(梁貞誠建築師事務所-專案管理暨監造)

一、契約應辦事項說明

花蓮縣新建圖書館工程案						
統包廠商設計及施工階段工作項目						
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	廠商提報日	有無逾期	進度說明
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	無逾期	機關同意備查
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後 20 日內 由機關於招標時載明 提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
6	地質鑽探及試驗工作計畫書		-	111.12.29	無逾期	機關同意備查
7	拆除計畫	依據核定工作執行計畫書於112.1.12	112.1.12	112.1.12	無逾期	機關同意備查
8	基本設計報告書及圖冊/ BIM基本設計報告書及模型檔	依據核定工作執行計畫書於112.2.15	112.2.15	112.2.15	無逾期	機關同意備查
9	細部設計報告書及圖冊/ BIM細部設計報告書及模型檔	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.8.5	112.7.24		審查中
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.15	112.8.15	112.8.15	無逾期	審查中
11	樹木移植計畫書			112.2.6	無逾期	機關同意備查
12	地質鑽探及試驗地基調查報告書			112.3.2	無逾期	機關同意備查
13	拆除工程分項施工計畫書	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.1	112.8.1	112.5.24	無逾期	機關同意備查
14	建造執照申辦	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.23	112.8.23	112.6.27	無逾期	已於112.10.16取得

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案
統包廠商設計階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21					111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031號	貞誠公(花圖)字第1111107001號	(111)巨圖字第2203-1114號	貞誠公(花圖)字第1111121002號					蓮文行字第1110012958號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	112.07.21							112.07.28	
				(112)巨圖字第2203-0720號	貞誠公(花圖)字第1120721001號							蓮文行字第1120007986號	
				審查中	同意核定							同意備查	
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	111.11.21							111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-01號	貞誠公(花圖)字第1111121004號							蓮文行字第1110012960號	
				審查中	同意核定							同意備查	
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21					111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-02號	貞誠公(花圖)字第1111107003號	(111)巨圖字第2203-1114-01號	貞誠公(花圖)字第1111121003號					蓮文行字第1110012959號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後20日內由機關於招標時載明提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	110.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21					111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-03號	貞誠公(花圖)字第1111107004號	(111)巨圖字第2203-1114-02號	貞誠公(花圖)字第1111121001號					蓮文行字第1110012957號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
6	地質鑽探及試驗工作計畫書		-	111.12.29	112.01.05							112.01.16	
				(111)巨圖字第2203-1229號	貞誠公(花圖)字第1120105002號							蓮文行字第1120000271號	
				審查中	同意核定							同意備查	
7	拆除計畫	統包商應按契約規定於工作執行計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報拆除計畫。	依據核定工作執行計畫書於112.1.12	112.01.12	112.01.18	112.02.10	112.02.17	112.02.24	112.03.03			112.03.22	
				(112)巨圖字第2203-0112號	貞誠公(花圖)字第1120118001號	(112)巨圖字第2203-0210號	貞誠公(花圖)字第1120217001號	(112)巨圖字第2203-0224號	貞誠公(花圖)字第1120303001號			蓮文行字第1120002222號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商設計階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
8	基本設計報告書及圖冊/BIM基本設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「基本設計報告書及圖冊」。統包商應於提送基本設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.2.15	112.02.15/ 112.02.15	112.02.22	112.04.11	112.04.18					112.04.21	
				(112)巨圖字第2203-0215號/ (112)巨圖字第2203-0215-01號	貞誠公(花圖)字第1120222001號	(112)巨圖字第2203-0411號	貞誠公(花圖)字第1120418001號					蓮文行字第1120004132號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
9	細部設計報告書及圖冊/BIM細部設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.07.24	112.08.04	112.08.14	112.08.21	112.10.27	112.11.03			112.12.29	
				(112)巨圖字第2203-0724號	貞誠公(花圖)字第1120804001號	(112)巨圖字第2203-0814號	貞誠公(花圖)字第1120821001號	(112)巨圖字第2203-1027號	貞誠公(花圖)字第1121103002號			蓮文行字第1120012080號	
				審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中			同意備查	
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。		112.08.15	112.08.22	113.08.09	113.08.16					113.10.11	
				(112)巨圖字第2203-0815-02號	貞誠公(花圖)字第1120822001號	(112)仲建字第2203-0809號	貞誠公(花圖)字第1130816001號					蓮文行字第1130009646號	
				審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	同意核定					同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案 統包廠商施工階段工作項目													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
11	樹木移植計畫書			112.02.06	112.02.13	112.02.20	112.02.24					112.03.01	
				(112)巨圖字第2203-0206號	貞誠公(花圖)字第1120213001號	(111)巨圖字第2203-0220號	貞誠公(花圖)字第1120224001號					蓮文行字第1120002038號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
12	地質鑽探及試驗地基調查報告書			112.03.02	112.03.09							112.03.22	
				(112)巨圖字第2203-0302號	貞誠公(花圖)字第1120309001號							蓮文行字第1120002390號	
				審查中	同意核定							同意備查	
13	拆除工程分項施工計畫書			112.05.24	112.05.30	112.06.09	112.06.16	112.07.06	112.07.13			112.08.23	
				(112)巨圖字第2203-0524號	貞誠公(花圖)字第1120530001號	(112)巨圖字第2203-0609號	貞誠公(花圖)字第1120616001號	(112)巨圖字第2203-0706號	貞誠公(花圖)字第1120713001號			蓮文行字第1120007682號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
14	申請建築執照			112.06.27									112.10.16日取得
				第一次圖審									



二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案													
統包廠商施工階段工作項目													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
15	土方工程計畫書			112.11.30	112.11.02	112.11.24	112.11.29					112.03.01	
				(112)巨圖字第2203-103001號	貞誠公(花圖)字第1121102003號	(111)巨圖字第2203-112403號	貞誠公(花圖)字第1121129001號					蓮文行字第1120002038號	
				審查中	檢退	審查中	檢退					同意備查	
16	拆除土方暫置計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		112.12.07	112.12.20	113.01.08	113.01.10					113.01.18	
				(112)巨圖字第2203-120701號	蓮文行字第1120013789號	(112)巨圖字第2203-010802號	貞誠公(花圖)字第1120110007號					蓮文行字第1130000437A號	
				審查中	檢退	審查中	同意審查					同意核定	
17	整體施工計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29	113.01.31	113.02.01			113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-011203號	貞誠公(花圖)字第1130119001號	(113)巨圖字第2203-012203號	貞誠公(花圖)字第1130129003號	(113)巨圖字第2203-013101號	貞誠公(花圖)字第1130201001號			蓮文行字第1130001338號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
18	整體品質計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29					113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-011204號	貞誠公(花圖)字第1130119002號	(113)巨圖字第2203-012201號	貞誠公(花圖)字第1130129001號					蓮文行字第1130001338號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	



二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案													
統包廠商施工階段工作項目													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
19	職業安全衛生管理計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.01.22	113.01.29							113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-012203號	貞誠公(花圖)字第1130129002號							蓮文行字第1130001338號	
				審查中	同意核定							同意備查	
20	接地工程分項施工計畫書			113.01.26	113.02.02							113.03.08	
				(113)巨圖字第2203-012601號	貞誠公(花圖)字第1130202001號							蓮文行字第1130001541號	
				審查中	同意核定							同意備查	
21	土方開挖工程分項施工計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.01.22	113.01.29	113.02.05	113.02.07					113.03.06	
				(113)巨圖字第2203-012204號	貞誠公(花圖)字第1130129004號	(113)巨圖字第2203-020501號	貞誠公(花圖)字第1130207002號					蓮文行字第1130001731號	
				審查中	檢退	審查中	同意審查					同意備查	
22	鋼筋工程分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.04	113.03.07	113.03.11	113.03.12					113.04.02	
				(113)巨圖字第2203-030401號	貞誠公(花圖)字第1130307001號	(113)巨圖字第2203-031101號	貞誠公(花圖)字第1130312004號					蓮文行字第1130002864號	
				審查中	檢退	審查中	檢退					同意備查	
23	第一階段施工要徑圖及工程預定進度網圖	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.04	113.03.07	113.03.11	113.03.12					113.04.18	
				(113)巨圖字第2203-030401號	貞誠公(花圖)字第1130307001號	(113)巨圖字第2203-031101號	貞誠公(花圖)字第1130312004號					蓮文行字第1130003458號	
				審查中	檢退	審查中	檢退					同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
24	混凝土澆置工程分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.07	113.03.12							113.04.02	
				(113)巨圖字第 2203-030701號	貞誠公(花圖)字第 1120312002號							蓮文行字第 1130002860 號	
				審查中	同意核定							同意備查	
25	汛期工地防災減災計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.08	113.03.12							113.04.16	
				(113)巨圖字第 2203-030801號	貞誠公(花圖)字第 1120312006號							蓮文行字第 1130002863 號	
				審查中	同意核定							同意核定	
26	交通安全維持及管制計畫	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.25	113.03.27							113.04.02	
				(113)聚圖字第 2203-032501號	貞誠公(花圖)字第 1120327001號							蓮文行字第 1130003515 號	
				審查中	同意核定							同意備查	
27	安全監測分項施工計畫	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.03.28	113.03.29							113.04.16	
				(113)聚圖字第 2203-032801號	貞誠公(花圖)字第 1120329002號							蓮文行字第 1130003641 號	
				審查中	同意核定							同意備查	
28	模板工程分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.04.11	113.04.12							113.04.16	
				(113)聚圖字第 2203-041103號	貞誠公(花圖)字第 1120412001號							蓮文行字第 1130004576 號	
				審查中	同意核定							同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案													
統包廠商施工階段工作項目													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
29	防水工程分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.04.12	113.04.15							113.04.18	
				(113)聚圖字第 2203-041201號	貞誠公(花圖)字第 1130415003號							蓮文行字第 1130004626號	
				審查中	同意核定							同意備查	
30	施工架工程分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.04.12	113.04.15							113.04.18	
				(113)聚圖字第 2203-041202號	貞誠公(花圖)字第 1130415004號							蓮文行字第 1130004627號	
				審查中	同意核定							同意備查	
31	臨時擋土設施(鋼軌樁)暨邊坡保護工程分項施工計畫書(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.04.15	113.04.17							113.04.25	
				(113)聚圖字第 2203-041501號	貞誠公(花圖)字第 1130417002號							蓮文行字第 1130004724號	
				審查中	同意核定							同意備查	
32	泥作工程分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.05.28	113.06.03							113.07.23	
				(113)聚圖字第 2203-052801號	貞誠公(花圖)字第 1130603001號							蓮文行字第 1130006614號	
				審查中	同意核定							同意備查	
33	升降機設備分項施工計畫(第一版)	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送		113.07.15	113.07.22							113.08.02	
				(113)聚圖字第 2203-071505號	貞誠公(花圖)字第 113072201號							蓮文行字第 1130008611號	
				審查中	同意核定							同意備查	

結論說明:本案自開工111/10/11起除每月月報外統包商共計辦理 **33項** 契約應辦事項
目前共有 **0件** 逾期提送、 **33件**核定後機關同意備查、**建築執照**已於112年10月16日取得。細部設計等 **1件**持續辦理中。

未來半年監造執行重點

(一)113年10月27日~12月11日 1樓鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(二)113年12月12日~114年02月04日 2樓鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(三)114年02月05日~03月25日 3樓鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(四)114年03月26日~05月10日 4樓鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(五)114年05月11日~06月25日 RF樓鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置



混凝土工程施工抽查紀錄表

編號：
第2組 24車
KEJ-2719

工程名稱	花蓮縣新建圖書館統包工程		
分項工程名稱	地下室頂版澆置取樣		
抽查位置	取樣區	檢查日期	113年9月21日
施工流程	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查時機	☒ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	高程標誌設置	使用標高器1.5m一支	1.5m 0
	柱牆清潔口	預留開口是否封閉	是 0
施工中	混凝土強度是否符合	設計強度280kg/cm ² II型	是 0
	混凝土坍度	15cm±4cm	18cm 0
	氯離子含量	0.15kg/m ³ 以下	0.026, 0.024, 0.022 0
	溫度	13-32度	27.9° 0
	試體取樣	每100m ³ 製作1組4個試體	4 0
	澆置方法、澆置順序	如澆置計畫書	依澆置計畫 0
	輸送管末端軟管之移送	避免損壞排紮之鋼筋	是 0
	混凝土出廠至澆置完成時間	90分鐘以內澆置完成	90分鐘內 0
	使用振動器充分搗實	配置二台以上5-10秒/處	振動器×2 0
	澆置過程不可任意加水	不得加水	無加水 0
施工後	澆置後養護	地坪養護以灑水或養護劑等保持表面濕潤狀態	/ /
	結構體表面蜂窩處理	使用同配比水泥砂漿修補	/ /
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填至「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4.檢查項目註記「▲」者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。			

監造主任簽名：張漢元

監造現場人員簽名：潘毅廷

施工照片查驗紀錄表

混凝土澆置-地下室頂版

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

日期：113.09.21



說明：鳳勝第2組 車號：KEJ-2719 下料 280 II kgf/cm²
照片一



說明：設計坍度 15cm±4cm 實測 18cm
照片二



說明：設計坍度 15cm±4cm 實測 18cm
照片三



說明：氯離子 0.026、0.024、0.022 0.015kg/m³
照片四



說明：溫度 27.9°
照片五



說明：取樣入試體模
照片六


備註：本表示適用於各項施工查驗表單之佐證資料，並由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。




113.09.20
B1F模板(大樑)查驗



113.09.20
B1F模板(牆)查驗

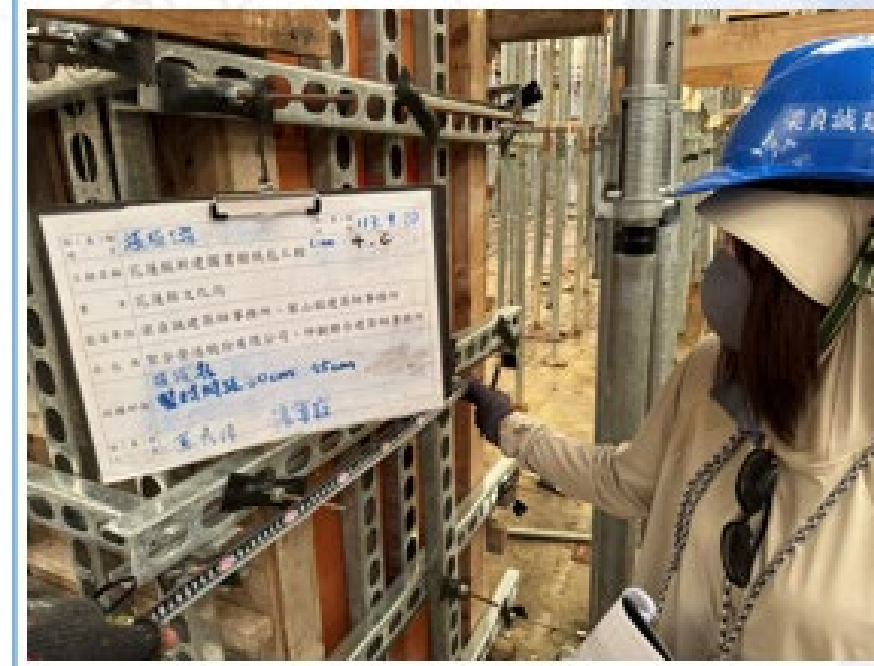

113.09.20
B1F模板(柱)查驗

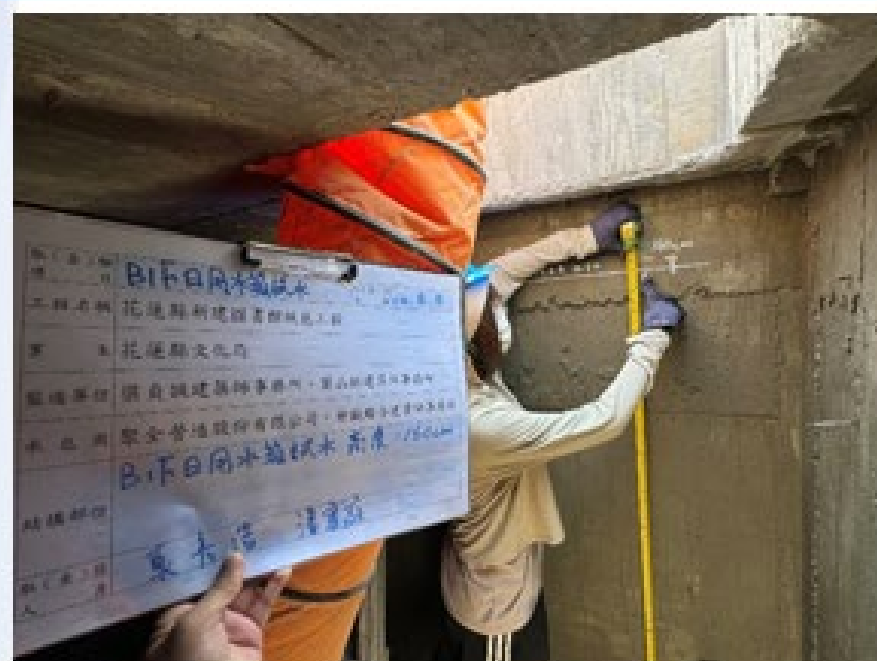

113.08.08
B1F日用水箱試水查驗



113.07.05
結構體平面放樣查驗




113.05.29
工地密度-東側外梯、車道



113.09.19 EMT管材料進場查驗



113.09.12不銹鋼披覆管材料進場查驗

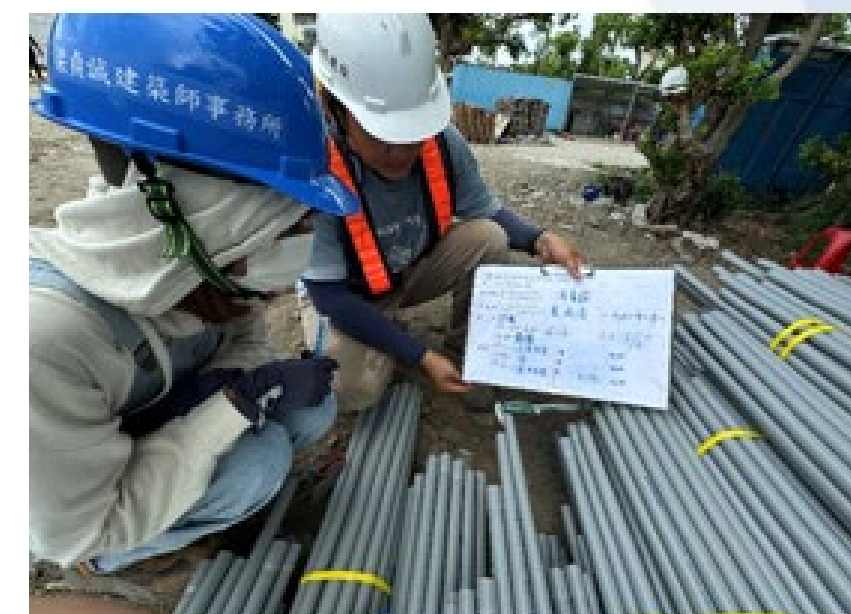

113.09.05 PVC-U(E)管材料進場查驗



113.09.05 PVC-U(B)管材料進場查驗



113.06.04 PVC-U(W)管材料進場查驗




113.03.19 接地材料進場查驗


近半年民意調查問卷統計結果

(政風室)


性別
137 則回應




年齡
137 則回應



職業
137 則回應




您是否支持本局成立機關採購廉政平臺?
137 則回應




您是否清楚本局已於官網設置工程廉政平臺專區？

137 則回應




您是否願意於廉政平臺專區獲取工程最新資訊（包括工程施工進度、會議紀錄、工程督導紀錄等）？

137 則回應




您是否同意重大公共工程成立廉政平臺能降低外力不當干涉？

137 則回應




您是否同意重大公共工程成立廉政平臺能提昇工程整體品質？

137 則回應



如遇公務員涉犯貪瀆不法案件，是否願意向政風機構檢舉反映？

137 則回應



網路問卷建議事項：無。

廉政倫理事件（請託關說、飲宴應酬、財物饋贈）：無。

民眾陳情投訴事件：無。

10月26日結合政風處辦理「洄瀾校廉—活力青廉」大專院校職涯倫理廉政工作坊，東華大學師生參訪剪影



政風處 廉政平臺之推動說明



花蓮縣文化局新建圖書館 統包工程廉政平臺

第三次跨域聯繫會議

報告人:政風處 預防科
科長 張以立

國家重大建設的守護者

建設之於國家

建設之於公務員

勇於任事 v.s 風險趨避

機關政風與同仁攜手呵護重大建設



開放政府國家行動方案承諾事項

國家重大建設、重大採購




如何做的更好？除了依法行政，還要勇於任事

讓國家建設、重大採購如期如質完成



承諾事項推動經驗



至113年共計62案

1. 111年19案
2. 112年17案
3. 113年9案

承諾事項推動經驗

加強行銷典範案例

推向國際



雙語宣導影片

機關首長
分享親身感受



按讚訂閱開啟小鈴鐺喔！

承諾事項推動經驗



承諾事項推動經驗

建置廉政平臺單一入口網站

提升資訊取得的便利性

規劃中

過渡期：中英文官網設置「機關採購廉政平臺」專區
已設置超連結至各平臺專區或網頁

整合各個
平臺資訊

以使用者角度
視覺化呈現

蒐集反饋
持續優化



承諾事項推動經驗

研擬廉政平臺公開資料架構及格式

加強資料的可利用性



廉政平臺的成功經驗



臺北車站特定專用區 C1D1 土地開發案



公民參與活動

安置作業說明會

用地取得協議會

國有地作業說明會

環評施工前說明會

工程公開說明會

公共政策網路參與平臺

公民參與工作坊

地主座談會

招商說明會

資訊公開

地方回饋

工程內容

拆遷安置

用地救濟

環境保育

基地條件

市場潛力

財務效益

甄選條件

廠商敢來投標

避免不當關說

減少黑函亂告

降低民眾反彈


杜絕不法情事

工程進度如期

廉政平臺成果效益



協助臺北車站特定專用區 C1D1 土地開發案順利完成簽約

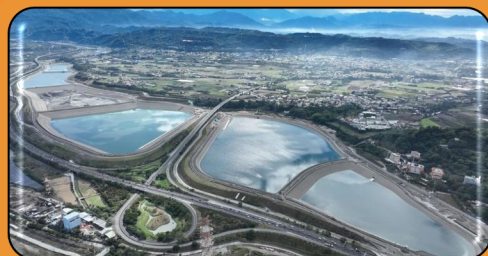

排除爭議及外部干預，協助鳥嘴潭工程如期如質進行



淡江大橋廉政平臺，藉外部公正人士，協助機關解決爭議



公共建設涉及環保議題，須跨域協力因應各種挑戰

廉政平臺的未來挑戰

典範轉移，推向國際

規模漸增，轉型因應

智慧串聯，善用科技

共度難關，攜手往前



廉政平臺是最暖心的關鍵策略



廉政工作如冬日暖陽



翻轉印象，為
廉政工作加溫



與機關並肩同行，與國家共榮共好



守護國家重大建設-接軌國際建立風險控管機制

強化機關廉政經營責任制度及落實風險控管作為

推動機關採購廉政平臺資料開放應用

舉行「機關採購廉政平臺風險控管暨精進會議」



提案討論

提案一

案由：建請參選本縣114年度行政透明績優獎評選作業。

提案單位：政風處

說明：

- 一、為提升本府暨所屬各級機關、學校辦理各項業務之行政透明，對成效卓著者予以獎助，以建構安心、專心、信心及創新的工作環境，強化政府良善治理機制，於113年11月8日函頒「花蓮縣政府行政透明績優獎評選及獎勵作業要點」，並自即日起生效。
- 二、本工程案業成立採購廉政平臺，為機關建立跨域溝通的管道，強調「跨域合作」「公私協力」、「行政透明」、「全民監督」，讓檢察署、廉政署及調查機關參與重大建設案件的辦理過程，並引入專業機關(如工程會)及外部專家學者、公民團體的共同參與，秉持資訊透明公開的精神，藉此排除外部勢力的不當干預，使公務同仁安全安心，勇於任事，促進國家重大建設能夠如期、如質、無垢完成，使全民獲得優質政府服務，符合本縣行政透明績優獎勵之精神並爭取榮譽。

辦法：

- 一、先期準備本工程行政透明相關資料，待執行計畫函知本縣各行政機關後，依所需表格、資料，填報參選。
- 二、期中獲得工作小組評比符合資格後，請參賽團隊指派人員於評選委員會議進行簡報。
- 三、獲獎後將接受公開頒獎並發布新聞稿，期後安排適當時機邀請優勝團隊，進行行政透明措施公開發表會議。

提案二

案由：建請監造與統包廠商落實履約期間品質管理文件詳實紀錄與檔案管理。

提案單位：政風室

說明：

- 一、6月3日與10月9日縣府與教育部分別辦理施工查核，其中針對履約期間相關品質管理文件，如相關計畫、施工日誌、監造報表、試驗報告、材料設備檢(試)驗管制總表等，均有提出部分缺失，提出改善建議。
- 二、本室近來監辦其他工程案件，亦發現有專任工程人員未依營造業法規定於相關文件簽章、施工日誌與監造日報缺漏或未簽章、工地主任未依營造業法加入公會、每日填報施工日誌等情形，有影響工程品質疑慮。

辦法：

- 一、請廠商依據相關法令、契約與各項計畫規定、參考施工查核缺失改善建議，落實各項文件紀錄，完善文件檔案管理。
- 二、請行政科巡查或督導時加強審視廠商相關文件紀錄情形，若有缺漏或不一致應即時指導改善；提報相關文件時應詳實審核文作之完整性與正確性，發現不符相關法令或契約規定，應即書面通知廠商限期改善。

臨時動議

主席結論
