

廉政平台第四次聯繫會報

花蓮縣政府政風處
副處長吳冠雋

主持人
局長吳勁毅

花蓮地方檢察署
政風室主任黃雅萱

花蓮縣審計室
課長朱宗毓

花蓮縣政府政風處
科長張以立

花蓮縣審計室
審計員黃昱捷

花蓮縣政府政風處
科員林侑祥

專案管理廠商
監造經理 林清輝

花蓮縣站調查
調查官陳詠詮

本局圖資科
科長簡哲士

專案管理廠商
監造主任 王泯元

本局行政科科長
科長曾俊翔

本局圖資科
秘書黃子誠

統包廠商
主任 方政雄

本局行政科
約用人員郭苓珊

本局政風室
主任賴英傑

統包廠商
品管 彭彥宇

本局行政科
約用人員楊少幃

座次表

會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
10:00-10:05	5分鐘	主席致詞	吳勁毅局長
10:05-10:10	5分鐘	來賓致詞	
10:10-10:20	5分鐘	上次會議決議事項執行進度	政風室
10:20-10:30	10分鐘	工程督導、材料檢驗與品質管制執行情形	行政科
10:30-10:40	10分鐘	目前工程執行進度與未來半年預計進度	統包廠商
10:40-10:50	10分鐘	各項工程文件審查情形、監造所見問題與年監造執行重點	專管廠商
10:50-10:55	5分鐘	近半年民意調查問卷統計結果	政風室
10:55-11:00	5分鐘	提案討論	與會人員

會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
11:00-11:10	5分鐘	臨時動議	與會人員
11:10-11:15	5分鐘	主席結論	主席
11:20		散會	

主席致詞



來賓致詞



上次會議決議事項執行進度


(政風室)

項次	決議事項	辦理單位	執行情形	管制建議
1	待縣府政風處訂定參獎評選計畫頒布後，再行檢視本局現行公開的行政透明措施和資料，評估是否參選本縣114年度行政透明績優獎評選作業。	政風室 行政科	參照第一屆洄瀾透明獎評審標準，會商評估後簽准參獎由行政科撰寫參獎資料。	解除列管
2	請廠商依據相關法令、契約與各項計畫規定、參考施工查核缺失改善建議，落實各項文件紀錄，完善文件檔案管理；行政科巡查或督導時加強審視廠商相關文件紀錄情形，若有缺漏或不一致應即時指導改善並詳實紀錄發現情形；提報相關文件時應詳實審核文作之完整性與正確性，發現不符相關法令或契約規定，應即書面通知廠商限期改善，列入工務會議定期追蹤管制	專管與統包 廠商 行政科	依會議決議辦理，定期巡查或督導時加強審視廠商文件紀錄並確認專管審查情形，將有改善項目列入工務會議定期追蹤事項。	解除列管
3	未來聯繫會報各單位提報與簡報之會議資料，以前次會議至下次會議期間執行之工作進度及概況，和未來半年主要工作計畫為主。	行政科 專管與統包 廠商 政風室	依會議決議辦理。	解除列管

工程督導、材料檢驗與 品質管制執行情形

(行政暨文化設施科)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約工期

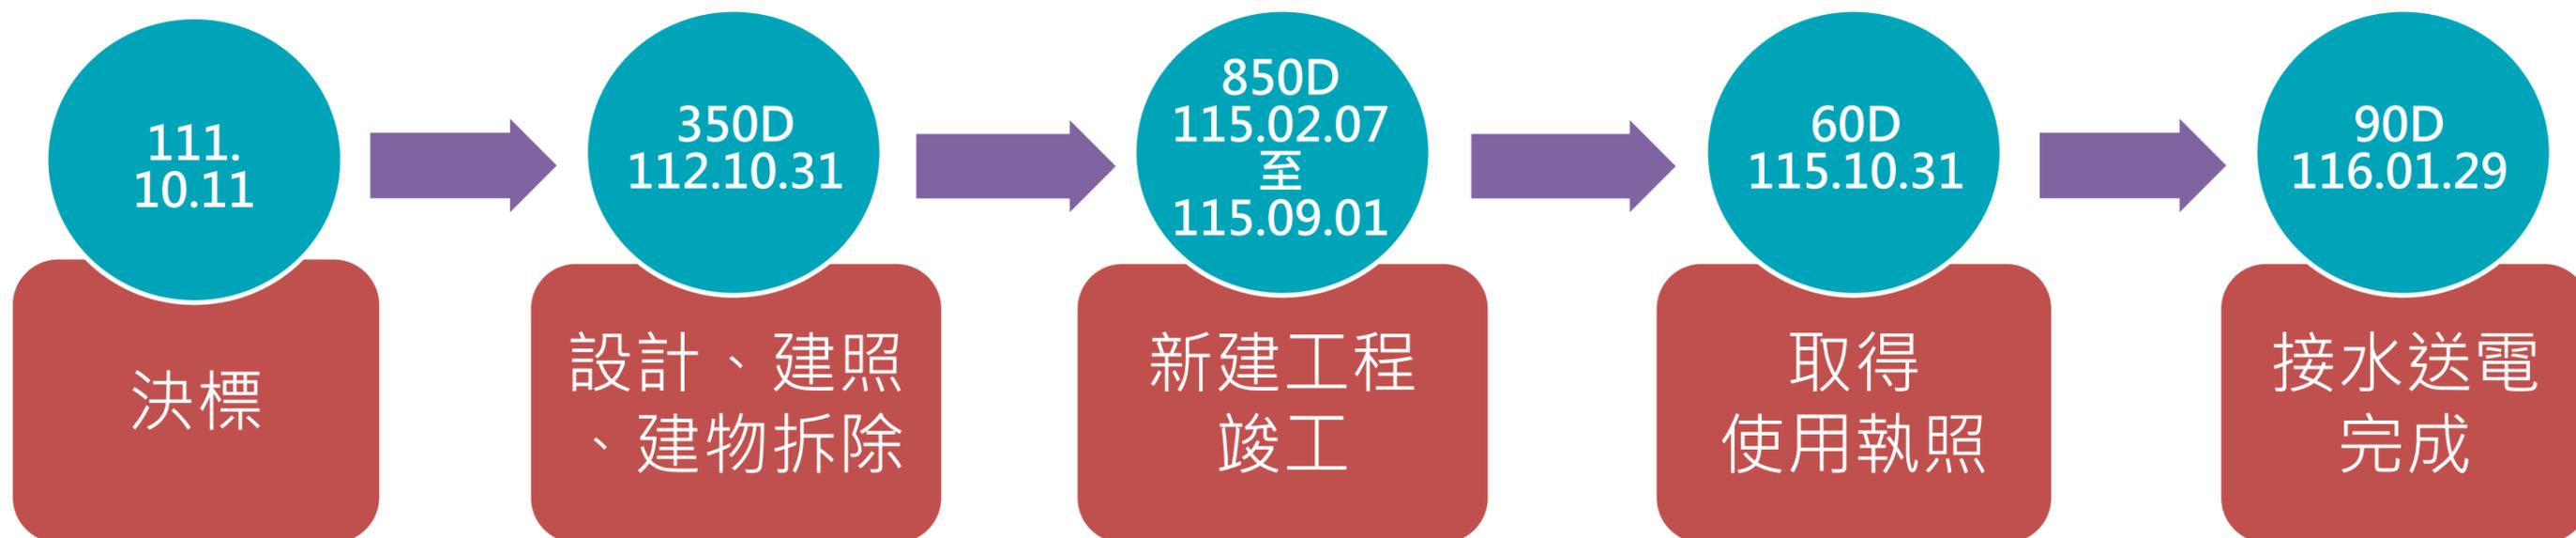

規劃設計期：決標日起350日

新建工程施工：機關通知日起7日內開工，計850日

展延及不計工期：88日(國定連假43日及自然災害45日)

取得使用執照：竣工次日起60日

完成接水送電：取得使用執照起90日

工期合計：1200日

完成建管程序合計：1350日

預計115年09月1日竣工

後續接續辦理取得使用執照及接水送電作業



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程規模

契約規模：8億4,942萬9,000元。

決標金額：4億2,471萬4,500元(110年10月11日)。

後續擴充金額：4億2,471萬4,500元(113年12月24日)。

設計契約價金(總包價法)：2,476萬1,200元。

工程契約價金(總包價法)：8億2,466萬7,800元。

樓地板面積：約1萬3,000坪。

樓層：地上四層，地下一層。



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約執行現況

拆除工程

拆除執照：於112年5月12日取得。

拆除開工：於112年6月26日完成建物報廢程序，112年9年20日開工。

拆除完工：於112年11月4日申報竣工，113年3月4日建管解列。

新建工程

建造執照：於112年10月11日取得。

工程開工：於113年2月7日開工。

預定完工：於116年9月1日竣工，目標115年年底開放使用。

契約累計撥款：1億7,274萬3,105 元(完成2次估驗)。

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程督導執行概況

工程督導執行概況(114/4/10日止)

- 工程巡查64次。
- 工程督導8次。
- 工程協調會報9次(工務會議)。
- 品質抽查驗會同16次(混凝土廠驗1次及現場澆置6次、鋼筋取樣10次、門窗取樣1次、施工檢驗停留點11次)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 材料檢驗與品質管制執行情形

項次	項目	辦理情形	備註
1	混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 113年1月取樣(廠拌)-80、140、280kgf/cm。 113年4月取樣(PC)-140kgf/cm。 113年5月取樣(筏基底板)-280IIkgf/cm。 113年6月取樣(BS版)-280IIkgf/cm。 114年1月取樣(一樓)-280IIkgf/cm。 114年2月取樣(二樓)-280IIkgf/cm。 	
2	鋼筋	<ol style="list-style-type: none"> 113年4月取樣(基礎)-SD420W。 113年6月取樣(BS版)-SD420W。 113年7月取樣(地下室)-SD420W。 113年9月取樣(一樓)-SD420W。 113年12月取樣(二樓板)-SD420W。 114年1月取樣(二樓牆)-SD420W。 114年3月取樣(三樓柱)-SD420W。 	
3	鋼筋續接器	<ol style="list-style-type: none"> 113年5月取樣(地下室至一樓)-續接器。 113年9月取樣(一樓至二樓)-續接器。 113年3月取樣(二樓至三樓)-續接器。 	
4	其他取樣	<ol style="list-style-type: none"> 114年3月鋁門窗取樣。 	
5	現場試驗項目	<ol style="list-style-type: none"> 113年5月密度試驗(車道)。 113年11月密度試驗(回填區)。 113年2月地下室給水試壓。 113年4月一樓給水試壓。 	


花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程查核情形

項次	日期	單位	查核結果	備註
1	113/06/03	花蓮縣政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查核分數78分(乙等)。 2. 專案管理暨監造單位扣5點、統包廠商扣6點。 3. 經2次提送改善對策，於113年8月30日經縣府備查。 	
2	113/10/09	教育部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查核分數75分(乙等)。 2. 專案管理暨監造單位扣7點、統包廠商扣7點。 3. 訂於113年12月2日前完成改善提報教育部。 	
3	預計114年6月 擴大督導	文化局	尚未	


目前工程執行進度與 未來半年預計進度

(聚全營造股份有限公司-統包廠商)


執行進度概述

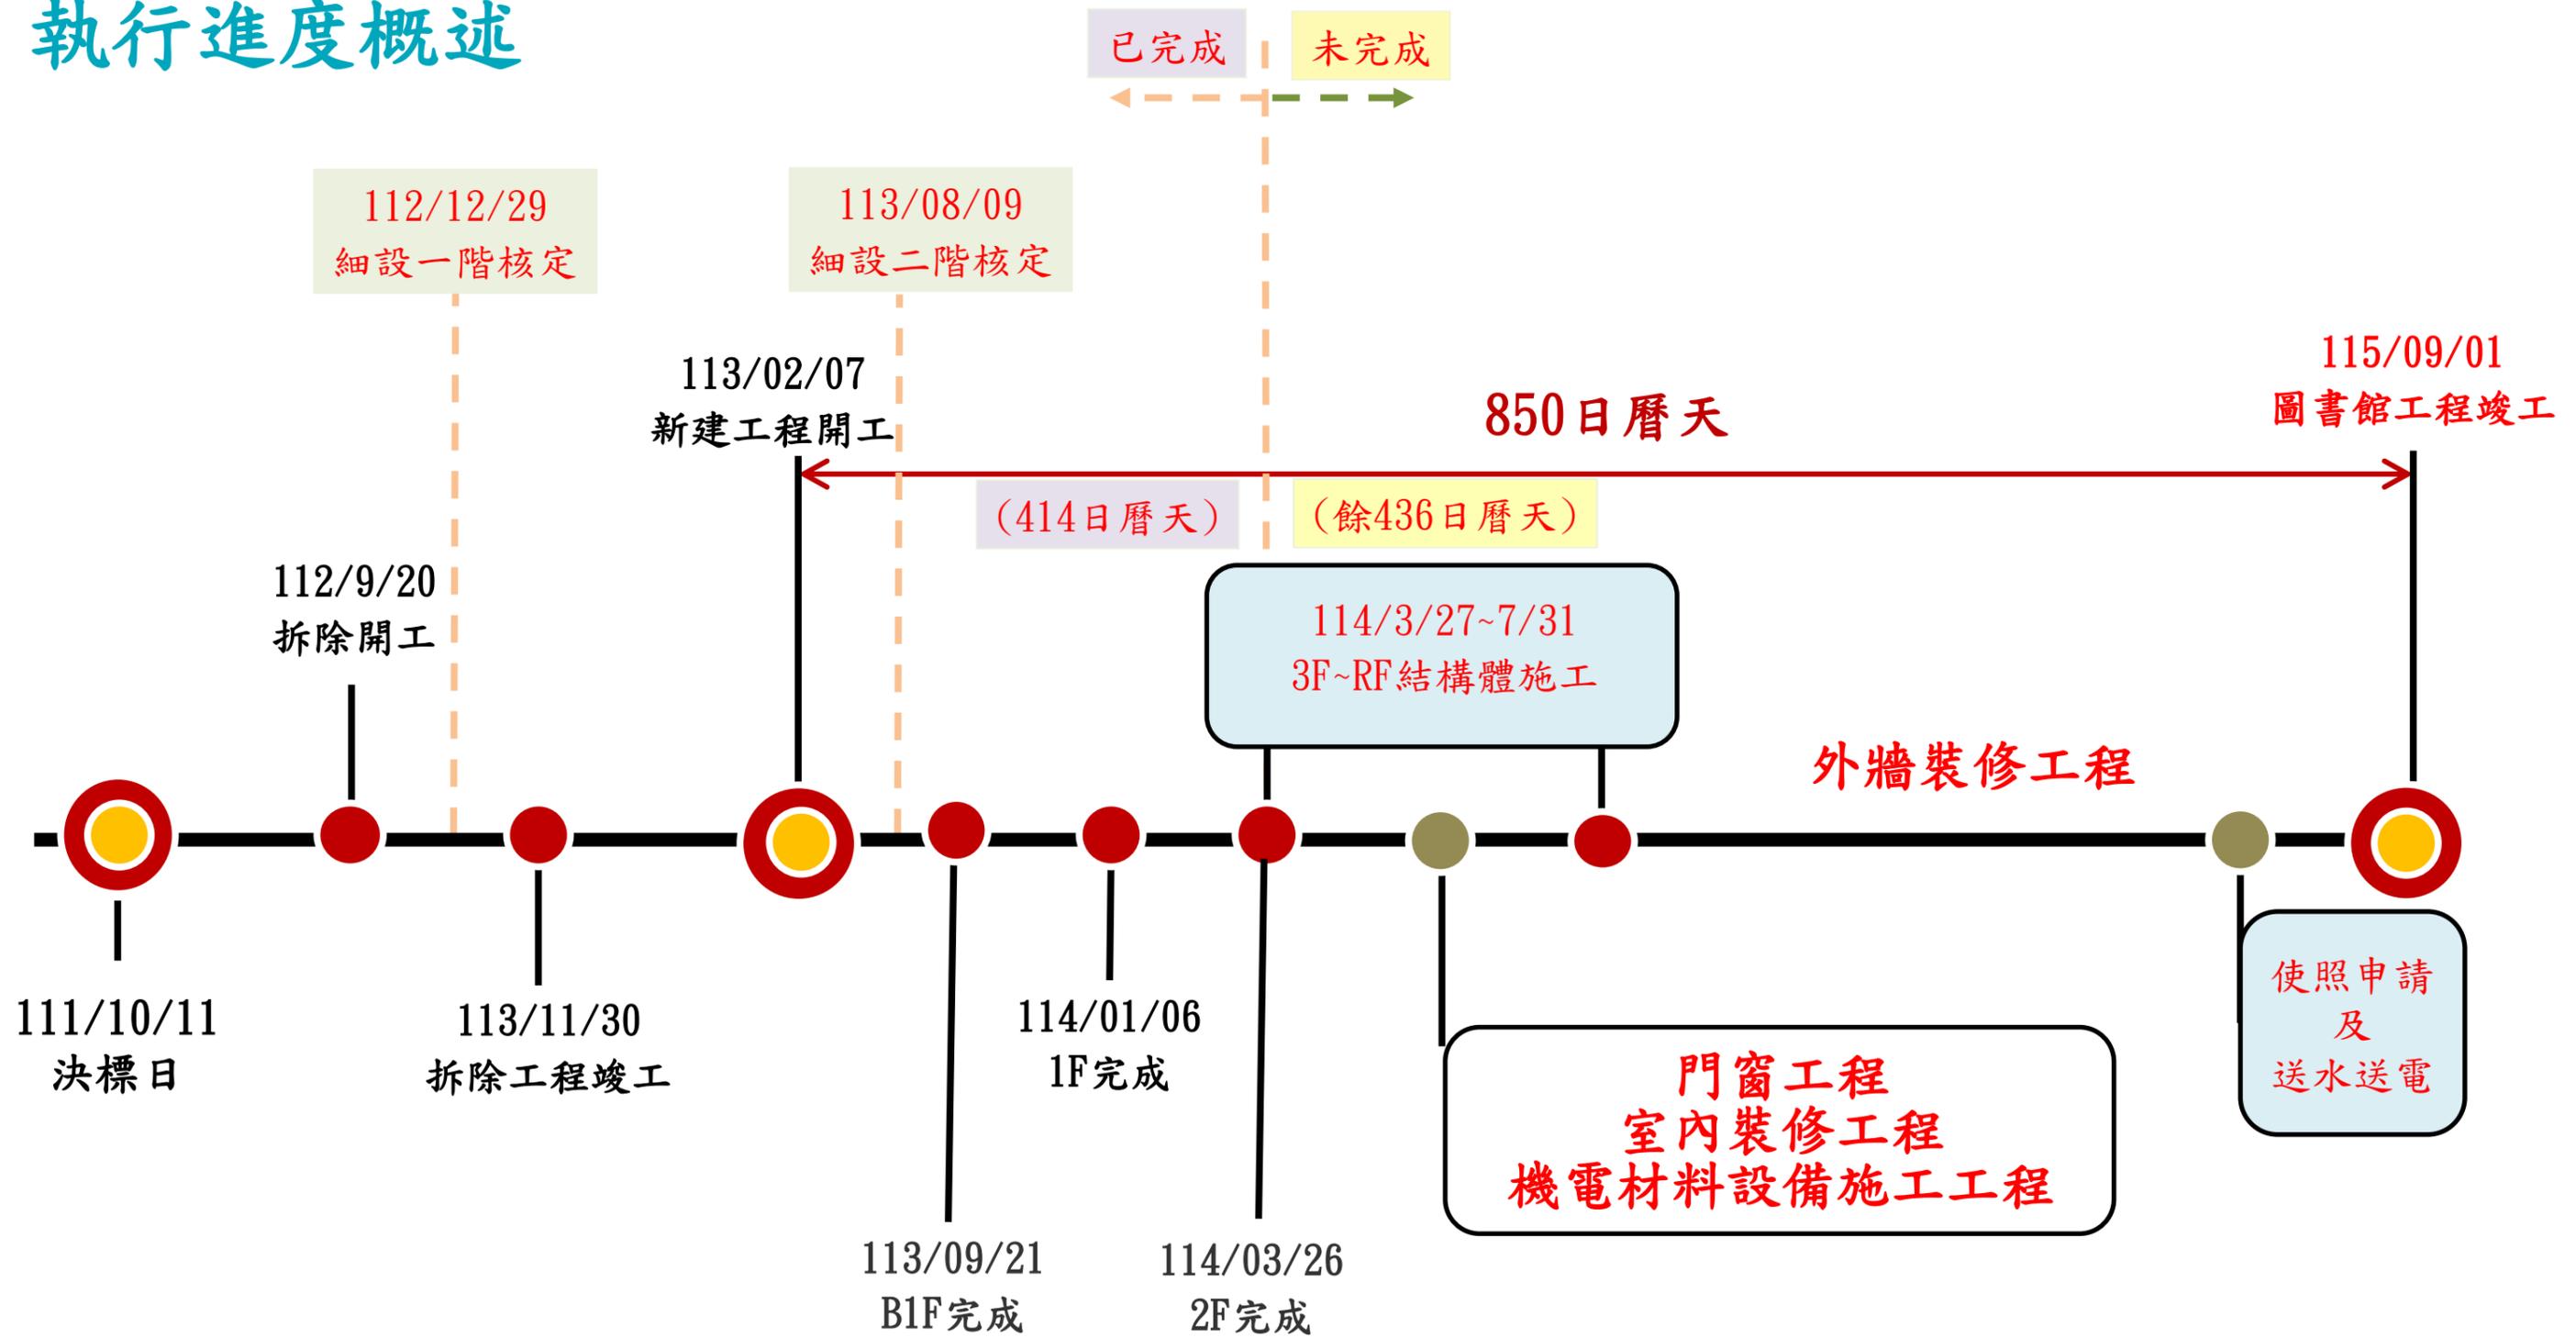

新建工程-113年02月07日至115年06月29日

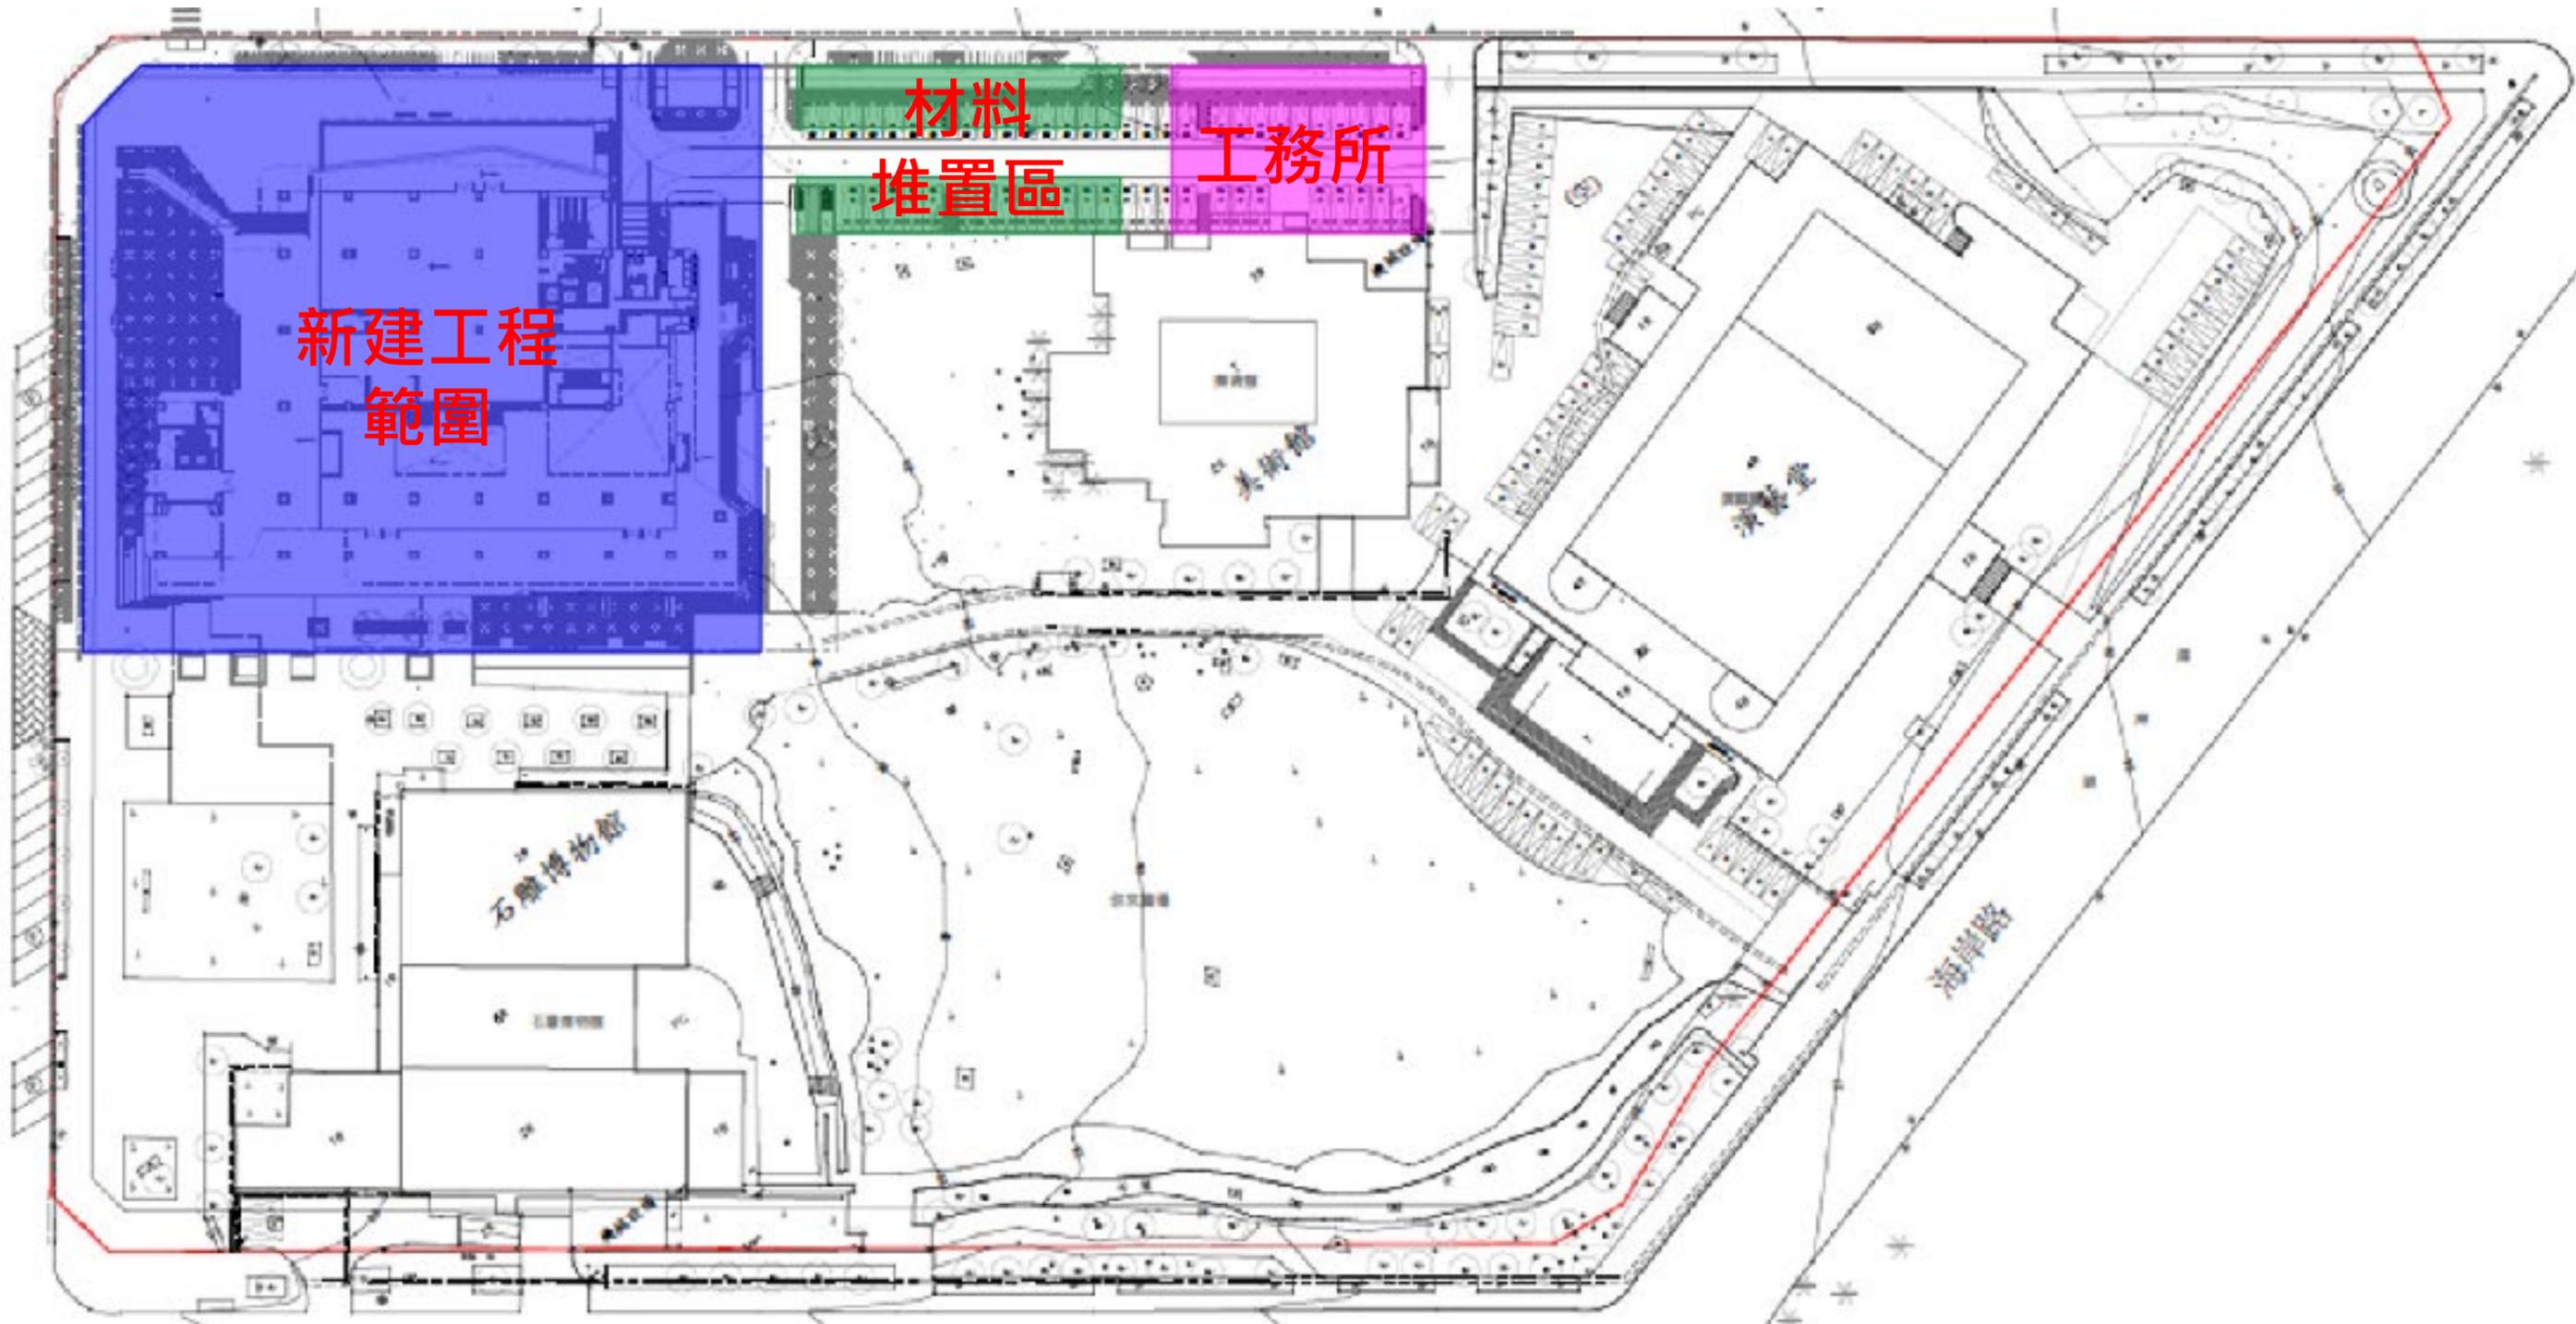


花蓮縣新建圖書館統包工程

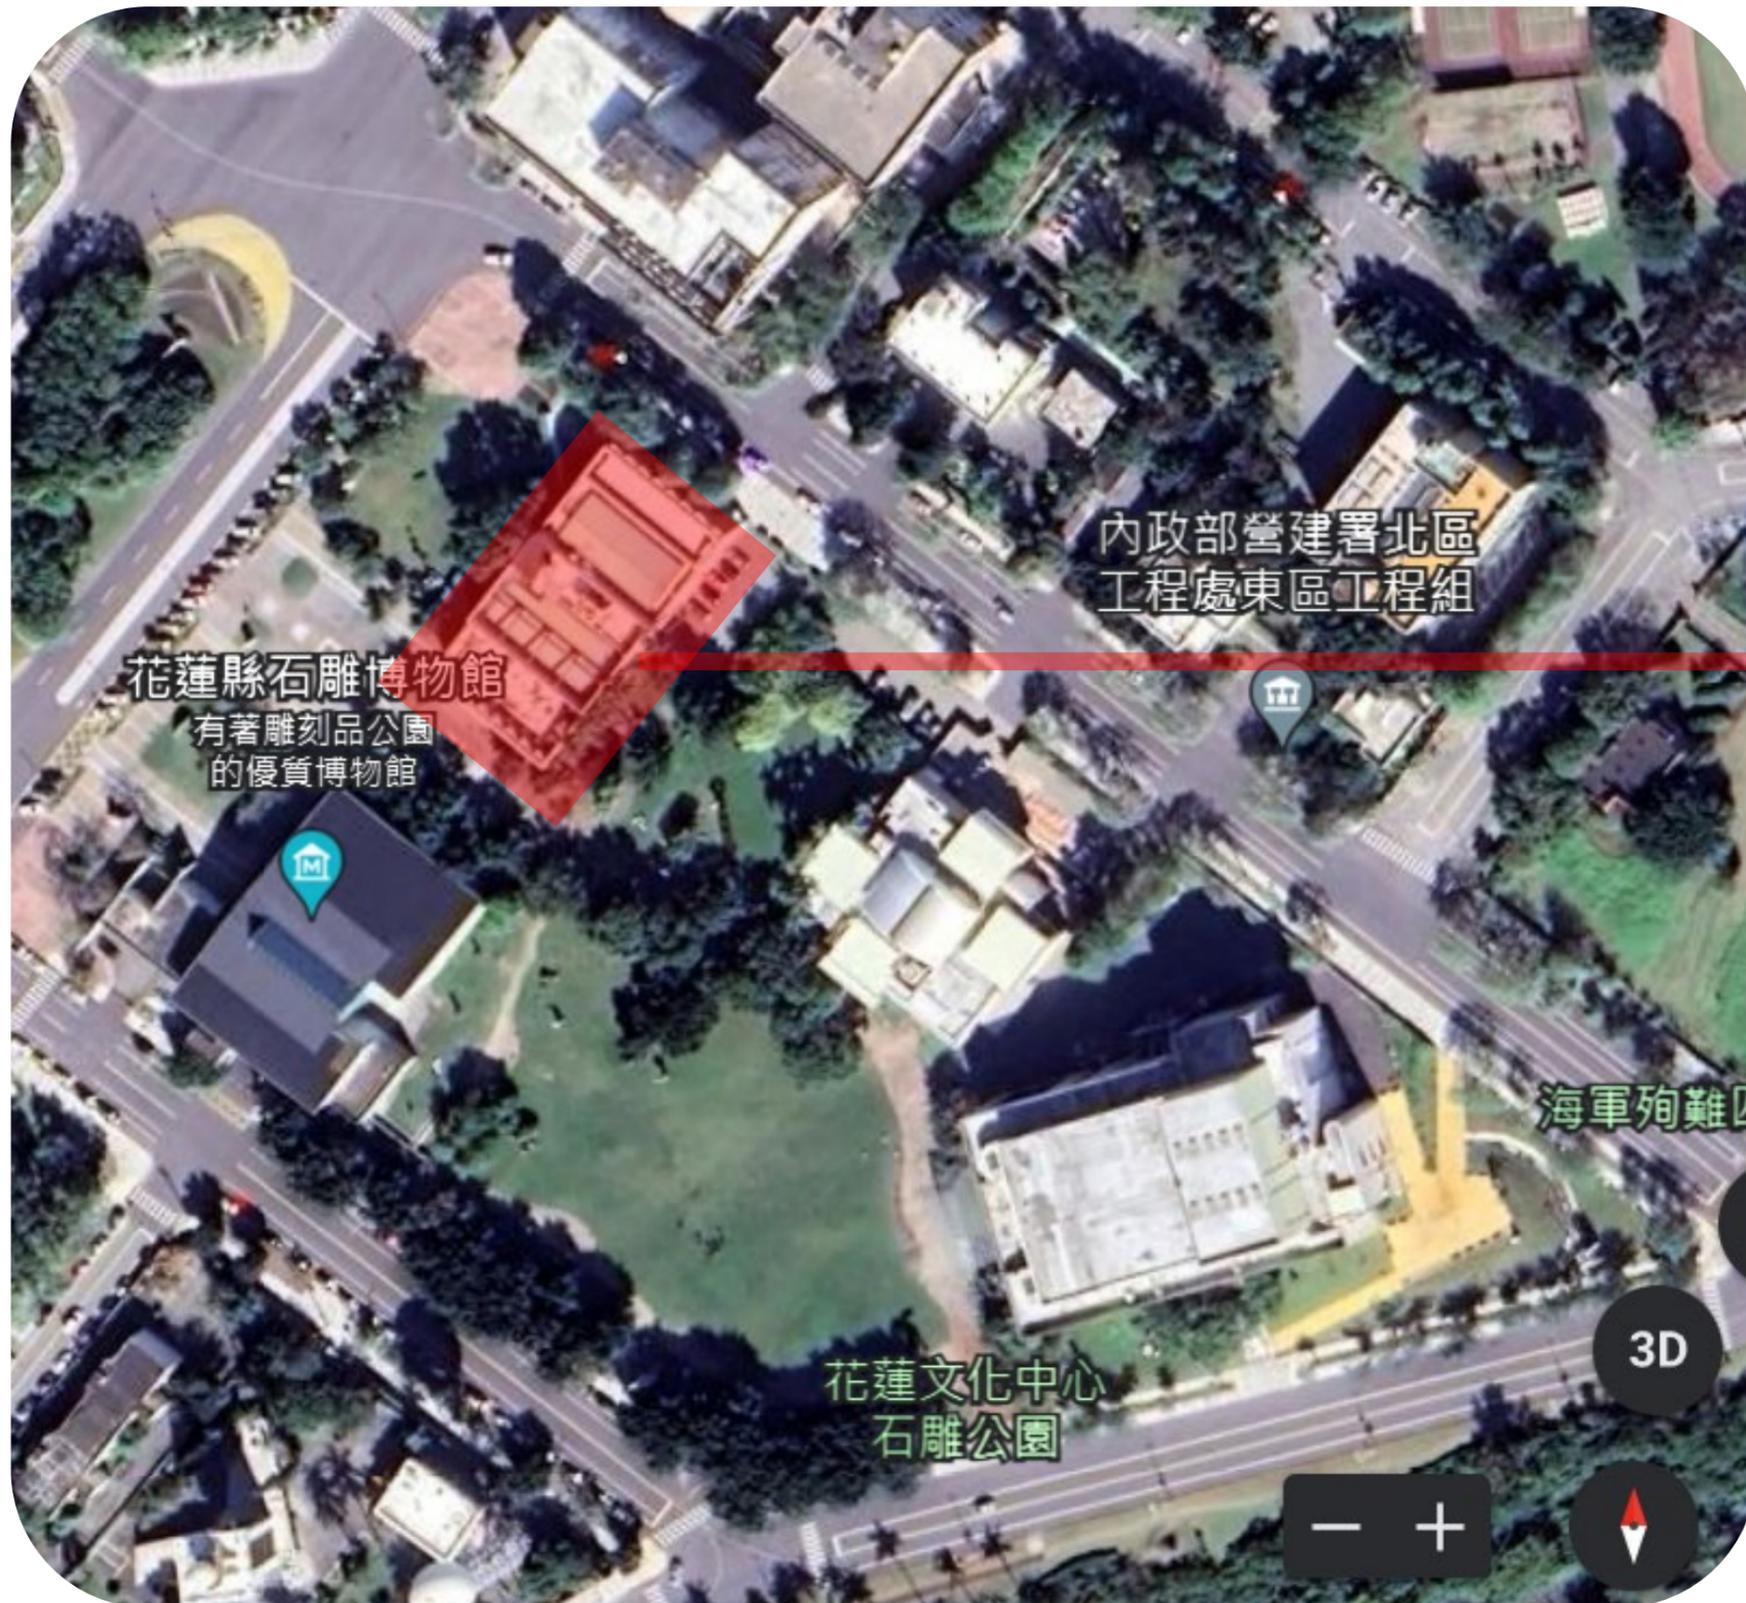

施工項目概述

1. 拆除階段(已完成)
2. 新建結構體階段
 - A. 開挖工程(已完成)
 - B. 基礎工程(已完成)
 - C. B1F結構體(已完成)
 - D. 1F結構體(已完成)
 - E. 2F結構體(已完成)
 - F. 3F結構體(施工中)
 - G. 4F結構體
 - H. RF結構體
3. 裝修工程


結構體施工期程說明

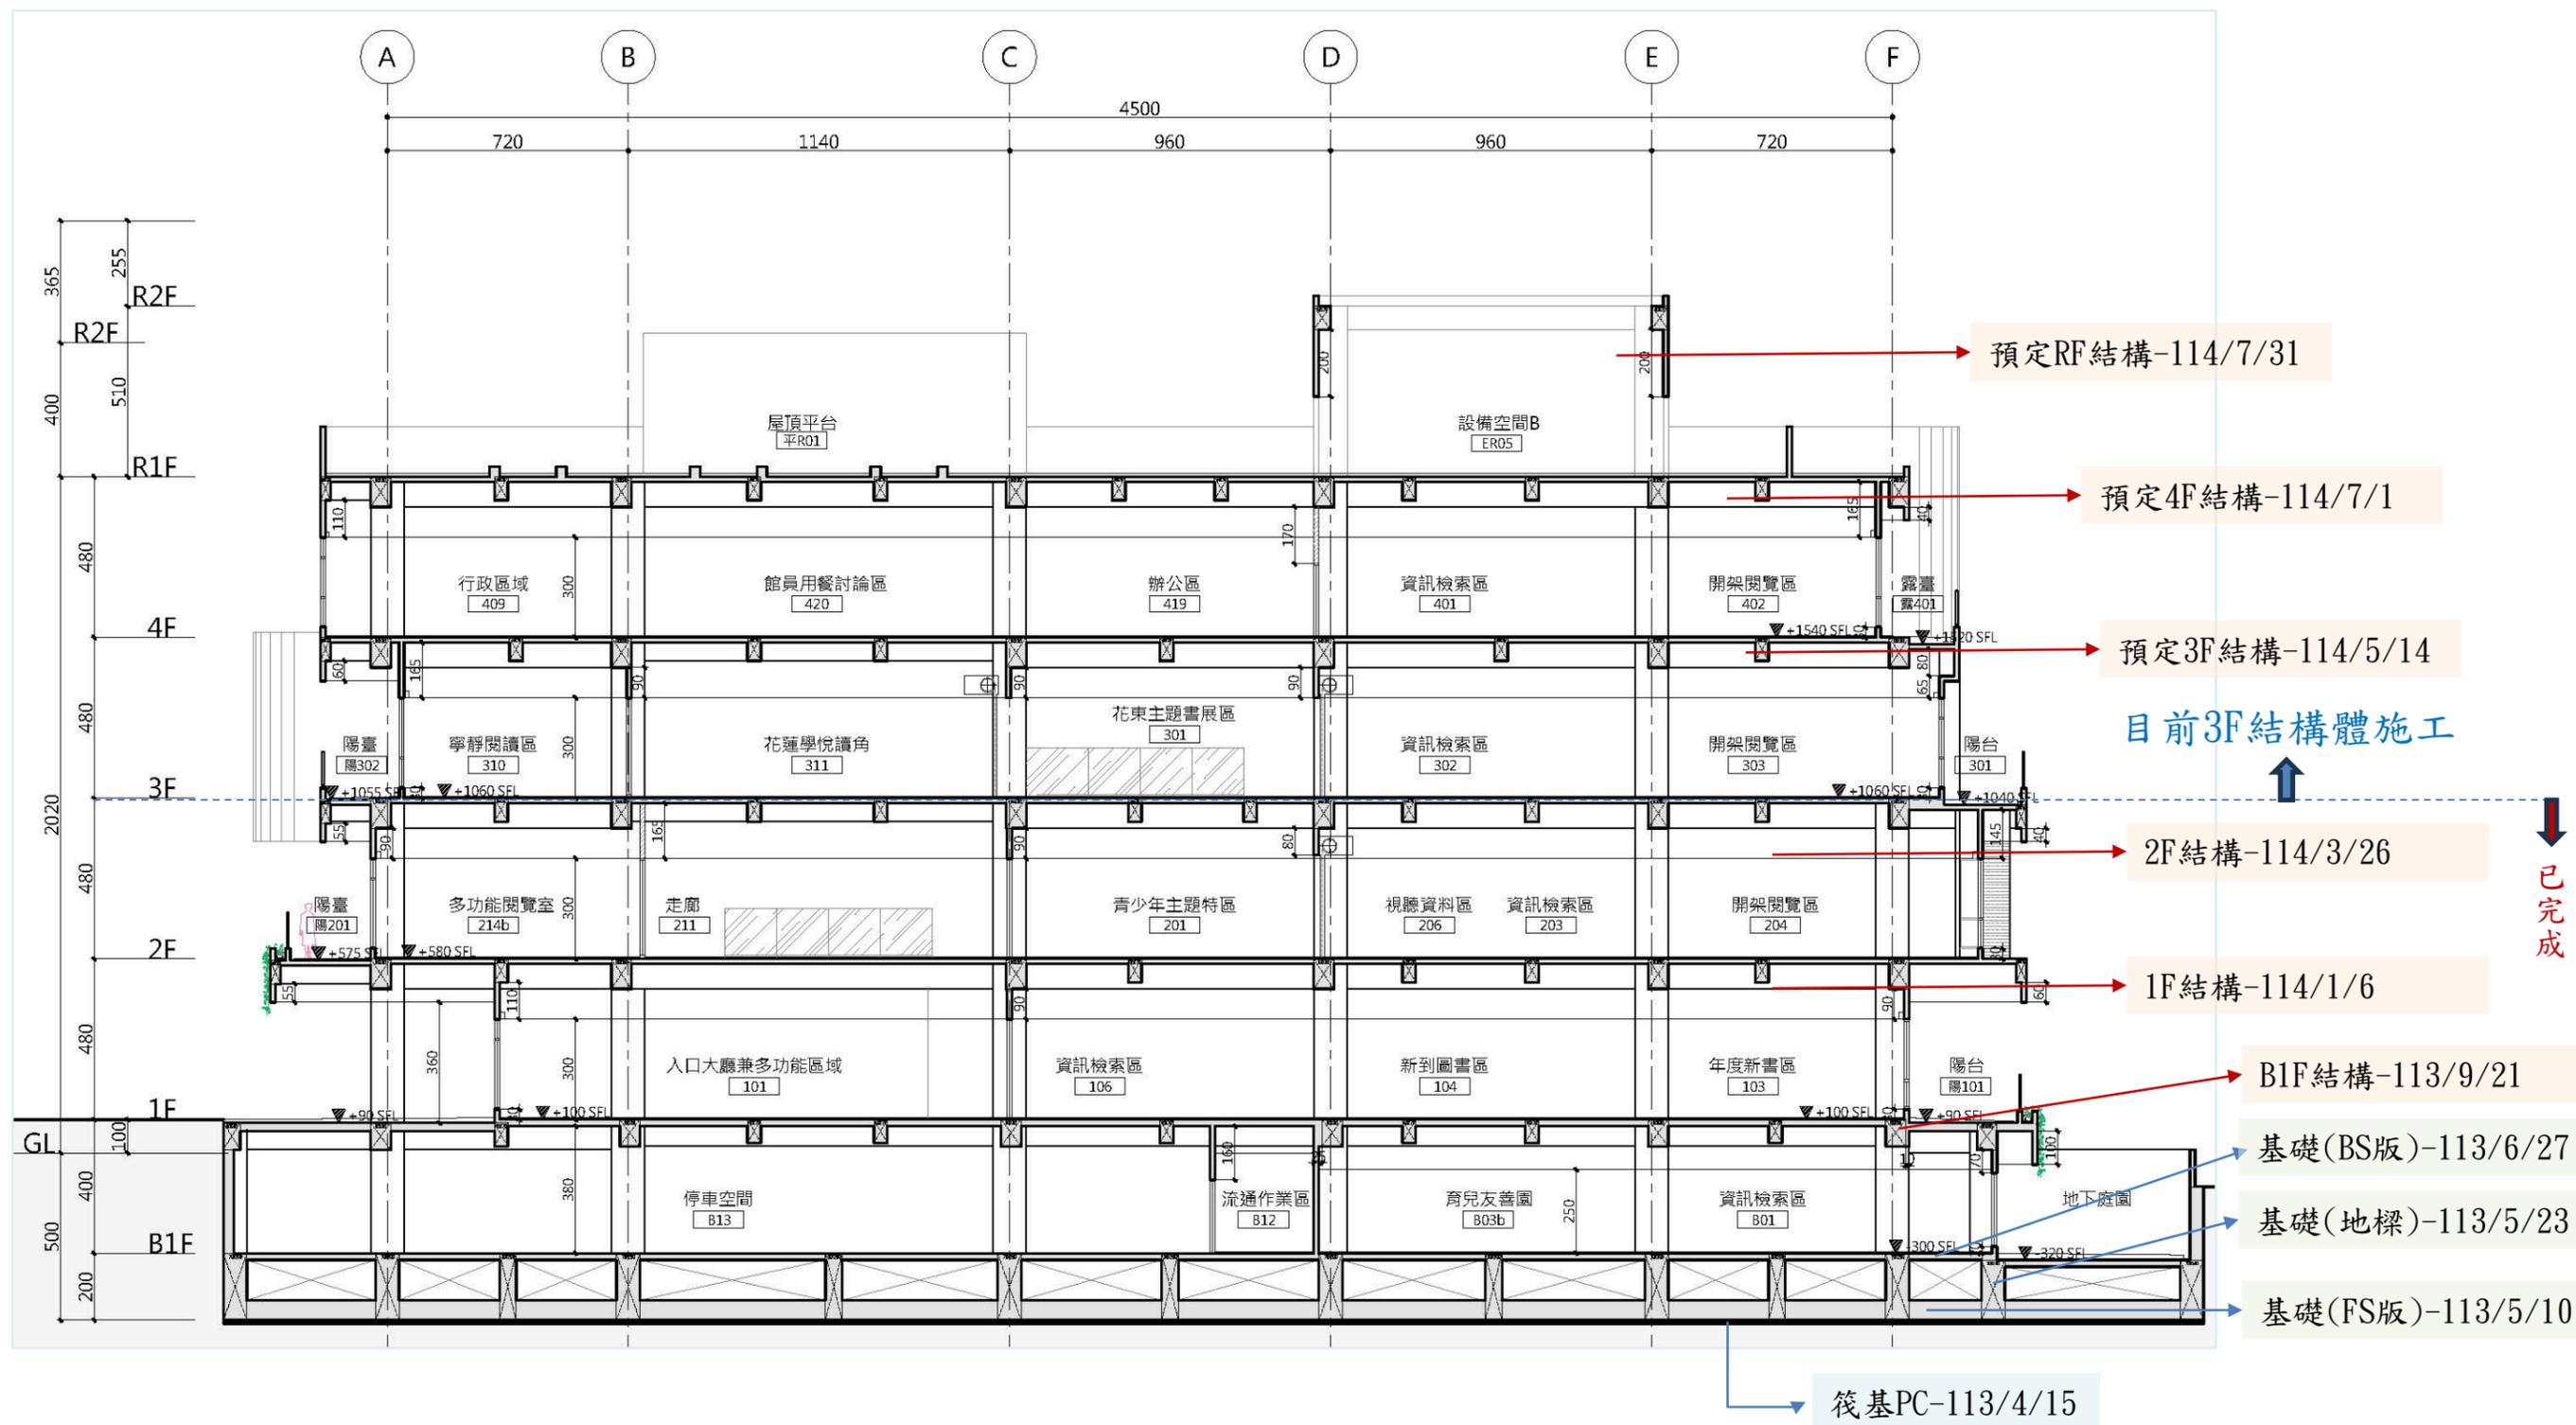

施工期程進度說明

114/4/15~10/15 預定施工情形概述

- 1、結構體工項完成
- 2、室內外泥作工項施作
- 3、門窗框安裝施作
- 4、材料設備送審作業

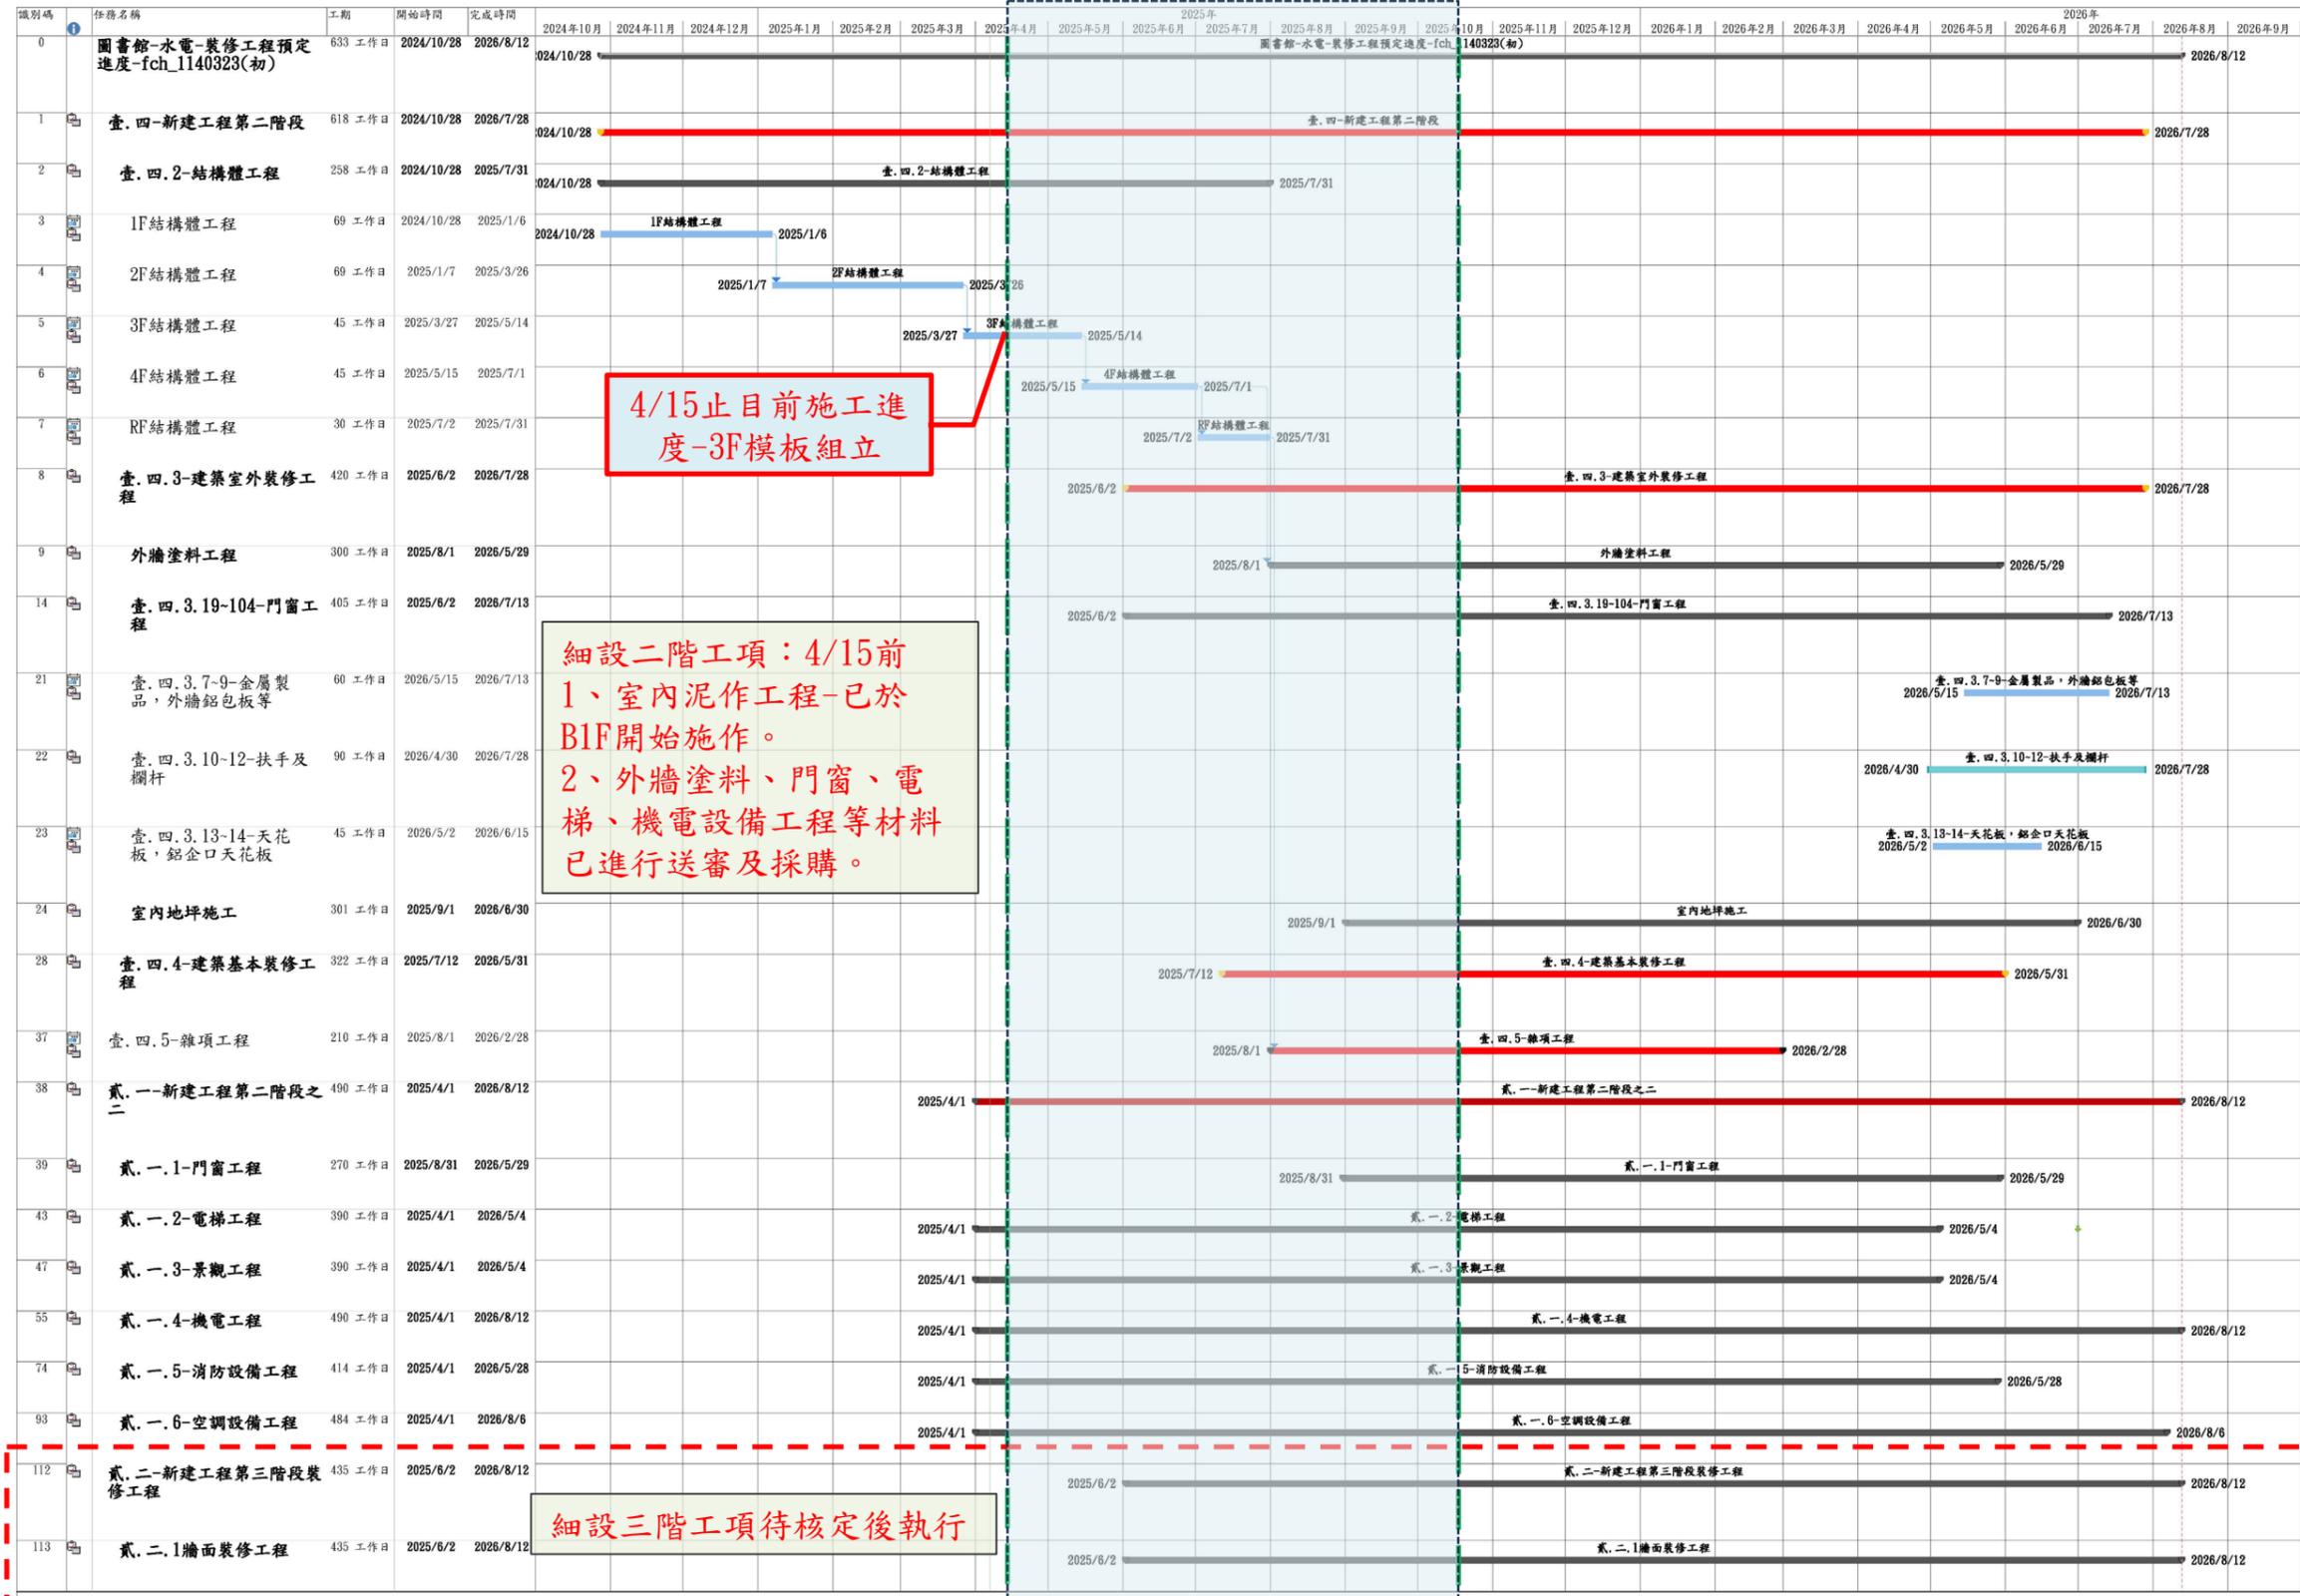


4/15止目前施工進度-3F模板組立

細設二階工項：4/15前
1、室內泥作工程-已於B1F開始施作。
2、外牆塗料、門窗、電梯、機電設備工程等材料已進行送審及採購。

細設三階工項待核定後執行




土建工程-1F結構施工(113/11/19~114/01/06)

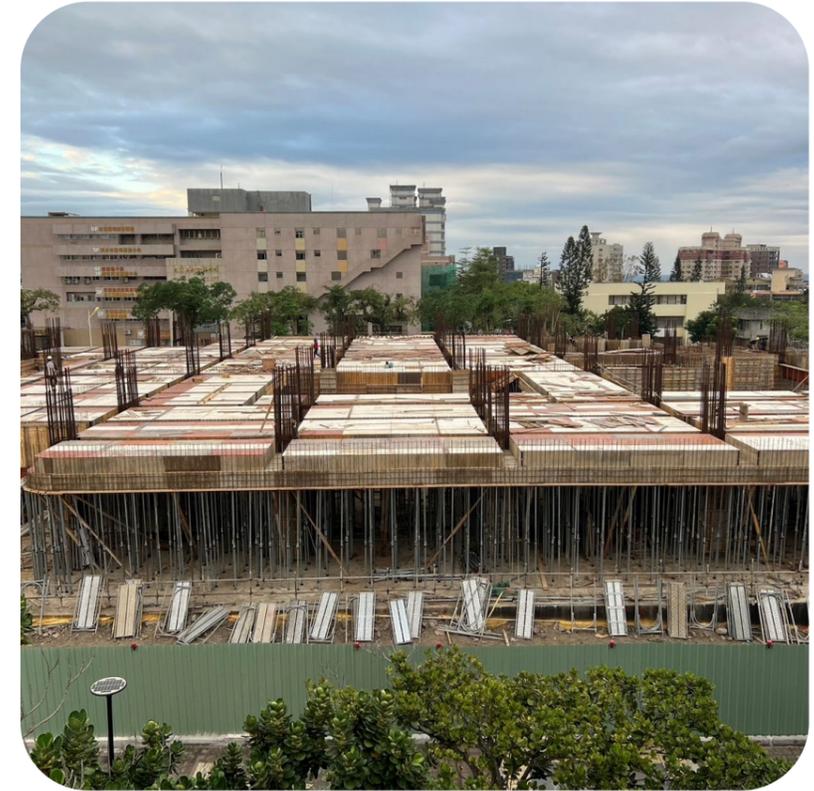



土建工程-2F結構施工(114/01/07~114/03/26)





土建工程-3F結構施工(114/03/27~114/04/15)

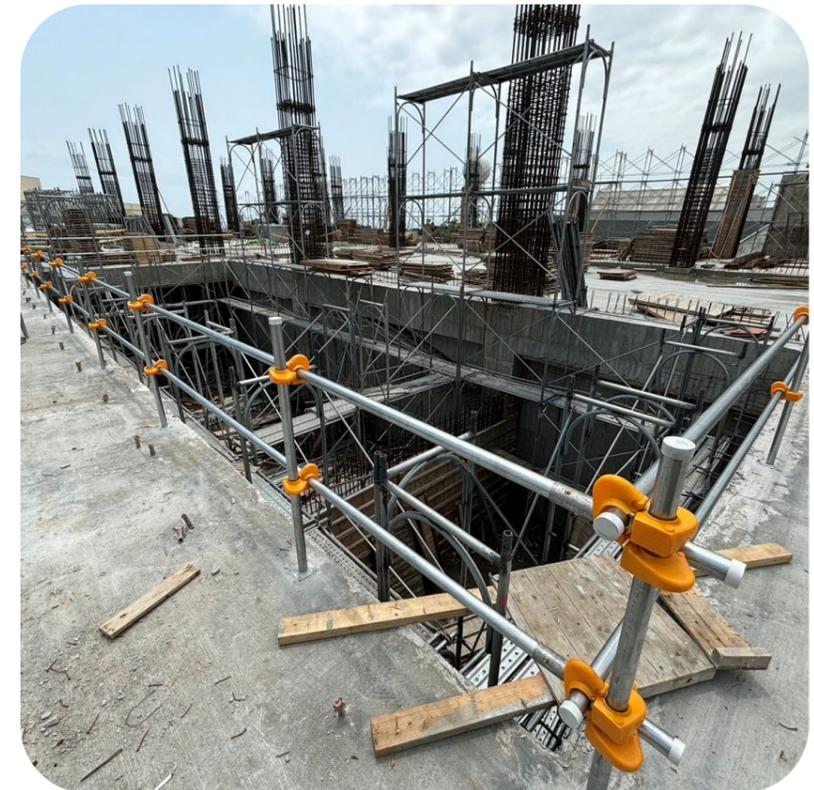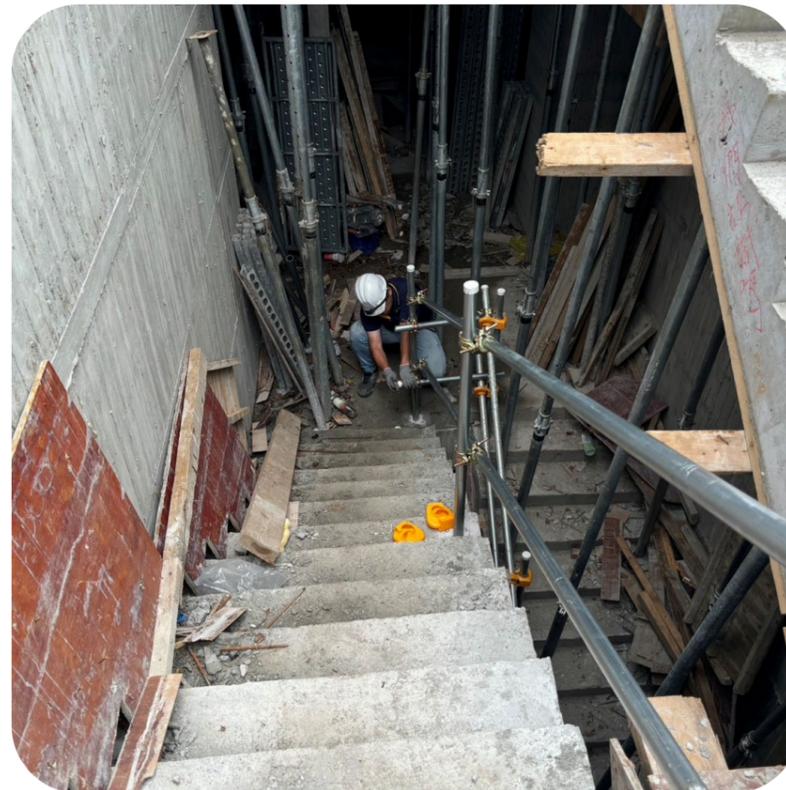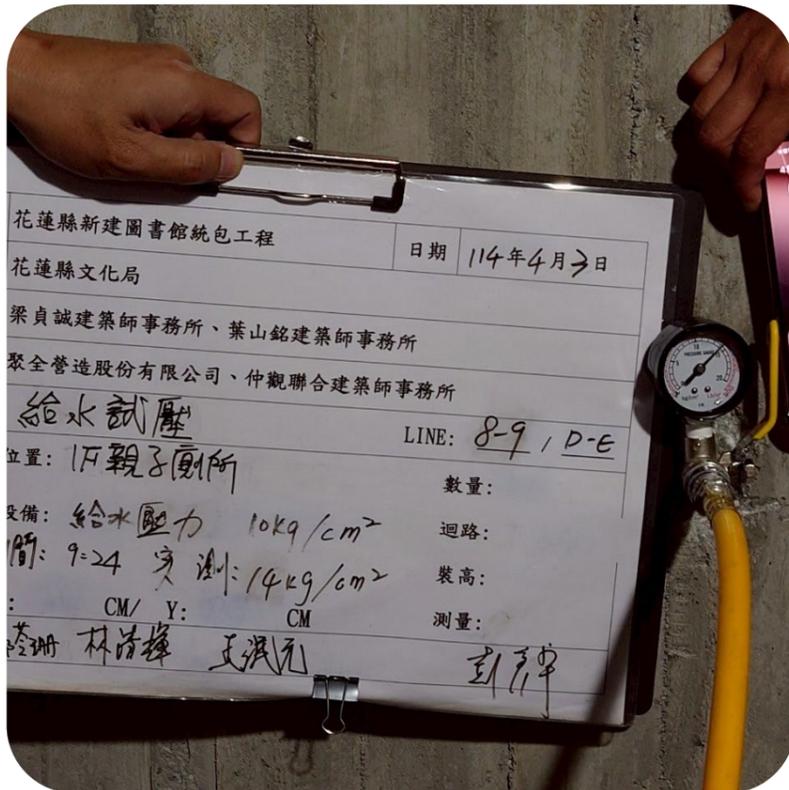



自主檢查、查驗-1F鋼筋工項

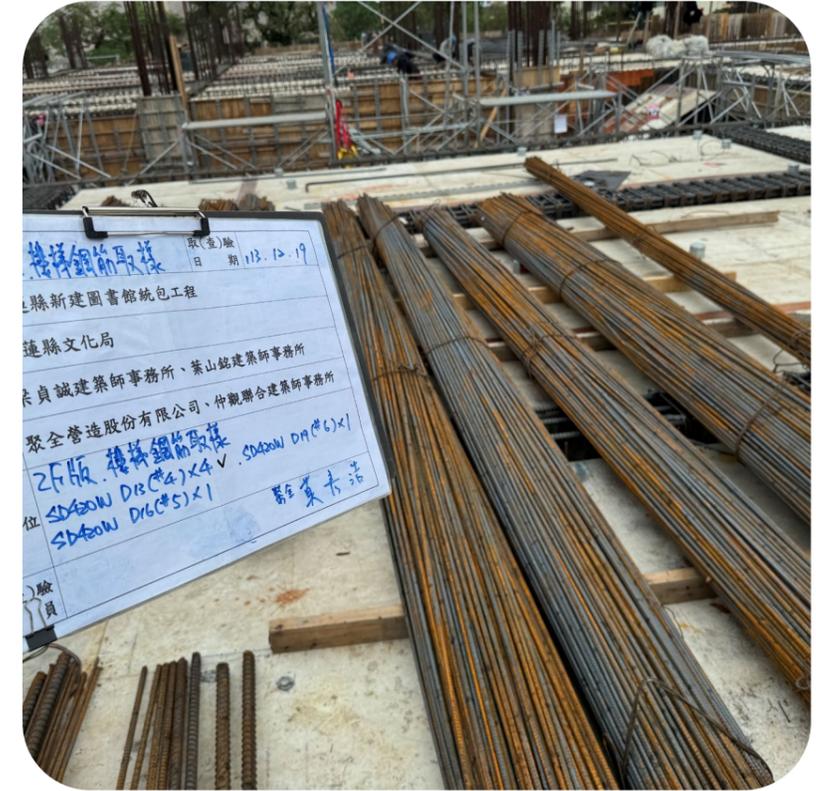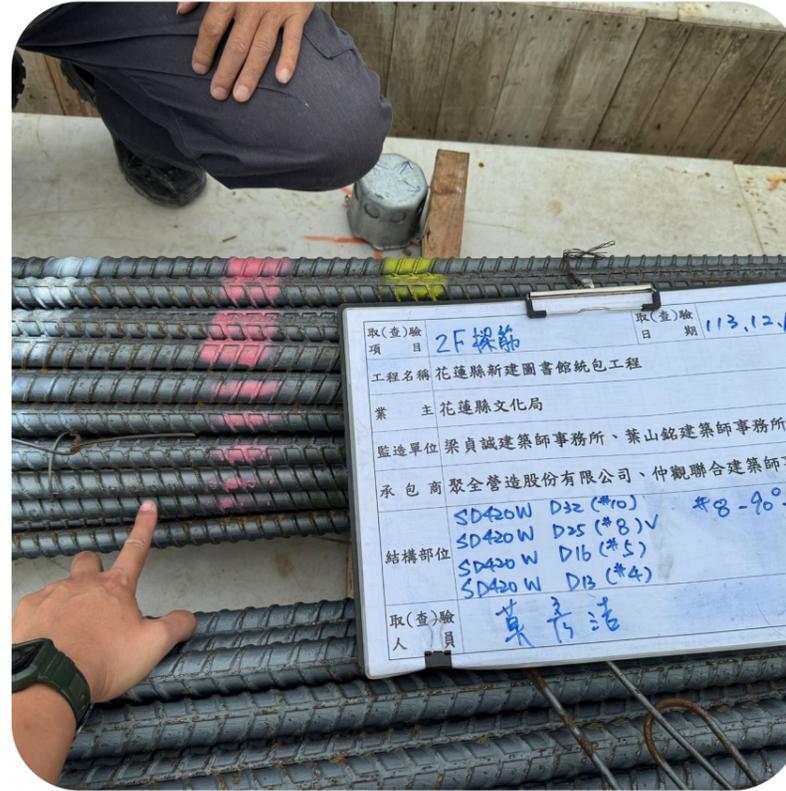


自主檢查、查驗-2F鋼筋工項

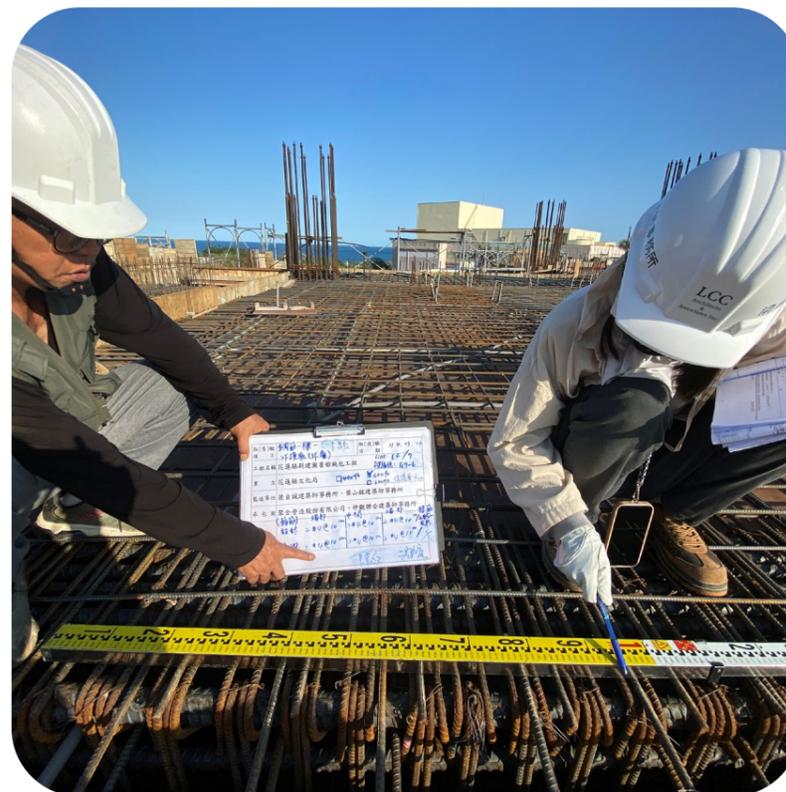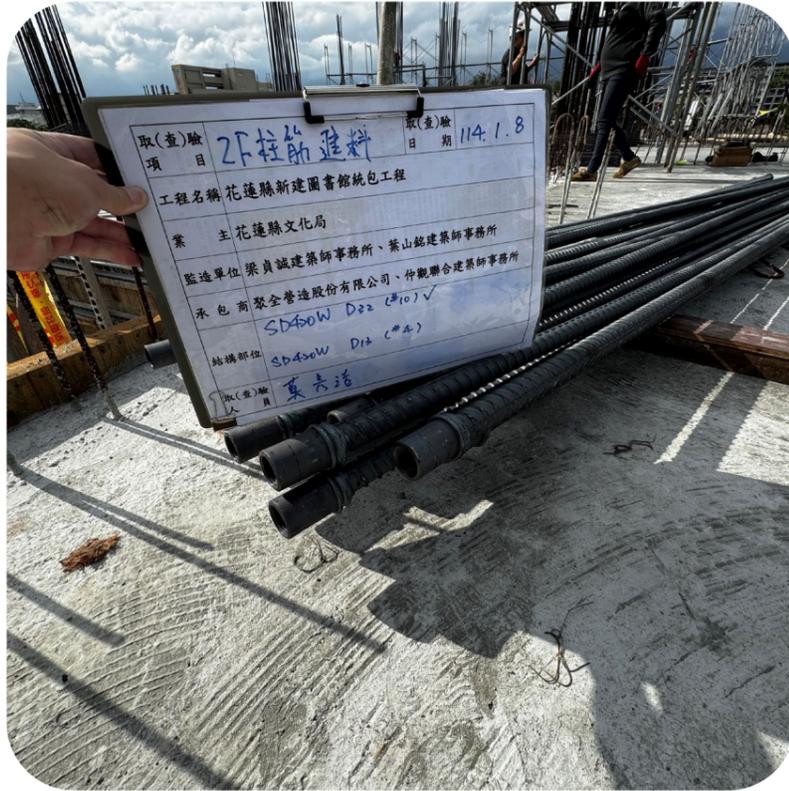




自主檢查、查驗-機電工項

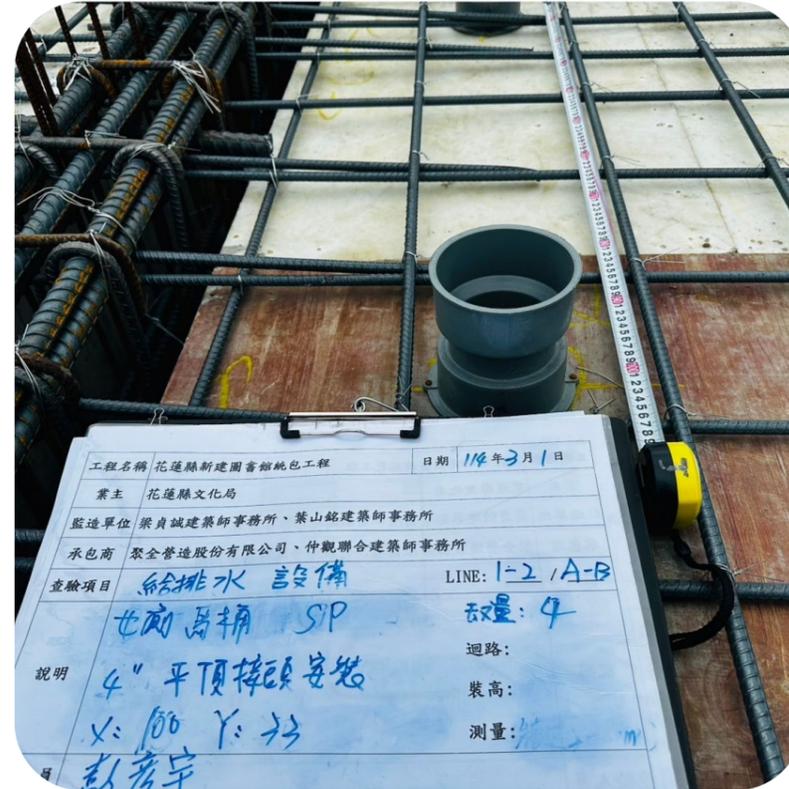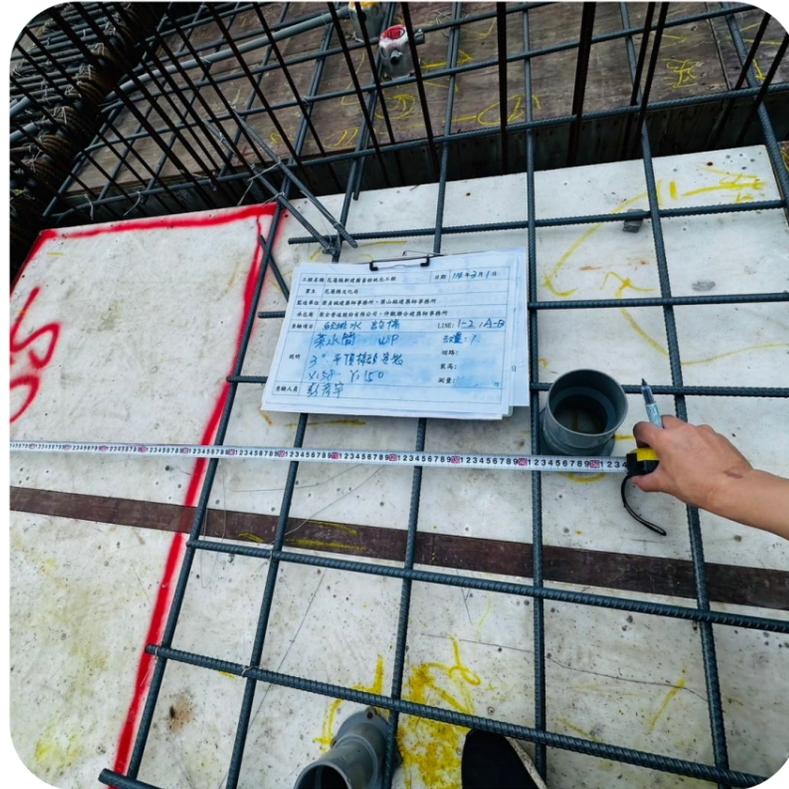

檢(試)驗相關作業

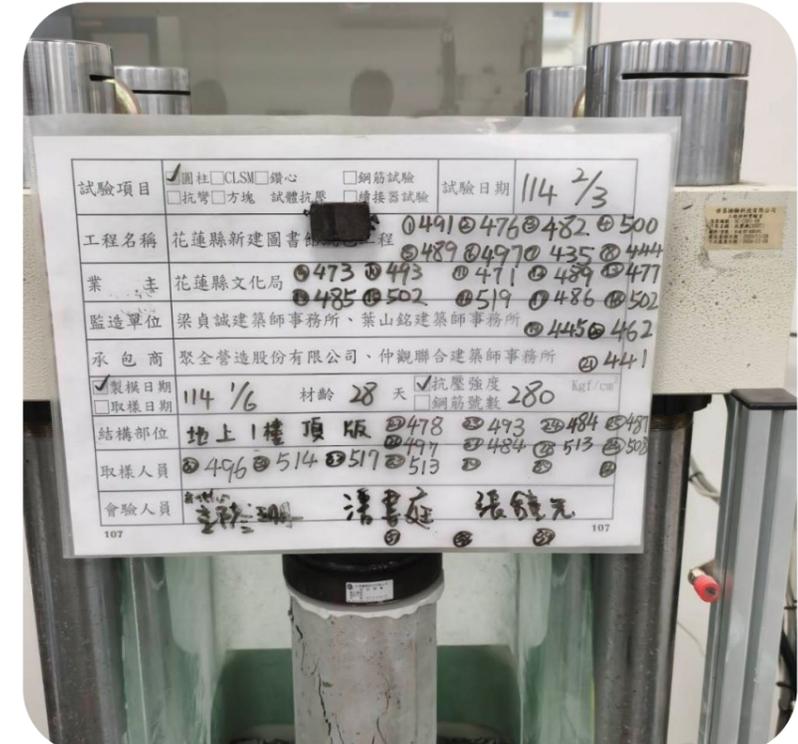

職安衛、環境保護作業

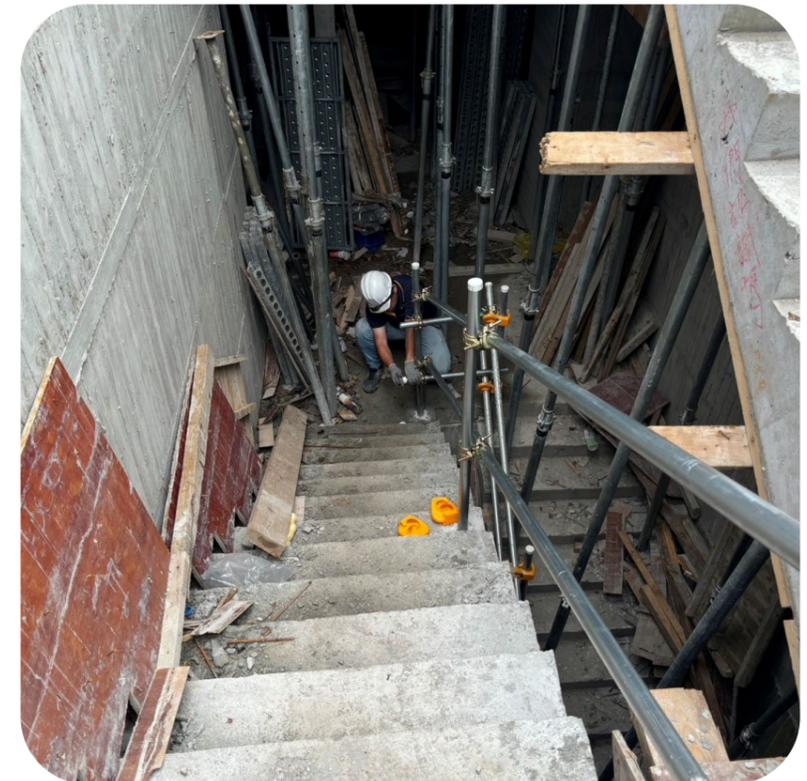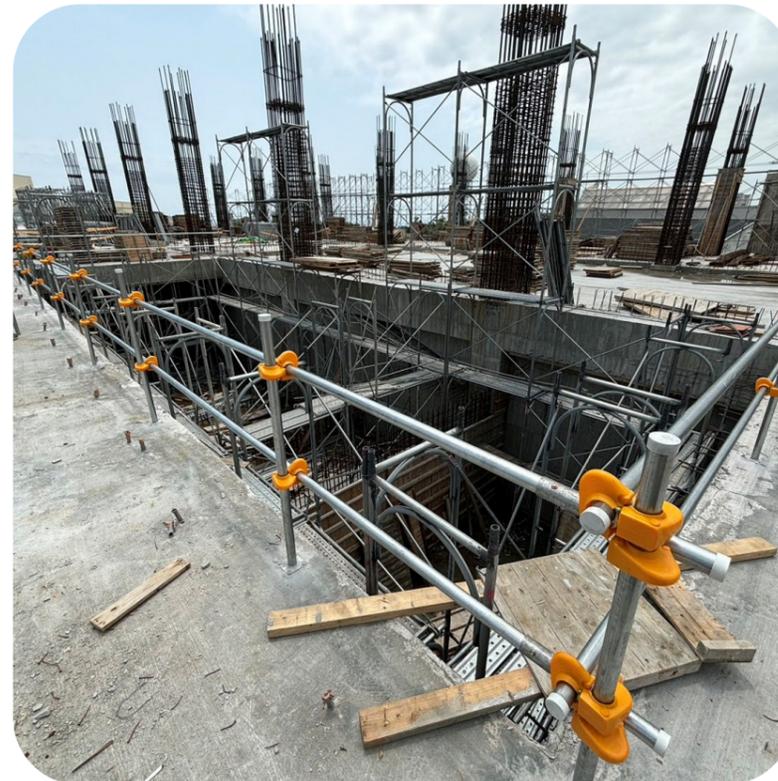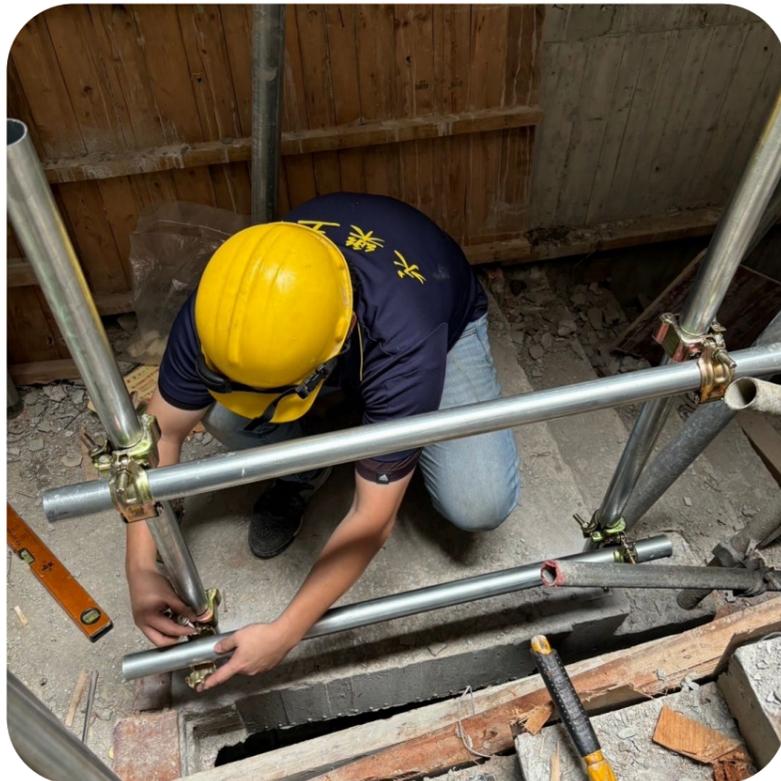

各項工程文件審查情形、 監造所見問題與年監造執 行重點

(梁貞誠建築師事務所-專案管理暨監造)

一、契約應辦事項說明

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商設計及施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	廠商提報日	有無逾期	進度說明
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	無逾期	機關同意備查
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後 20 日內 由機關於招標時載明 提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
6	地質鑽探及試驗工作計畫書		-	111.12.29	無逾期	機關同意備查
7	拆除計畫	依據核定工作執行計畫書於112.1.12	112.1.12	112.1.12	無逾期	機關同意備查
8	基本設計報告書及圖冊/ BIM基本設計報告書及模型檔	依據核定工作執行計畫書於112.2.15	112.2.15	112.2.15	無逾期	機關同意備查
9	細部設計報告書及圖冊/ BIM細部設計報告書及模型檔	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.8.5	112.7.24		審查中
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.15	112.8.15	112.8.15	無逾期	審查中
11	樹木移植計畫書			112.2.6	無逾期	機關同意備查
12	地質鑽探及試驗地基調查報告書			112.3.2	無逾期	機關同意備查
13	拆除工程分項施工計畫書	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.1	112.8.1	112.5.24	無逾期	機關同意備查
14	建造執照申辦	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.23	112.8.23	112.6.27	無逾期	已於112.10.16取得

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案
統包廠商設計階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21			111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031號	貞誠公(花圖)字第1111107001號	(111)巨圖字第2203-1114號	貞誠公(花圖)字第1111121002號			蓮文行字第1110012958號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	112.07.21					112.07.28	
				(112)巨圖字第2203-0720號	貞誠公(花圖)字第1120721001號					蓮文行字第1120007986號	
				審查中	同意核定					同意備查	
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	111.11.21					111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-01號	貞誠公(花圖)字第1111121004號					蓮文行字第1110012960號	
				審查中	同意核定					同意備查	
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21			111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-02號	貞誠公(花圖)字第1111107003號	(111)巨圖字第2203-1114-01號	貞誠公(花圖)字第1111121003號			蓮文行字第1110012959號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後20日內由機關於招標時載明提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	110.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21			111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-03號	貞誠公(花圖)字第1111107004號	(111)巨圖字第2203-1114-02號	貞誠公(花圖)字第1111121001號			蓮文行字第1110012957號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
6	地質鑽探及試驗工作計畫書			111.12.29	112.01.05					112.01.16	
				(111)巨圖字第2203-1229號	貞誠公(花圖)字第1120105002號					蓮文行字第1120000271號	
				審查中	同意核定					同意備查	
7	拆除計畫	統包商應按契約規定於工作執行計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報拆除計畫。	依據核定工作執行計畫書於112.1.12	112.01.12	112.01.18	112.02.10	112.02.17	112.02.24	112.03.03	112.03.22	
				(112)巨圖字第2203-0112號	貞誠公(花圖)字第1120118001號	(112)巨圖字第2203-0210號	貞誠公(花圖)字第1120217001號	(112)巨圖字第2203-0224號	貞誠公(花圖)字第1120303001號	蓮文行字第1120002222號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定	同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案												
統包廠商設計階段工作項目												
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明	
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆			機關回覆
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號			審查文號
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形		
8	基本設計報告書及圖冊/BIM基本設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「基本設計報告書及圖冊」。統包商應於提送基本設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.2.15	112.02.15/ 112.02.15	112.02.22	112.04.11	112.04.18			112.04.21		
				(112)巨圖字第2203-0215號/ (112)巨圖字第2203-0215-01號	貞誠公(花圖)字第1120222001號	(112)巨圖字第2203-0411號	貞誠公(花圖)字第1120418001號			蓮文行字第1120004132號		
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查		
9	細部設計報告書及圖冊/BIM細部設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.07.24	112.08.04	112.08.14	112.08.21	112.10.27	112.11.03	112.12.29		
				(112)巨圖字第2203-0724號	貞誠公(花圖)字第1120804001號	(112)巨圖字第2203-0814號	貞誠公(花圖)字第1120821001號	(112)巨圖字第2203-1027號	貞誠公(花圖)字第1121103002號	蓮文行字第1120012080號		
				審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	同意備查		
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.08.15	112.08.22	113.08.09	113.08.16			113.10.11		
				(112)巨圖字第2203-0815-02號	貞誠公(花圖)字第1120822001號	(112)仲建字第2203-0809號	貞誠公(花圖)字第1130816001號			蓮文行字第1130009646號		
				審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	同意核定			同意備查		

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
11	樹木移植計畫書			112.02.06	112.02.13	112.02.20	112.02.24			112.03.01	
				(112)巨圖字第 2203-0206號	貞誠公(花圖)字第 1120213001號	(111)巨圖字第 2203-0220號	貞誠公(花圖)字第 1120224001號			蓮文行字第 1120002038號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
12	地質鑽探及試驗地 基調查報告書			112.03.02	112.03.09					112.03.22	
				(112)巨圖字第 2203-0302號	貞誠公(花圖)字第 1120309001號					蓮文行字第 1120002390號	
				審查中	同意核定					同意備查	
13	拆除工程分項施工 計畫書			112.05.24	112.05.30	112.06.09	112.06.16	112.07.06	112.07.13	112.08.23	
				(112)巨圖字第 2203-0524號	貞誠公(花圖)字第 1120530001號	(112)巨圖字第 2203-0609號	貞誠公(花圖)字第 1120616001號	(112)巨圖字第 2203-0706號	貞誠公(花圖)字第 1120713001號	蓮文行字第 1120007682號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定	同意備查	
14	申請建築執照			112.06.27		112.09.07		112.09.14			112.10.16日 取得
				第一次圖審		第二次圖審		第三次圖審			
15	土方工程計畫書			112.11.30	112.11.02	112.11.24	112.11.29			112.03.01	
				(112)巨圖字第 2203-103001號	貞誠公(花圖)字第 1121102003號	(111)巨圖字第 2203-112403號	貞誠公(花圖)字第 1121129001號			蓮文行字第 1120002038號	
				審查中	檢退	審查中	檢退			同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
16	拆除土方暫置計畫書			112.12.07	112.12.20	113.01.08	113.01.10			113.01.18	
				(112)巨圖字第2203-120701號	蓮文行字第1120013789號	(112)巨圖字第2203-010802號	貞誠公(花圖)字第1120110007號			蓮文行字第1130000437A號	
				審查中	檢退	審查中	同意審查			同意核定	
17	整體施工計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起30日內提送		113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29	113.01.31	113.02.01	113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-011203號	貞誠公(花圖)字第1130119001號	(113)巨圖字第2203-012203號	貞誠公(花圖)字第1130129003號	(113)巨圖字第2203-013101號	貞誠公(花圖)字第1130201001號	蓮文行字第1130001338號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定	同意備查	
18	整體品質計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起30日內提送		113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29			113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-011204號	貞誠公(花圖)字第1130119002號	(113)巨圖字第2203-012201號	貞誠公(花圖)字第1130129001號			蓮文行字第1130001338號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
19	職業安全衛生管理計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起30日內提送		113.01.22	113.01.29					113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-012203號	貞誠公(花圖)字第1130129002號					蓮文行字第1130001338號	
				審查中	同意核定					同意備查	
20	第一階段施工要徑圖及工程預定進度網圖			113.03.04	113.03.07					113.04.18	
				(113)巨圖字第2203-030401號	貞誠公(花圖)字第1130307001號					蓮文行字第1130003458號	
				審查中	檢退					同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明	
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆			機關回覆
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號			審查文號
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形			審查情形
21	土方開挖工程分項施工計畫書(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.01.22	113.01.29	113.02.05	113.02.07			113.03.06		
				(113)巨圖字第 2203-012204號	貞誠公(花圖)字第 1130129004號	(113)巨圖字第 2203-020501號	貞誠公(花圖)字第 1130207002號			蓮文行字第 1130001731號		
				審查中	檢退	審查中	同意審查			同意備查		
22	鋼筋工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.03.04	113.03.07	113.03.11	113.03.12			113.04.02		
				(113)巨圖字第 2203-030401號	貞誠公(花圖)字第 1130307001號	(113)巨圖字第 2203-031101號	貞誠公(花圖)字第 1130312004號			蓮文行字第 1130002864號		
				審查中	檢退	審查中	檢退			同意備查		
23	混凝土澆置工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.03.07	113.03.12					113.04.02		
				(113)巨圖字第 2203-030701號	貞誠公(花圖)字第 1120312002號					蓮文行字第 1130002860號		
				審查中	同意核定					同意備查		
24	汛期工地防災減災計畫(第一版)			113.03.08	113.03.12					113.04.16		
				(113)巨圖字第 2203-030801號	貞誠公(花圖)字第 1120312006號					蓮文行字第 1130002863號		
				審查中	同意核定					同意核定		
25	交通安全維持及管制計畫			113.03.25	113.03.27					113.04.02		
				(113)聚圖字第 2203-032501號	貞誠公(花圖)字第 1120327001號					蓮文行字第 1130003515號		
				審查中	同意核定					同意備查		

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
26	安全監測分項施工計畫			113.03.28	113.03.29					113.04.16	
				(113)聚圖字第2203-032801號	貞誠公(花圖)字第1120329002號					蓮文行字第1130003641號	
				審查中	同意核定					同意備查	
27	模板工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.04.11	113.04.12					113.04.16	
				(113)聚圖字第2203-041103號	貞誠公(花圖)字第1120412001號					蓮文行字第1130004576號	
				審查中	同意核定					同意備查	
28	防水工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.04.12	113.04.15					113.04.18	
				(113)聚圖字第2203-041201號	貞誠公(花圖)字第1130415003號					蓮文行字第1130004626號	
				審查中	同意核定					同意備查	
29	施工架工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.04.12	113.04.15					113.04.18	
				(113)聚圖字第2203-041202號	貞誠公(花圖)字第1130415004號					蓮文行字第1130004627號	
				審查中	同意核定					同意備查	
30	臨時擋土設施(鋼軌樁)暨邊坡保護工程分項施工計畫書(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.04.15	113.04.17					113.04.25	
				(113)聚圖字第2203-041501號	貞誠公(花圖)字第1130417002號					蓮文行字第1130004724號	
				審查中	同意核定					同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
31	泥作工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.05.28	113.06.03					113.07.23	
				(113)聚圖字第 2203-052801號	貞誠公(花圖)字第 1130603001號					蓮文行字第 1130006614號	
				審查中	同意核定					同意備查	
32	升降機設備分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.07.15	113.07.22					113.08.02	
				(113)聚圖字第 2203-071505號	貞誠公(花圖)字第 113072201號					蓮文行字第 1130008611號	
				審查中	同意核定					同意備查	
33	接地工程分項施工計畫書	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.01.26	113.02.02					113.03.08	
				(113)巨圖字第 2203-012601號	貞誠公(花圖)字第 1130202001號					蓮文行字第 1130001541號	
				審查中	同意核定					同意備查	
34	電氣設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.19	113.12.27			114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120201號	貞誠公(花圖)字第1131210004號	(113)聚圖字第 2203-121901號	貞誠公(花圖)字第1131210004號			蓮文行字第 1140000076號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
35	弱電設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.18	113.12.26			114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120202號	貞誠公(花圖)字第1131210001號	(113)聚圖字第 2203-121802號	貞誠公(花圖)字第1140126003號			蓮文行字第 114000076號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案												
統包廠商施工階段工作項目												
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明	
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆			機關回覆
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號			
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形			
36	給排水設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.12.02	113.12.10	113.12.19	114.01.02			114.02.10			
			(113)聚圖字第 2203-120203號	貞誠公(花圖) 字第1131210003號	(113)聚圖字第 2203-121903號	貞誠公(花圖) 字第1140102002號			蓮文行字第 114000076號			
			審查中	同意核定	審查中	同意核定			同意備查			
37	消防設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.12.02	113.12.10	113.12.19	114.01.02			114.02.10			
			(113)聚圖字第 2203-120204號	貞誠公(花圖) 字第1131210002號	(113)聚圖字第 2203-121902號	貞誠公(花圖) 字第1140102001號			蓮文行字第 114000076號			
			審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查			

結論說明:本案自開工111/10/11起除每月月報外統包商共計辦理 **37項** 契約應辦事項目前共有 **0件** 逾期提送、**37件**核定後機關同意備查、**建築執照**已於112年10月16日取得。細部設計等**1件**持續辦理中。



未來半年監造執行重點


(一) 114年03月27日~05月14日 3F鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(二) 114年05月15日~07月01日 4F鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(三) 114年07月02日~07月31日 RF鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(四) 114年06月02日~室內裝修

(五) 114年08月01日~室外裝修



花蓮縣新建圖書館統包工程

監造計畫(二階進版)

表 7-5 混凝土工程施工抽查紀錄表

混凝土工程施工抽查紀錄表

編號:

工程名稱	花蓮縣新建圖書館統包工程		
分項工程名稱	地上1F頂板澆置		
抽查位置	取樣區	檢查日期	114年1月6日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	高程標誌設置	使用標高器1.5m一支	1.5 0
	柱牆清潔口	預留開口是否封閉	是 0
施工中	混凝土強度是否符合	設計強度280kg/cm ²	是 0
	混凝土坍度	15cm±4cm	19cm 0
	氯離子含量	0.15kg/m ³ 以下	0.022, 0.024, 0.026 0
	溫度	13-32度	19.6度 0
	試體取樣	每100m ³ 製作1組4個試體	是 0
	澆置方法、澆置順序	如澆置計畫書	澆置計畫書 0
	輸送管末端軟管之移送	避免損壞排繫之鋼筋	是 0
	混凝土出廠至澆置完成時間	90分鐘以內澆置完成	90分鐘以內 0
	使用振動器充分搗實	配置二台以上5-10秒/處	有振動器 0
澆置過程不可任意加水	不得加水	無加水 0	
施工後	澆置後養護	地坪養護以灑水或養護劑等保持表面濕潤狀態	/
	結構體表面蜂窩處理	使用同配比水泥砂漿修補	/

缺失複查結果:

已完成改善 (檢附改善前中後照片)

未完成改善, 填至「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期: 年 月 日

複查人員職稱: 簽名:

備註:

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

2. 抽查結果合格者註明「○」, 不合格者註明「×」, 如無需檢查之項目則打「/」。

3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

4. 檢查項目註記「▲」者為檢驗停留點抽查項目, 其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。

監造主任簽名: 吳漢元 0106


監造現場人員簽名: 潘書庭 114.01.06

施工照片查驗紀錄表

混凝土澆置-地上 1F 頂版


工程名稱: 花蓮縣新建圖書館統包工程

日期: 114.01.06

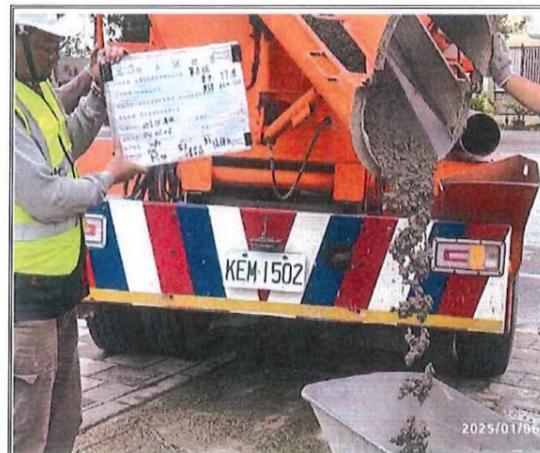


說明: 鳳勝第8組 車號: KEM-1502 下料 280kgf/cm²

照片一

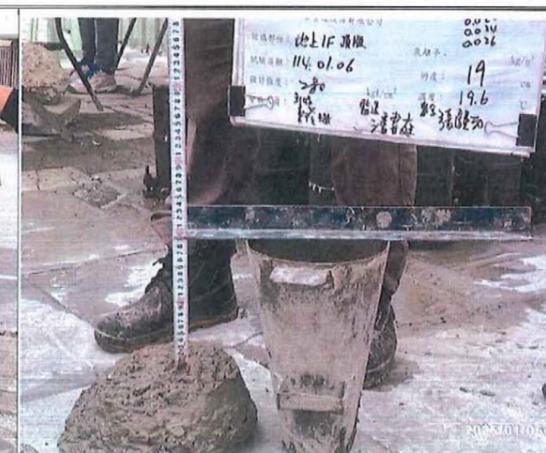


說明: 設計坍度 15cm±4cm 實測 19cm

照片二

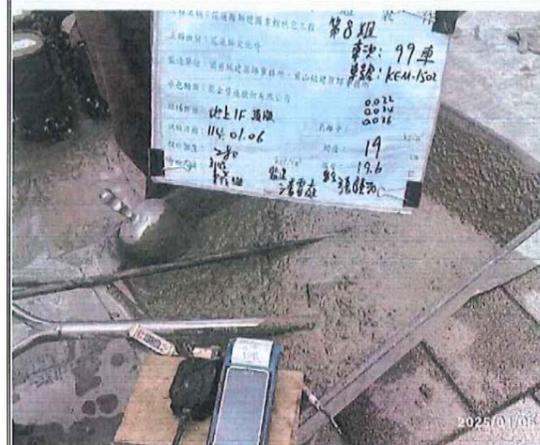

說明: 氯離子 0.022、0.024、0.026 溫度 19.6

照片三

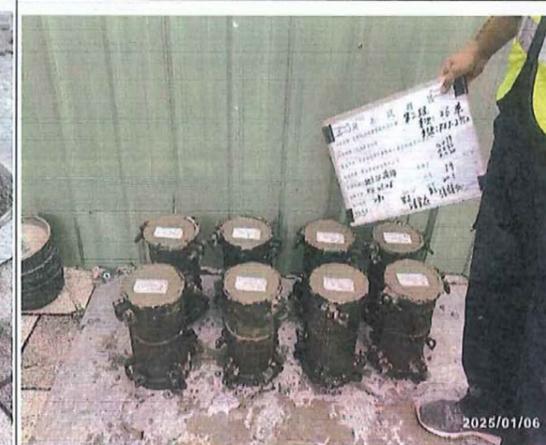

說明: 取樣入試體模

照片四

說明:

照片五


說明:

照片六

備註: 本表示適用於各項施工查驗表單之佐證資料, 並由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。




113.12.09
1F版筋查驗

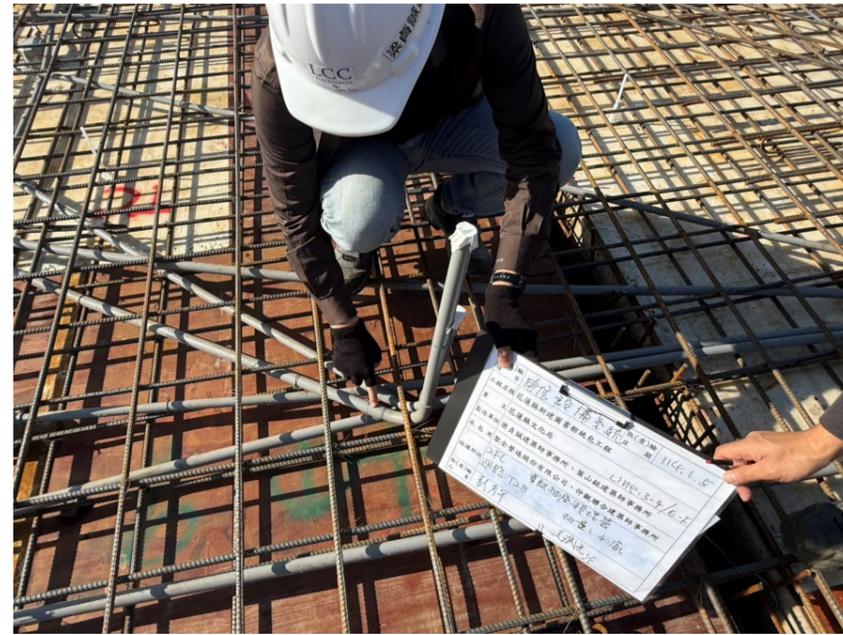


114.01.05
2F電信設備系統查驗



114.03.25
2F模板(柱)查驗

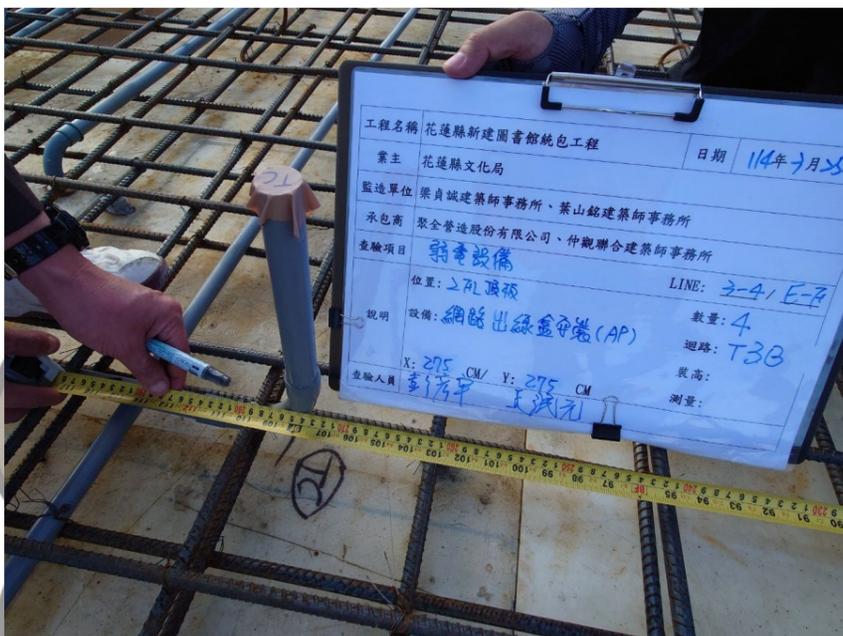

114.03.25
3F弱電設備查驗

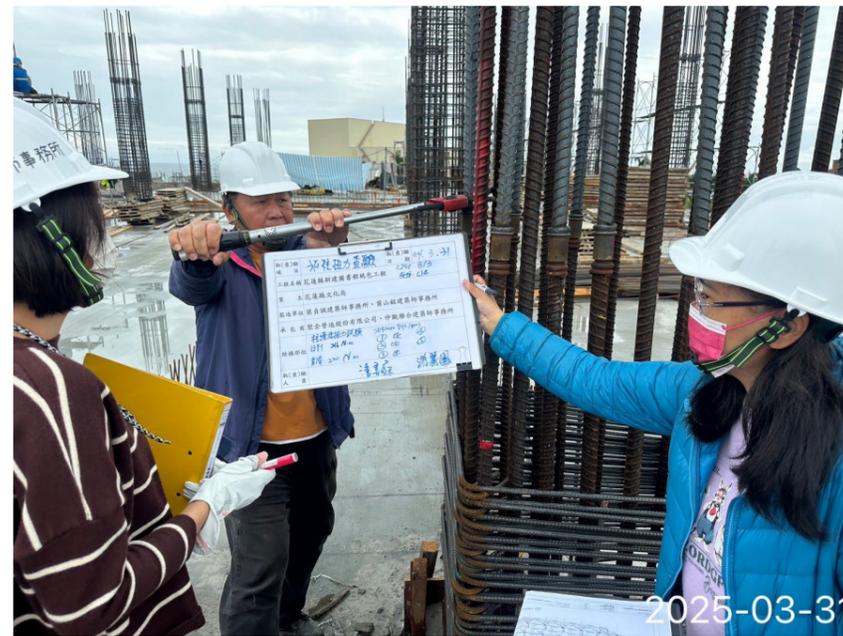

114.03.31
3F柱筋(續接器)扭力查驗




114.03.31
3F版面樑、柱位放樣查驗




114.01.10
2F柱鋼筋(續接器)材料進場查驗



114.01.10
PVC-U(E)管材料進場查驗

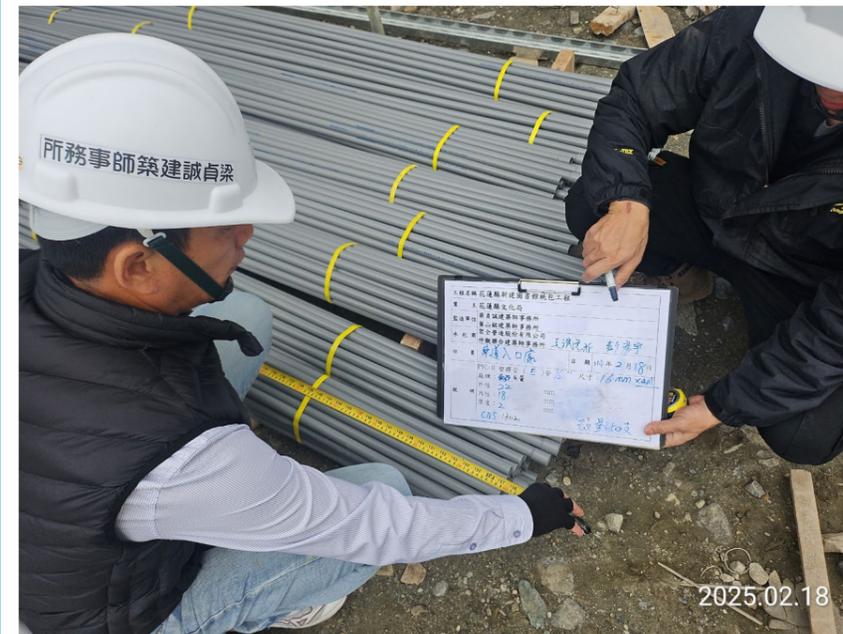


114.02.18
PVC-U(E)管材料進場查驗

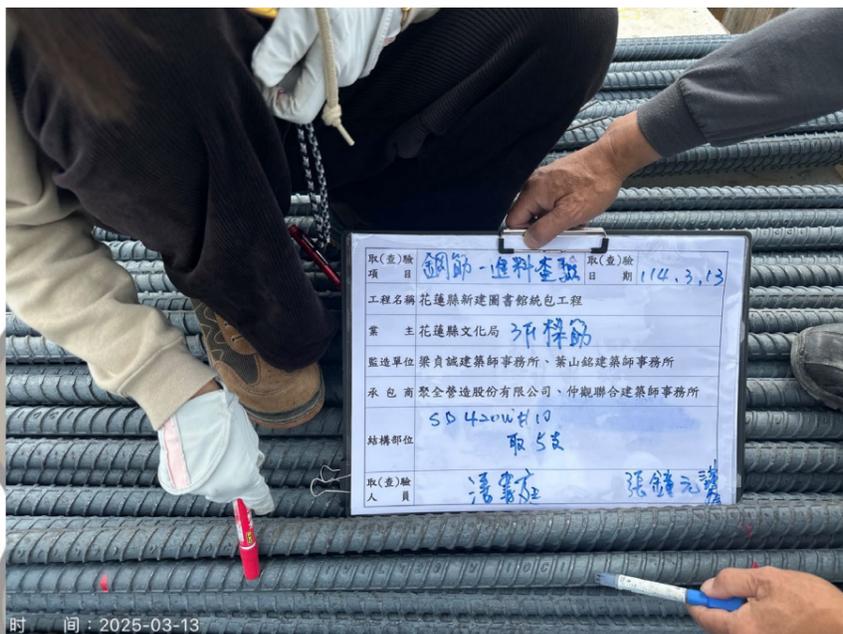

114.03.13
3F梁筋材料進場查驗




113.03.26
地上2F頂版混凝土材料進場坍度查驗

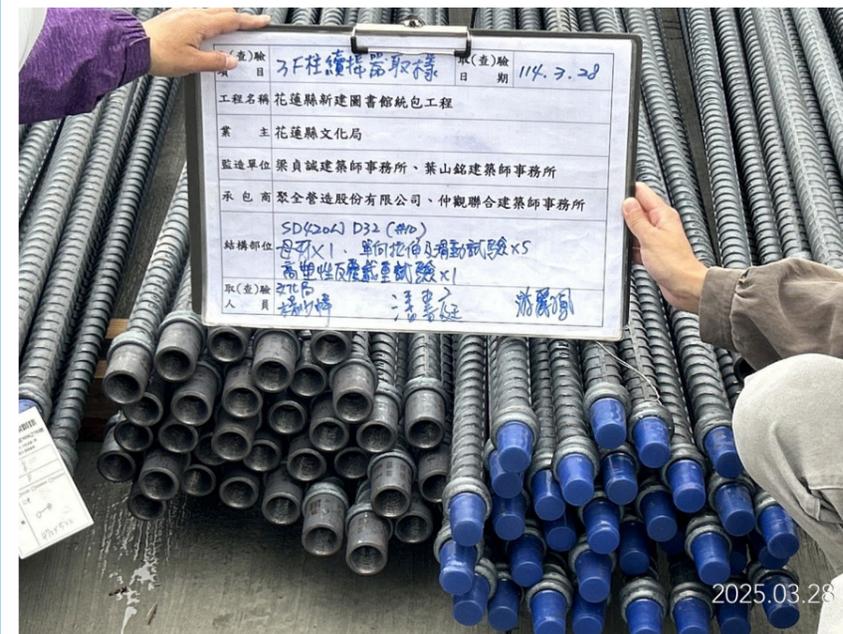


114.03.28
3F柱鋼筋(續接器)材料進場查驗

近半年民意調查問卷 統計結果 (政風室)


性別-42則回應




年齡-42則回應




職業-42則回應




是否支持本局成立機關採購廉政平臺-42則回應



是否清楚本局已於官網設置工程廉政平臺專區-42則回應




是否願意於廉政平臺專區獲取工程最新資訊-42則回應



是否同意重大公共工程成立廉政平臺能降低外力不當干涉-42則
回應


同意
11.9%



非常同意
88.1%


是否同意重大公共工程成立廉政平臺能提昇工程整體品質-42則
回應

同意
11.9%



非常同意
88.1%

如遇公務員涉犯貪瀆不法案件，是否願意向政風機構
檢舉反映-42則回應



網路問卷建議事項：無。

廉政倫理事件（請託關說、飲宴應酬、財物饋贈）：無。

民眾陳情投訴事件：無。

提案討論

提案一

案由：為確保資通訊安全，建請承攬廠商設計與採購監視系統時，禁止使用大陸製產品。

提案單位：政風室

說明：

- 一、依據本案投標須知第16點第2款已有明定不允許廠商供應大陸地區標的，先予敘明
- 二、依據行政院頒訂之「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」、行政院秘書長109年12月18日院臺護長字第1090201804A號函示及112年6月20日院授數資安字第1121000202號函，各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全產品。
- 三、三、法務部調查局日前偵辦昇銳電子股份有限公司販售貼牌中國製資通訊產品案追查發現該公司涉嫌自中國大陸進口監視器主機之零組件，在台組裝後貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤，並出具不實證明文件，得標我國多件政府採購案，而本局日前清查發現，多年前亦曾有採購該公司之陸製產品。

辦法：

- 一、建請廠商依據契約文件投標須知規定，選用採購錄影監視系統時，禁用大陸製產品。
- 二、統包商選擇錄影監視系統廠牌及型號時，請確認非屬類似昇銳公司以大陸進口監視器主機之零組件，在台組裝或其他國家組裝後貼用非大陸產地標籤之產品。
- 三、專案管理廠商與行政科審核統包商提報錄影監視系統材料時，請嚴加審核勿違反相關法令與契約規定。

臨時動議

會議結束
