

廉政平台第五次聯繫會報

主持人
代理局長曾之矧

花蓮地方檢察署
政風室主任黃雅萱

花蓮縣政府政風處
科長葉耀鴻

花蓮縣政府政風處
科員徐健淳

本局圖資科
科長簡哲士

本局圖資科
秘書黃子誠

本局政風室
主任賴英傑

專案管理廠商
監造經理 林清輝

專案管理廠商
監造主任 王泯元

統包廠商
主任 方政雄

統包廠商
品管 彭彥宇

花蓮縣審計室
課長劉銘偉

花蓮縣審計室
稽查員盧國輝

本局行政科科長
科長曾俊翔

本局行政科
約用人員郭苓珊

本局行政科
約用人員楊少樟

統包廠商
專案經理林靜雯

座次表

會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
10:00-10:05	5分鐘	主席致詞	曾之矝代理局長
10:05-10:10	5分鐘	來賓致詞	
10:10-10:20	5分鐘	上次會議決議事項執行進度	政風室
10:20-10:30	10分鐘	工程督導、材料檢驗與品質管制執行情形	行政科
10:30-10:40	10分鐘	目前工程執行進度與未來半年預計進度	統包廠商
10:40-10:50	10分鐘	各項工程文件審查情形、監造所見問題與年監造執行重點	專管廠商
10:50-10:55	5分鐘	近半年民意調查問卷統計結果	政風室
10:55-11:00	5分鐘	提案討論	與會人員

會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
11:00-11:10	5分鐘	臨時動議	與會人員
11:10-11:15	5分鐘	主席結論	主席
11:20		散會	

主席致詞



來賓致詞



上次會議決議事項執行進度


(政風室)

項次	決議事項	辦理單位	執行情形	管制建議
1	請統包廠商依據契約文件投標須知規定，選用採購錄影監視系統時，禁用大陸製產品。	統包廠商	依會議決議辦理。	解除列管
2	統包廠商選擇錄影監視系統廠牌及型號時請確認非屬類似昇銳公司以大陸進口監視器主機之零組件，在台組裝或其他國家組裝後貼用非大陸產地標籤之產品。	統包廠商	依會議決議辦理。	解除列管
3	專案管理廠商與行政科審核統包商提報錄影監視系統材料時，請嚴加審核勿違反相關法令與契約規定。	行政科 專管廠商	依會議決議辦理。	解除列管

工程督導、材料檢驗與 品質管制執行情形

(行政暨文化設施科)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約工期

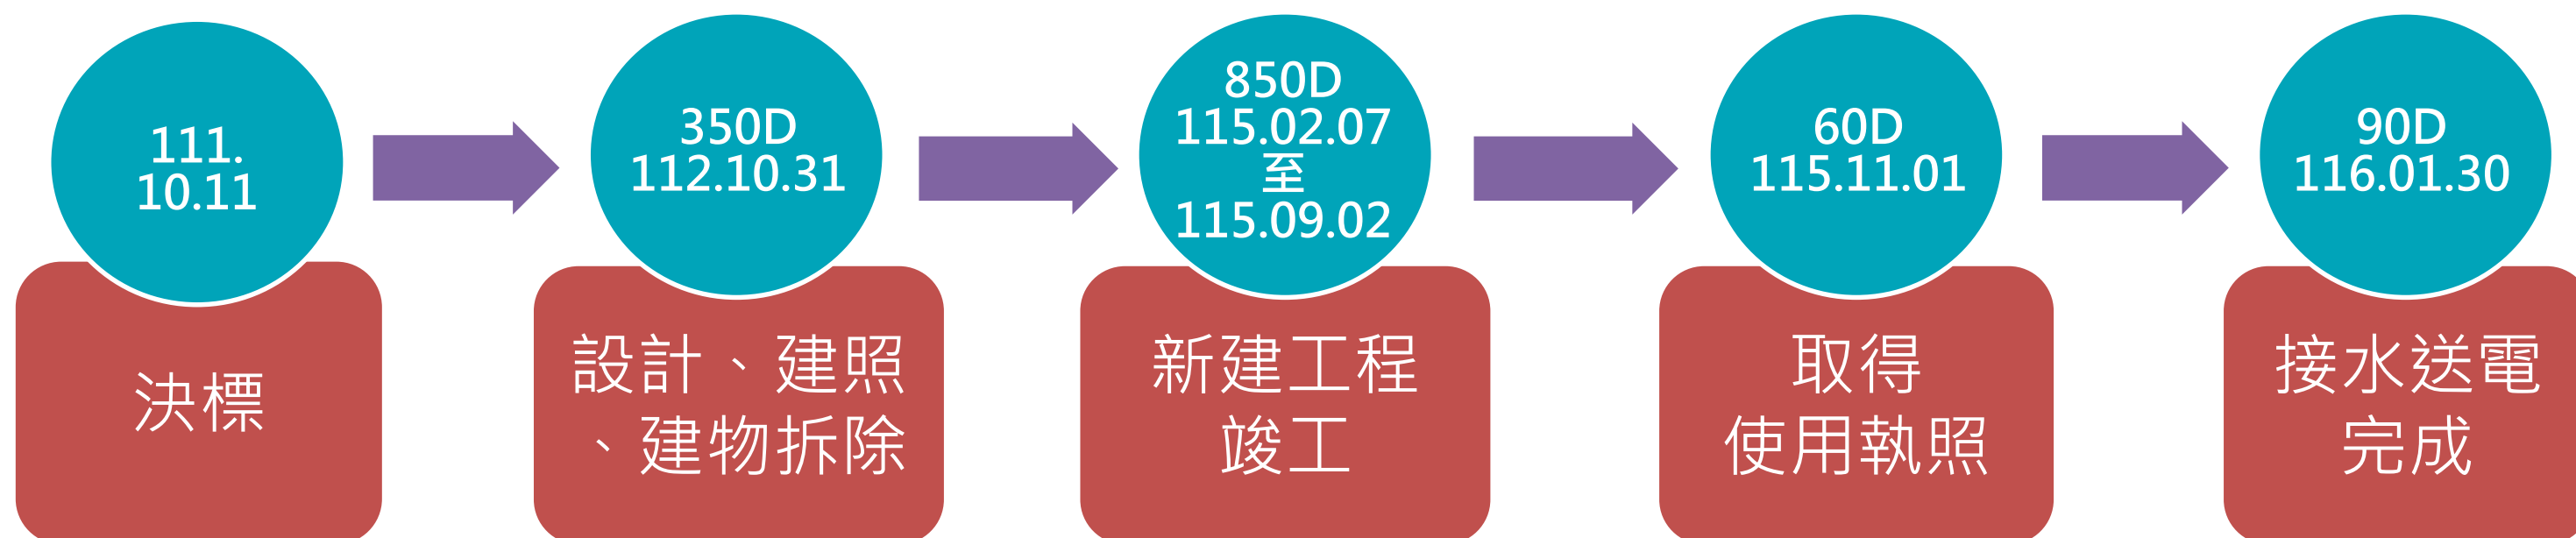

規劃設計期：決標日起350日

新建工程施工：機關通知日起7日內開工，計850日

展延及不計工期：88日(國定連假43日及自然災害45日)

取得使用執照：竣工次日起60日

完成接水送電：取得使用執照起90日

工期合計：1200日

完成建管程序合計：1350日

預計116年01月30日完成



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程規模

契約規模：8億4,942萬9,000元。

決標金額：4億2,471萬4,500元(110年10月11日)。

後續擴充金額：4億2,471萬4,500元(113年12月24日)。

設計契約價金(總包價法)：2,476萬1,200元。

工程契約價金(總包價法)：8億2,466萬7,800元。

樓地板面積：約1萬3,000坪。

樓層：地上四層，地下一層。

114年10月8日
四樓結構混凝土澆置



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約執行現況

拆除工程

拆除執照：於112年5月12日取得。

拆除開工：於112年6月26日完成建物報廢程序，112年9月20日開工。

拆除完工：於112年11月4日申報竣工，113年3月4日建管解列。

新建工程

建造執照：於112年10月11日取得。

工程開工：於113年2月7日開工。

預定完工：於116年9月2日竣工，目標115年年底開放使用。

契約累計撥款：2億1,233萬9,334 元(完成3次估驗)。

第四次估驗修正中-完成後為2億4,500萬6,146元

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程督導執行概況

工程督導執行概況(114/9/10日止)

- 工程巡查76次。
- 工程督導12次。
- 工程協調會報11次(工務會議)。
- 品質抽查驗會同16次(混凝土廠驗1次及現場澆置8次、鋼筋取樣14次、門窗取樣1次、施工檢驗停留點13次)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 材料檢驗與品質管制執行情形

項次	項目	辦理情形	備註
1	混凝土	1.113年1月取樣(廠拌)-80、140、280kgf/cm。 2.113年4月取樣(PC)-140kgf/cm。 3.113年5月取樣(筏基底版)-280IIkgf/cm。 4.113年6月取樣(BS版)-280IIkgf/cm。 5.114年1月取樣(一樓)-280IIkgf/cm。 6.114年2月取樣(二樓)-280IIkgf/cm。 7.114年5月取樣(二樓閱覽室大階梯)-280IIkgf/cm。 8.114年8月取樣(三樓)-280IIkgf/cm。	
2	鋼筋	1.113年4月取樣(基礎)-SD420W。 2.113年6月取樣(BS版)-SD420W。 3.113年7月取樣(地下室)-SD420W。 4.113年9月取樣(一樓柱牆板)-SD420W、SD280。 5.113年12月取樣(二樓板)-SD420W。 6.114年1月取樣(二樓牆)-SD420W。 7.114年3月取樣(三樓柱)-SD420W。 8.114年4月取樣(三樓牆)SD420W。 9.114年6月取樣(四樓樑版)SD420W、SD280。 10.114年7月取樣(四樓柱)-SD420W。 11.114年8月取樣(四樓牆)SD420W、SD280。	
3	鋼筋續接器	1.113年5月取樣(地下室至一樓)-續接器。 2.113年9月取樣(一樓至二樓)-續接器。 3.114年3月取樣(二樓至三樓)-續接器。 4.114年8月取樣(三樓至四樓)-續接器。	

主要結構相關試驗
剩屋突2層


花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程查核情形

項次	日期	單位	查核結果	備註
1	113/06/03	花蓮縣政府	1. 查核分數78分(乙等)。 2. 專案管理暨監造單位扣5點、統包廠商扣6點。 3. 經2次提送改善對策，於113年8月30日經縣府備查。	
2	113/10/09	教育部	1. 查核分數75分(乙等)。 2. 專案管理暨監造單位扣7點、統包廠商扣7點。 3. 訂於113年12月2日前完成改善提報教育部。	
3	預計114年12月查核	工程會	尚未 預定114/12/12查核	


目前工程執行進度與 未來半年預計進度

(聚全營造股份有限公司-統包廠商)

執行進度概述

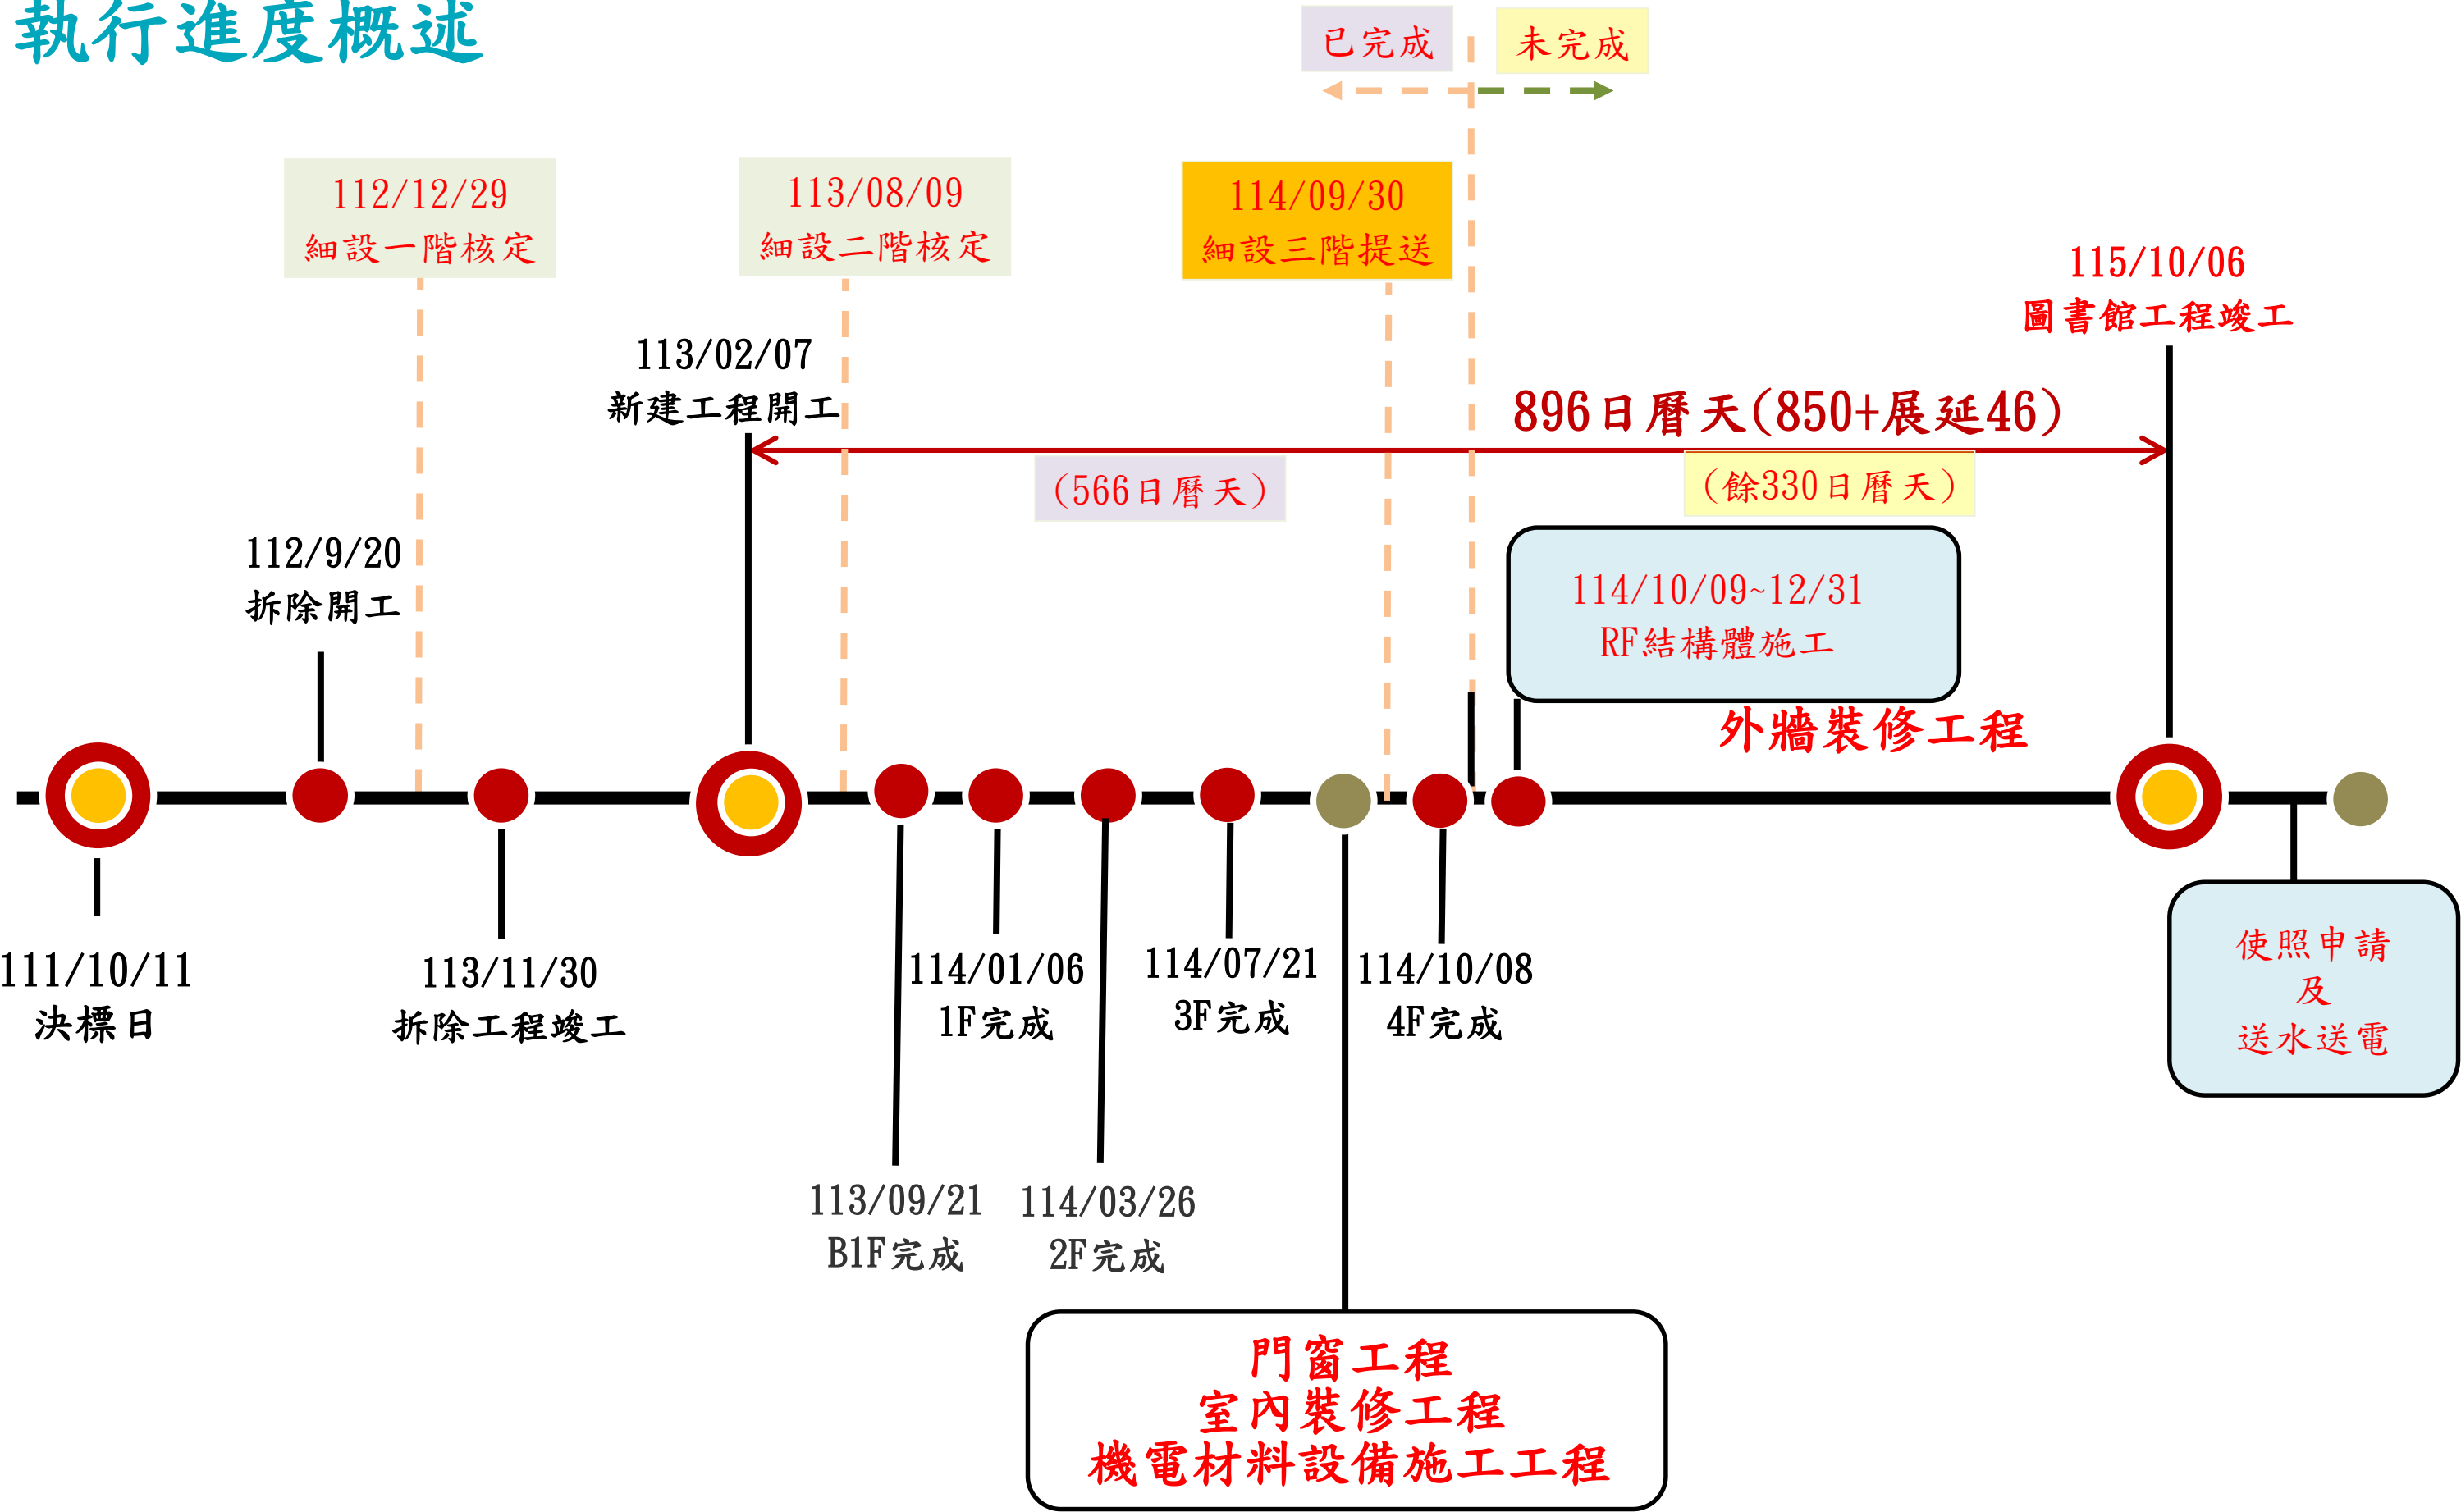

整體工程預定進度表(細設二階)進版-核定版

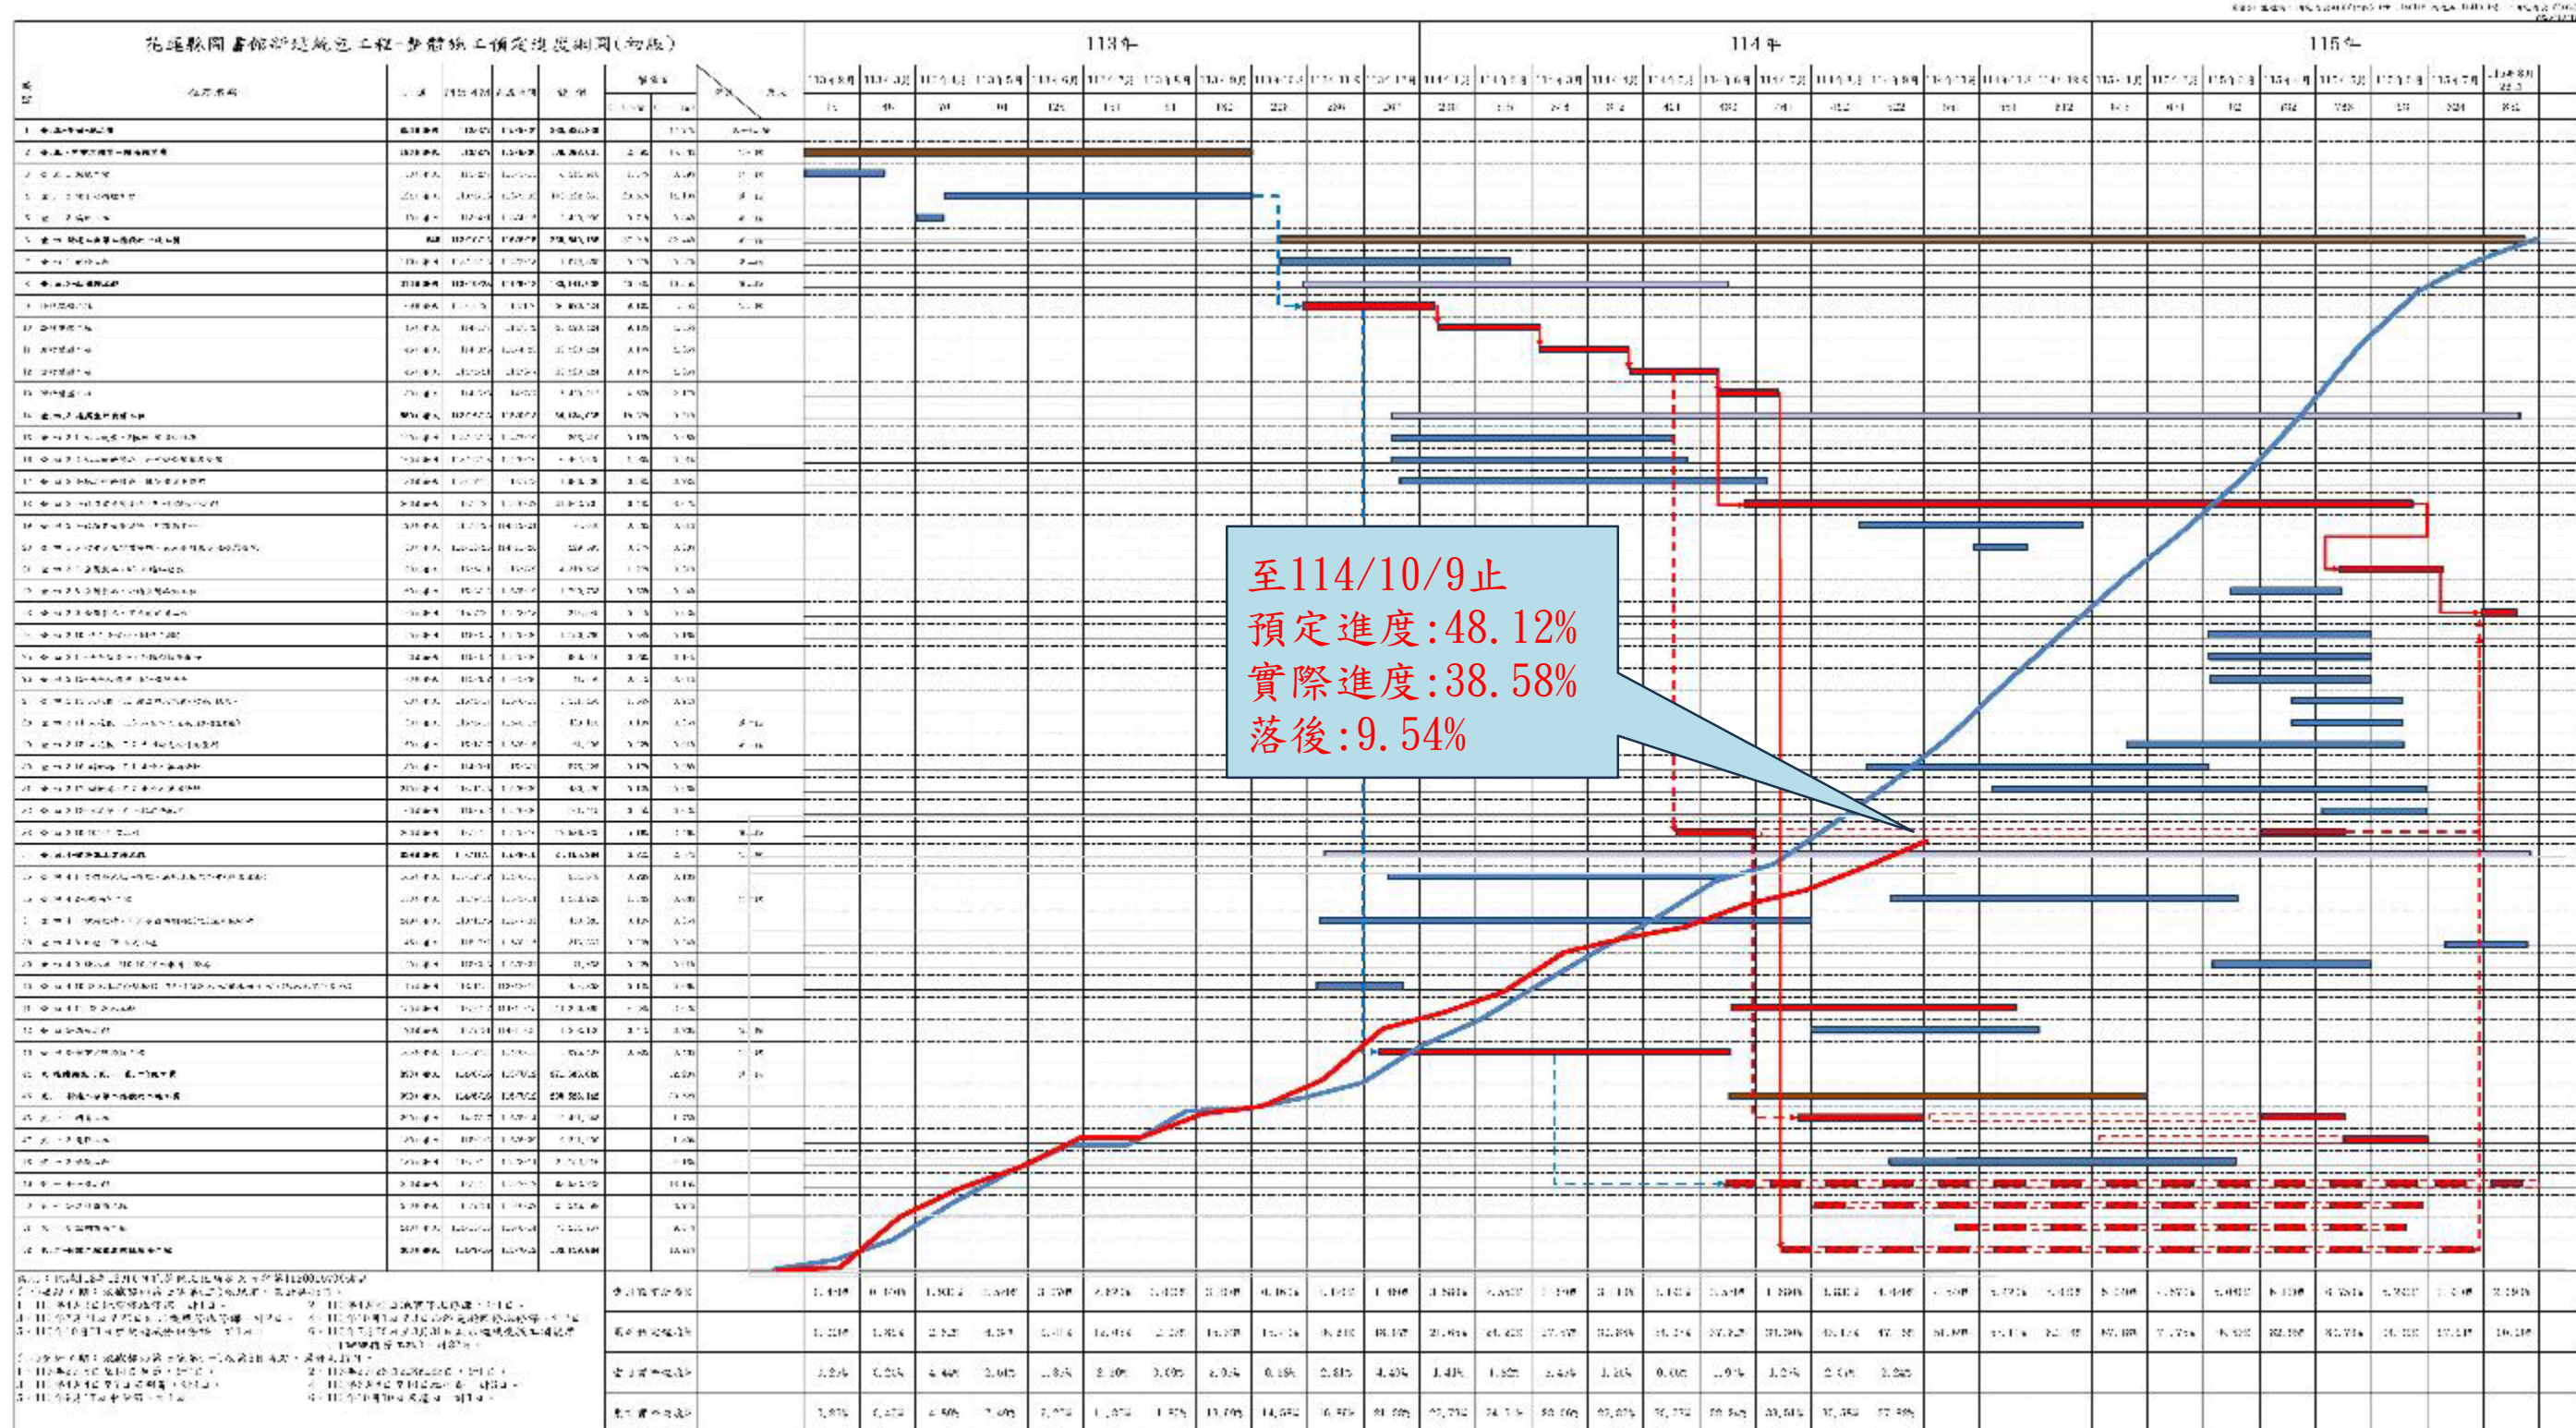

※整體工程預定進度表待細設三階核定後，再另行修正進版

工期統計表

花蓮縣圖書館新建統包工程

花圖-工期統計表_1141011/工期表 (1011條) (2)

工期檢討表

年 份	日 期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	累計	應計	
113年	1																															0			
	2							1	(農曆春節)							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	228紀念日				8	14	
	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	0	31	
	4	46	47	48	清明節				49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71		4	25	
	5	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	0	31	
	6	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	端午節		123	124	125	126	127	128	129			3	27	
	7	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	0	31	
	8	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	0	21	
	9	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	中秋節		208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		1	29
	10	221	222	223	224	225	226	227	228	229	國慶日		230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	1	30
	11	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280			30	
	12	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311		31	
114年	1	元旦		312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	除夕			(農曆春節)			8	23	
	2		初五		335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	228紀念日			3	25	
	3	228紀念日連假			360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	2	29
	4	389	390	兒童節、民族掃墓節				391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414		3	27	
	5	勞動節		415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	端午節		4	27
	6		443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471		1	29	
	7	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	0	31	
	8	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	0	21	
	9	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	教師節			560			3	27	
	10	561	562	563	中秋節				564	565	566	國慶日		567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	光復節			578	579	580	581	582	0	22	
	11	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612		0	30	
	12	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	行政紀念日		637	638	639	640	641	642	1	30
115年	1	元旦		643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	除夕		(農曆春節)				初五		655	656	657	658	659	660	661	662	663	19	23	
	2	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	和平紀念日					2	25	
	3		690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	1	30	
	4	720	721	兒童節、清明節				722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745		4	25	
	5	勞動節			746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	3	23	
	6	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	端午節		792	793	794	795	796	797	798	799	800			3	27	
	7	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	0	31	
	8	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	0	31	
	9	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	中秋節、教師節			887	888			4	25	
	10	889	890	891	892	893	894	895	896	國慶日				897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	光復節			909	910	911	912	913	0	8
	11	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943		0	0	
	12	944	945	946	947	948	竣工期限-115/10/6										959	960	961	962	963	964	965	966	967	行政紀念日		968	969	970	971	972	973	0	0
合計																																78	853		

說明：依據113年12月6日花蓮縣文化局發文行字第1130015709號函

(一)基礎工期：依據契約第七條第(三)款規定，共計145日。

1、113年4月3日地基開挖工程，計1日。

2、113年4月20日地基開挖工程，計1日。

3、113年7月24日至25日配合颱風停班停課，計2日。

4、113年10月1日至2日，配合颱風停班停課，計2日。

5、113年10月31日配合颱風停班停課，計1日。

6、113年7月26日至8月31日配合颱風受損工程復原(可辦理復原工程)，計37日。

(二)基礎工期：依據契約第七條第(三)款規定，至114年10月9日止，共計1日。

1、114年9月23日增加砂礫填補工程，計1日。

原契約工期850+基礎工期45=895日。

(三)免計工期：依據契約第七條第(一)款第3項規定，共計17日。

1、113年2月8日至14日春節，計7日。

2、113年2月28日228紀念日，計1日。

3、113年4月4日至7日清明節，計4日。

4、113年6月8日至10日端午節，計3日。

5、113年9月17日中秋節，計1日。

6、113年10月10日國慶日，計1日。

(四)免計工期：依據契約第七條第(一)款第3項規定，人事行政處已於114年6月13日公布114年(即元2025年)政府行政機關辦公日曆表(修正版)，共計34日。

1、114年1月1日元旦，計1日。

2、114年1月28日至2月2日春節，計5日。

3、114年2月28日至3月2日228紀念日，計3日。

4、114年4月3日至6日兒童節、民族掃墓節，計4日。

5、114年5月1日勞動節，計1日。

6、114年5月30日至6月1日端午節，計3日。

7、114年8月27日至29日教師節，計3日。

8、114年10月4日至6日中秋節，計3日。

9、114年10月13日至12日國慶日，計3日。

10、114年10月24日至26日光復節，計3日。

11、114年12月25日行政紀念日，計1日。

(五)免計工期：依據契約第七條第(一)款第3項規定，人事行政處已於114年6月13日公布114年(即元2026年)政府行政機關辦公日

工期統計表

說明：（一）展延工期：依據契約第七條第(三)款規定，累計共45日。

- 1、113年4月3日地震停班停課，計1日。
- 2、113年4月23日地震停班停課，計1日。
- 3、113年7月24日至25日凱米颱風停班停課，計2日。
- 4、113年10月1日至3日山陀兒颱風停班停課，計3日。
- 5、113年10月31日康納颱風停班停課，計1日。
- 6、113年7月26日至8月31日凱米颱風受損工項復原（可辦理復原工項），計37日。

（二）展延工期：依據契約第七條第(三)款規定，至114年10月9日止，暫計1日。

- 1、114年9月23日樺加沙颱風停班停課，計1日。

原契約工期850+展延工期46=896日曆天

（三）免計工期：依據契約第七條第(一)款第3目規定，計共17日。

- 1、113年2月8日至14日春節，計7日。
- 2、113年2月28日228紀念日，計1日。
- 3、113年4月4日至7日清明節，計4日。
- 4、113年6月8日至10日端午節，計3日。
- 5、113年9月17日中秋節，計1日。
- 6、113年10月10日國慶日，計1日。

中秋節	10/4(六)~10/6(一)	連假：例假日(10/4~10/5)→中秋節(10/6)	3天
光復節	10/24(五)~10/26(日)	連假：光復節例假日補放假(10/24)→光復節(10/25)→例假日(10/26)	3天
行憲紀念日	12/25(四)	沒有連假	1天

人事行政總處已於114年6月13日公布中華民國115年(西元2026年)政府行政機關辦公日曆表

（四）免計工期：依據契約第七條第(一)款第3目規定，人事行政總處已於114年6月13日公布114年(西元2025年)政府行政機關辦公日曆表(修正版)，計共33日。


- 1、114年1月1日元旦，計1日。
- 2、114年1月28日至2月2日春節，計9日。
- 3、114年2月28日至3月2日228紀念日，計3日。
- 4、114年4月3日至6日兒童節、民族掃墓節，計4日。
- 5、114年5月30日至6月1日端午節，計3日。
- 6、114年9月27日至29日教師節，計3日。
- 7、114年10月4日至6日中秋節，計3日。
- 8、114年10月10日至12日國慶日，計3日。
- 9、114年10月24日至26日光復節，計3日。
- 10、114年12月25日行憲紀念日，計1日。

（五）免計工期：依據契約第七條第(一)款第3目規定，人事行政總處已於114年6月13日公布114年(西元2026年)政府行政機關辦公日曆表，計共27日。


- 1、115年1月1日元旦，計1日。
- 2、115年2月14日至2月22日春節，計9日。
- 3、115年2月27日至3月1日和平紀念日，計3日。
- 4、115年4月3日至6日兒童節、清明節，計4日。
- 5、115年5月1日至3日勞動節，計3日。
- 6、115年6月19日至21日端午節，計3日。
- 7、115年9月25日至28日中秋節、教師節，計4日。

光復節	10/24(六)~10/26(一)	連假：例假日(10/24)→光復節(10/25)→光復節逢例假日補放假(10/26)	3天
行憲紀念日	12/25(五)~12/27(日)	連假：行憲紀念日(12/25)→例假日(12/26~12/27)	3天

新建工程-113年02月07日至115年10月08日

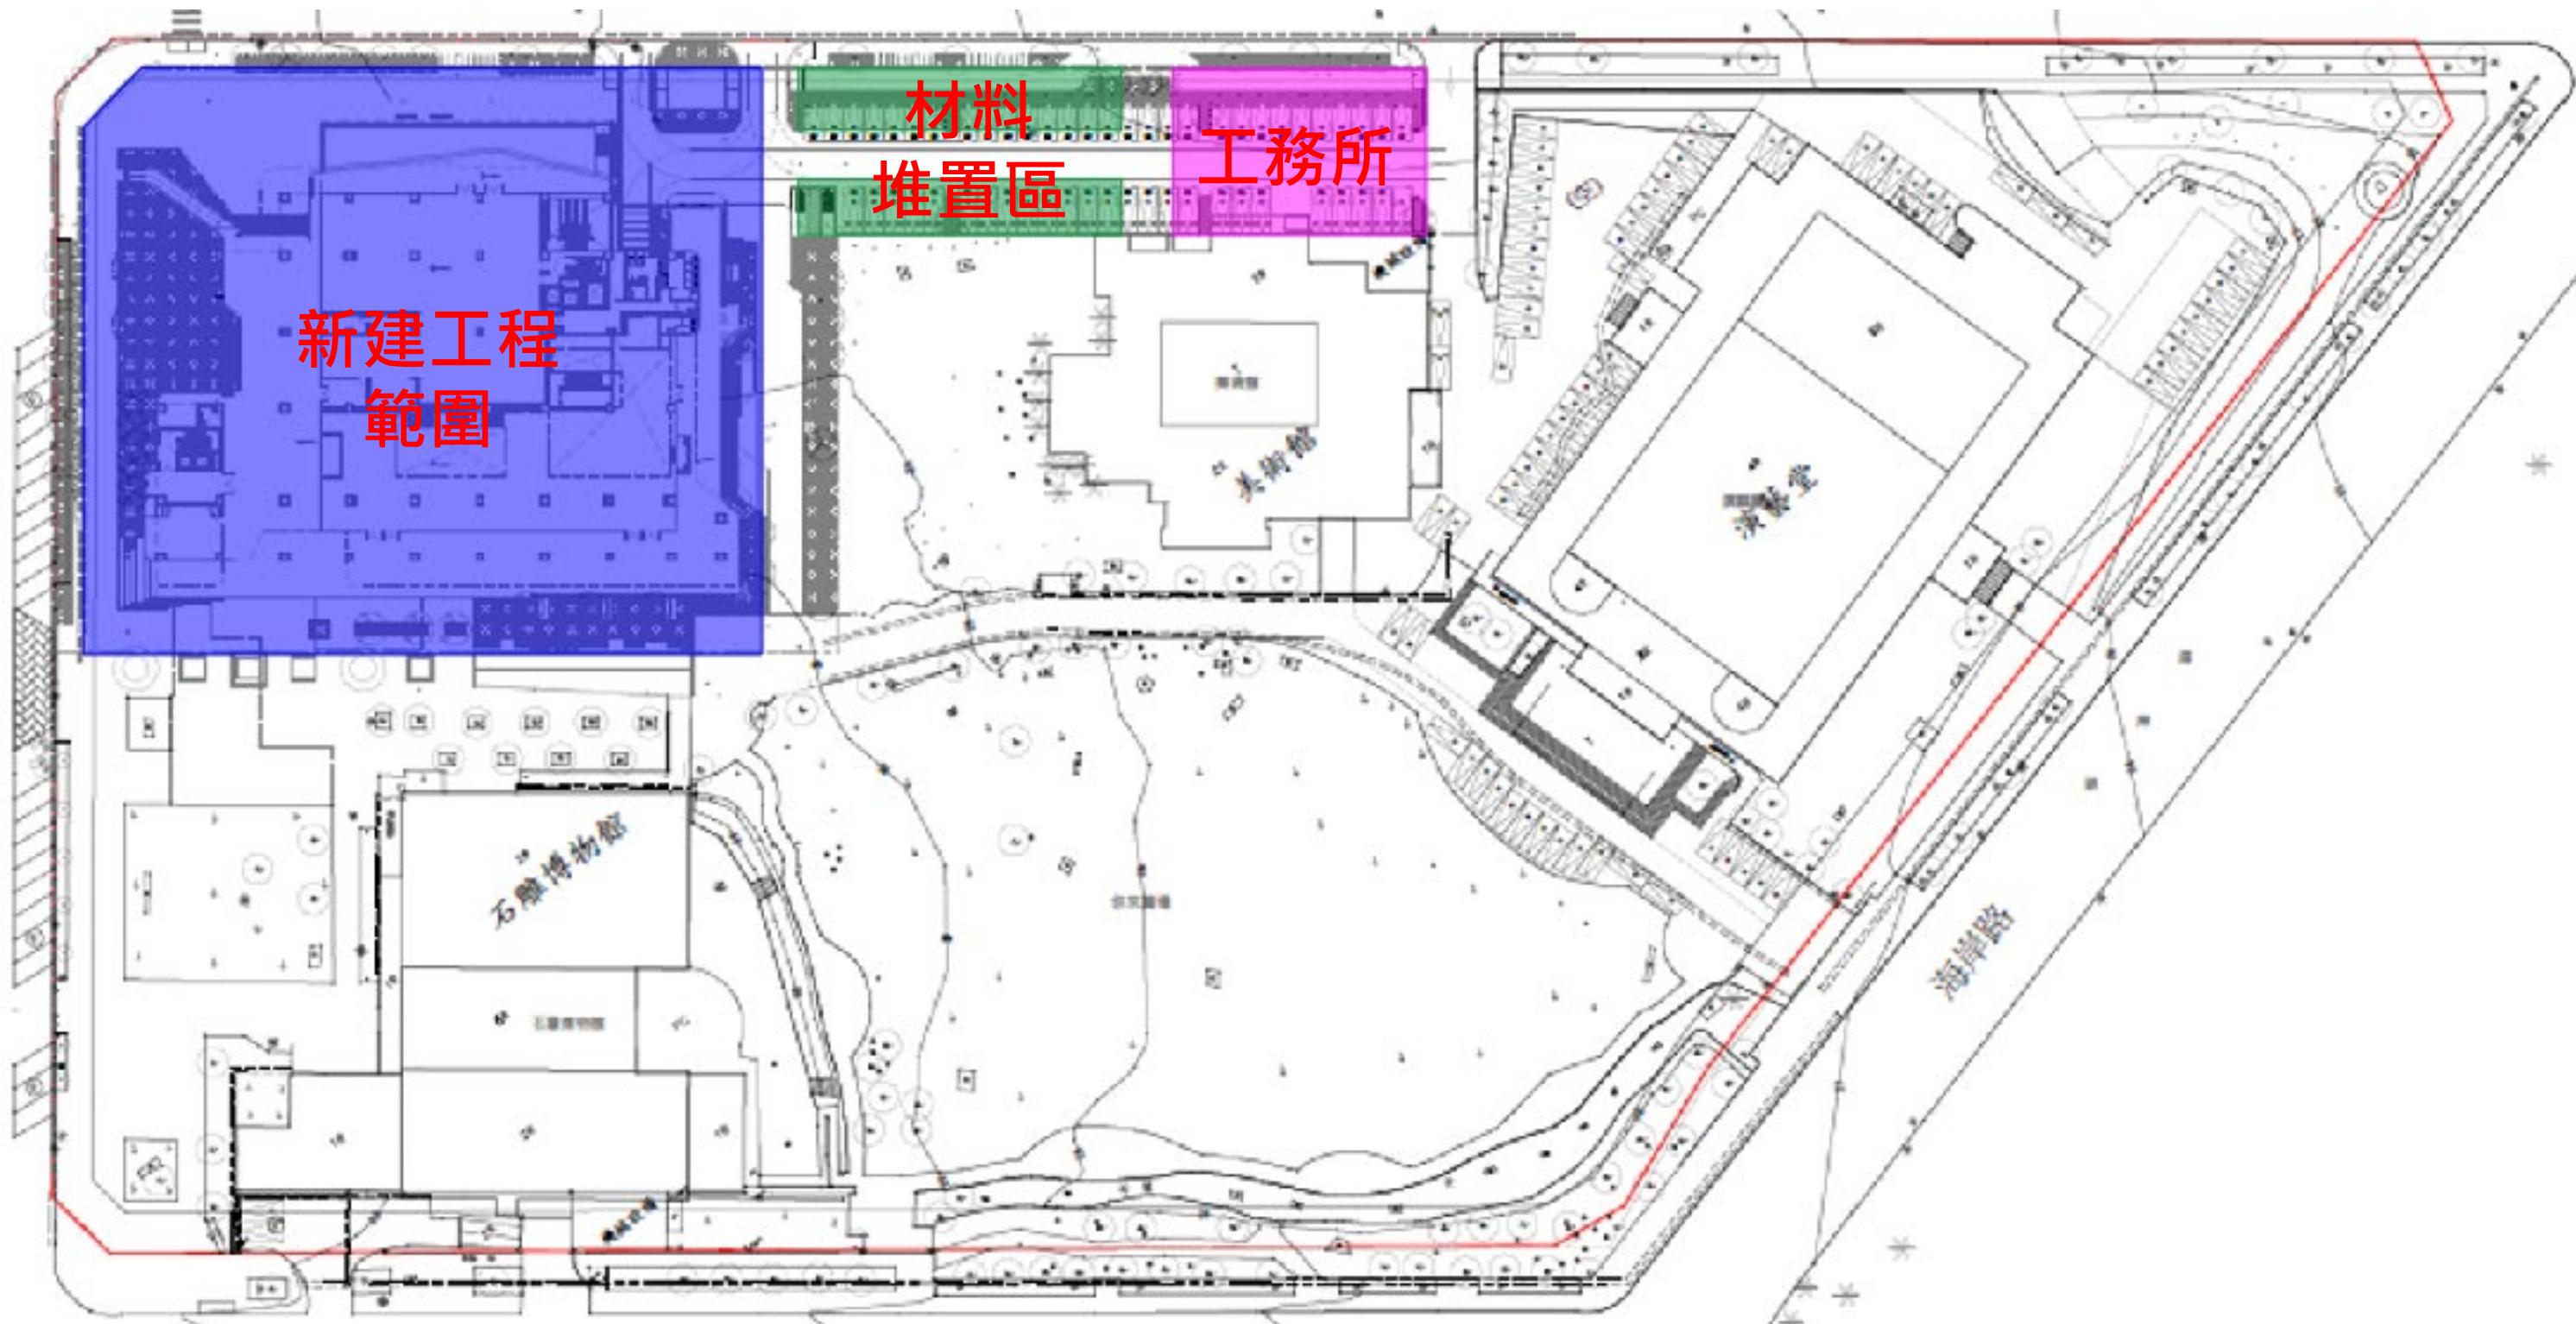


花蓮縣新建圖書館統包工程

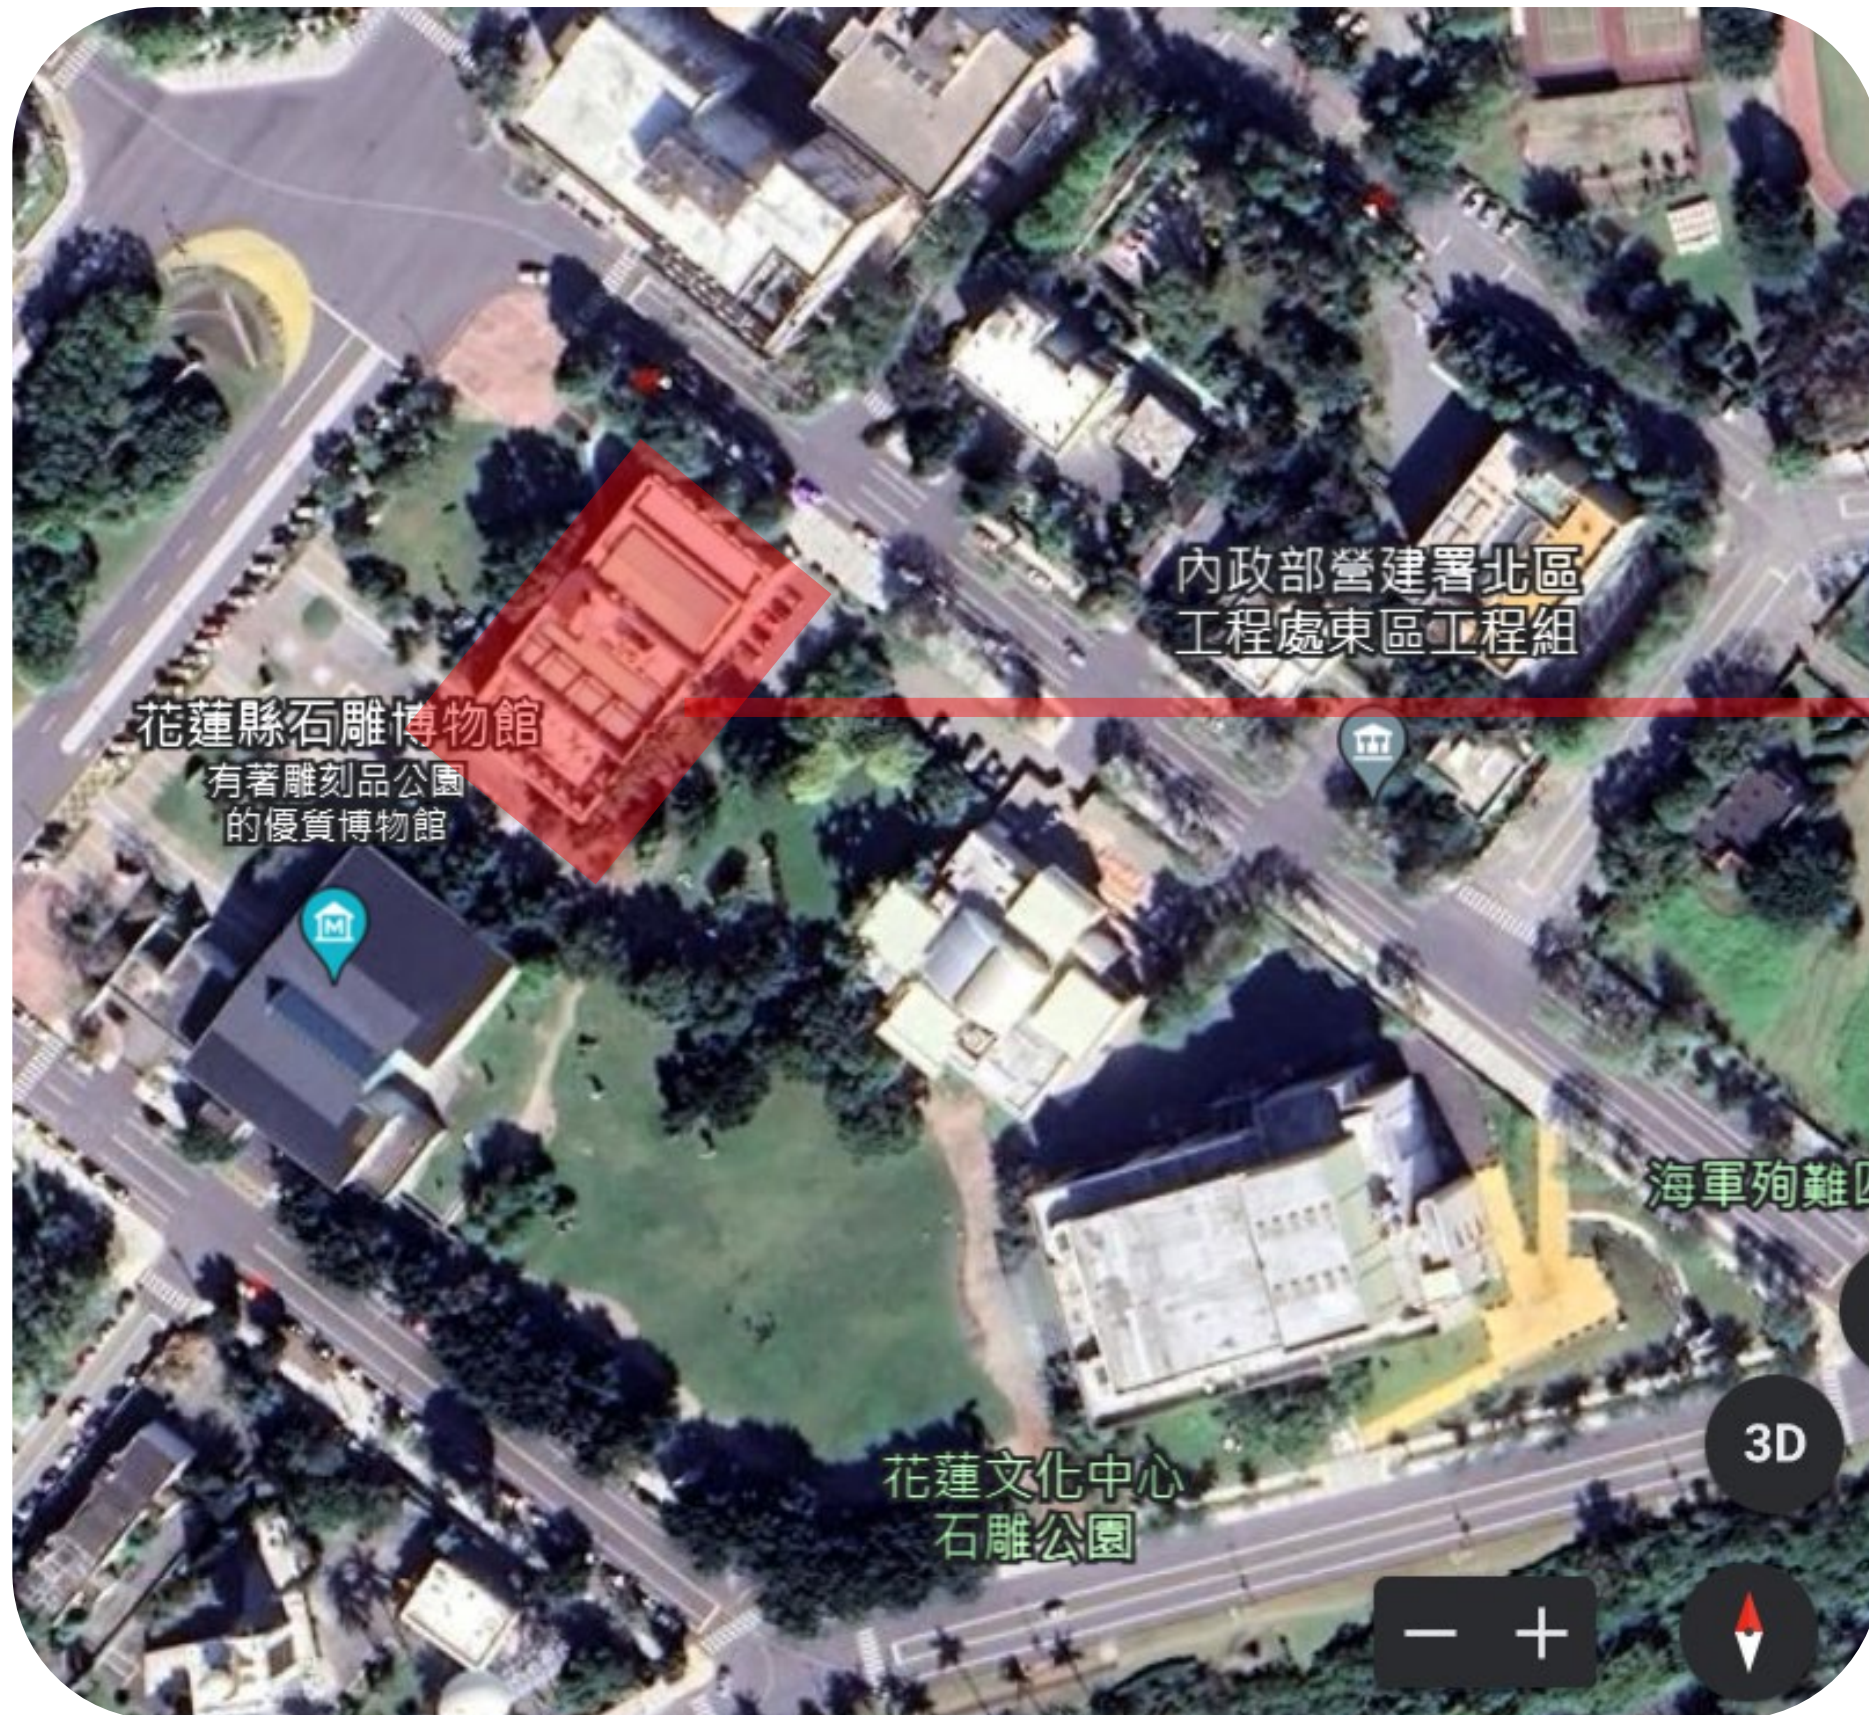

施工項目概述

1. 拆除階段(已完成)
2. 新建結構體階段
 - A. 開挖工程(已完成)
 - B. 基礎工程(已完成)
 - C. B1F結構體(已完成)
 - D. 1F結構體(已完成)
 - E. 2F結構體(已完成)
 - F. 3F結構體(已完成)
 - G. 4F結構體(已完成)
 - H. RF結構體(施工中)
3. 裝修工程(進行中)


結構體施工期程說明

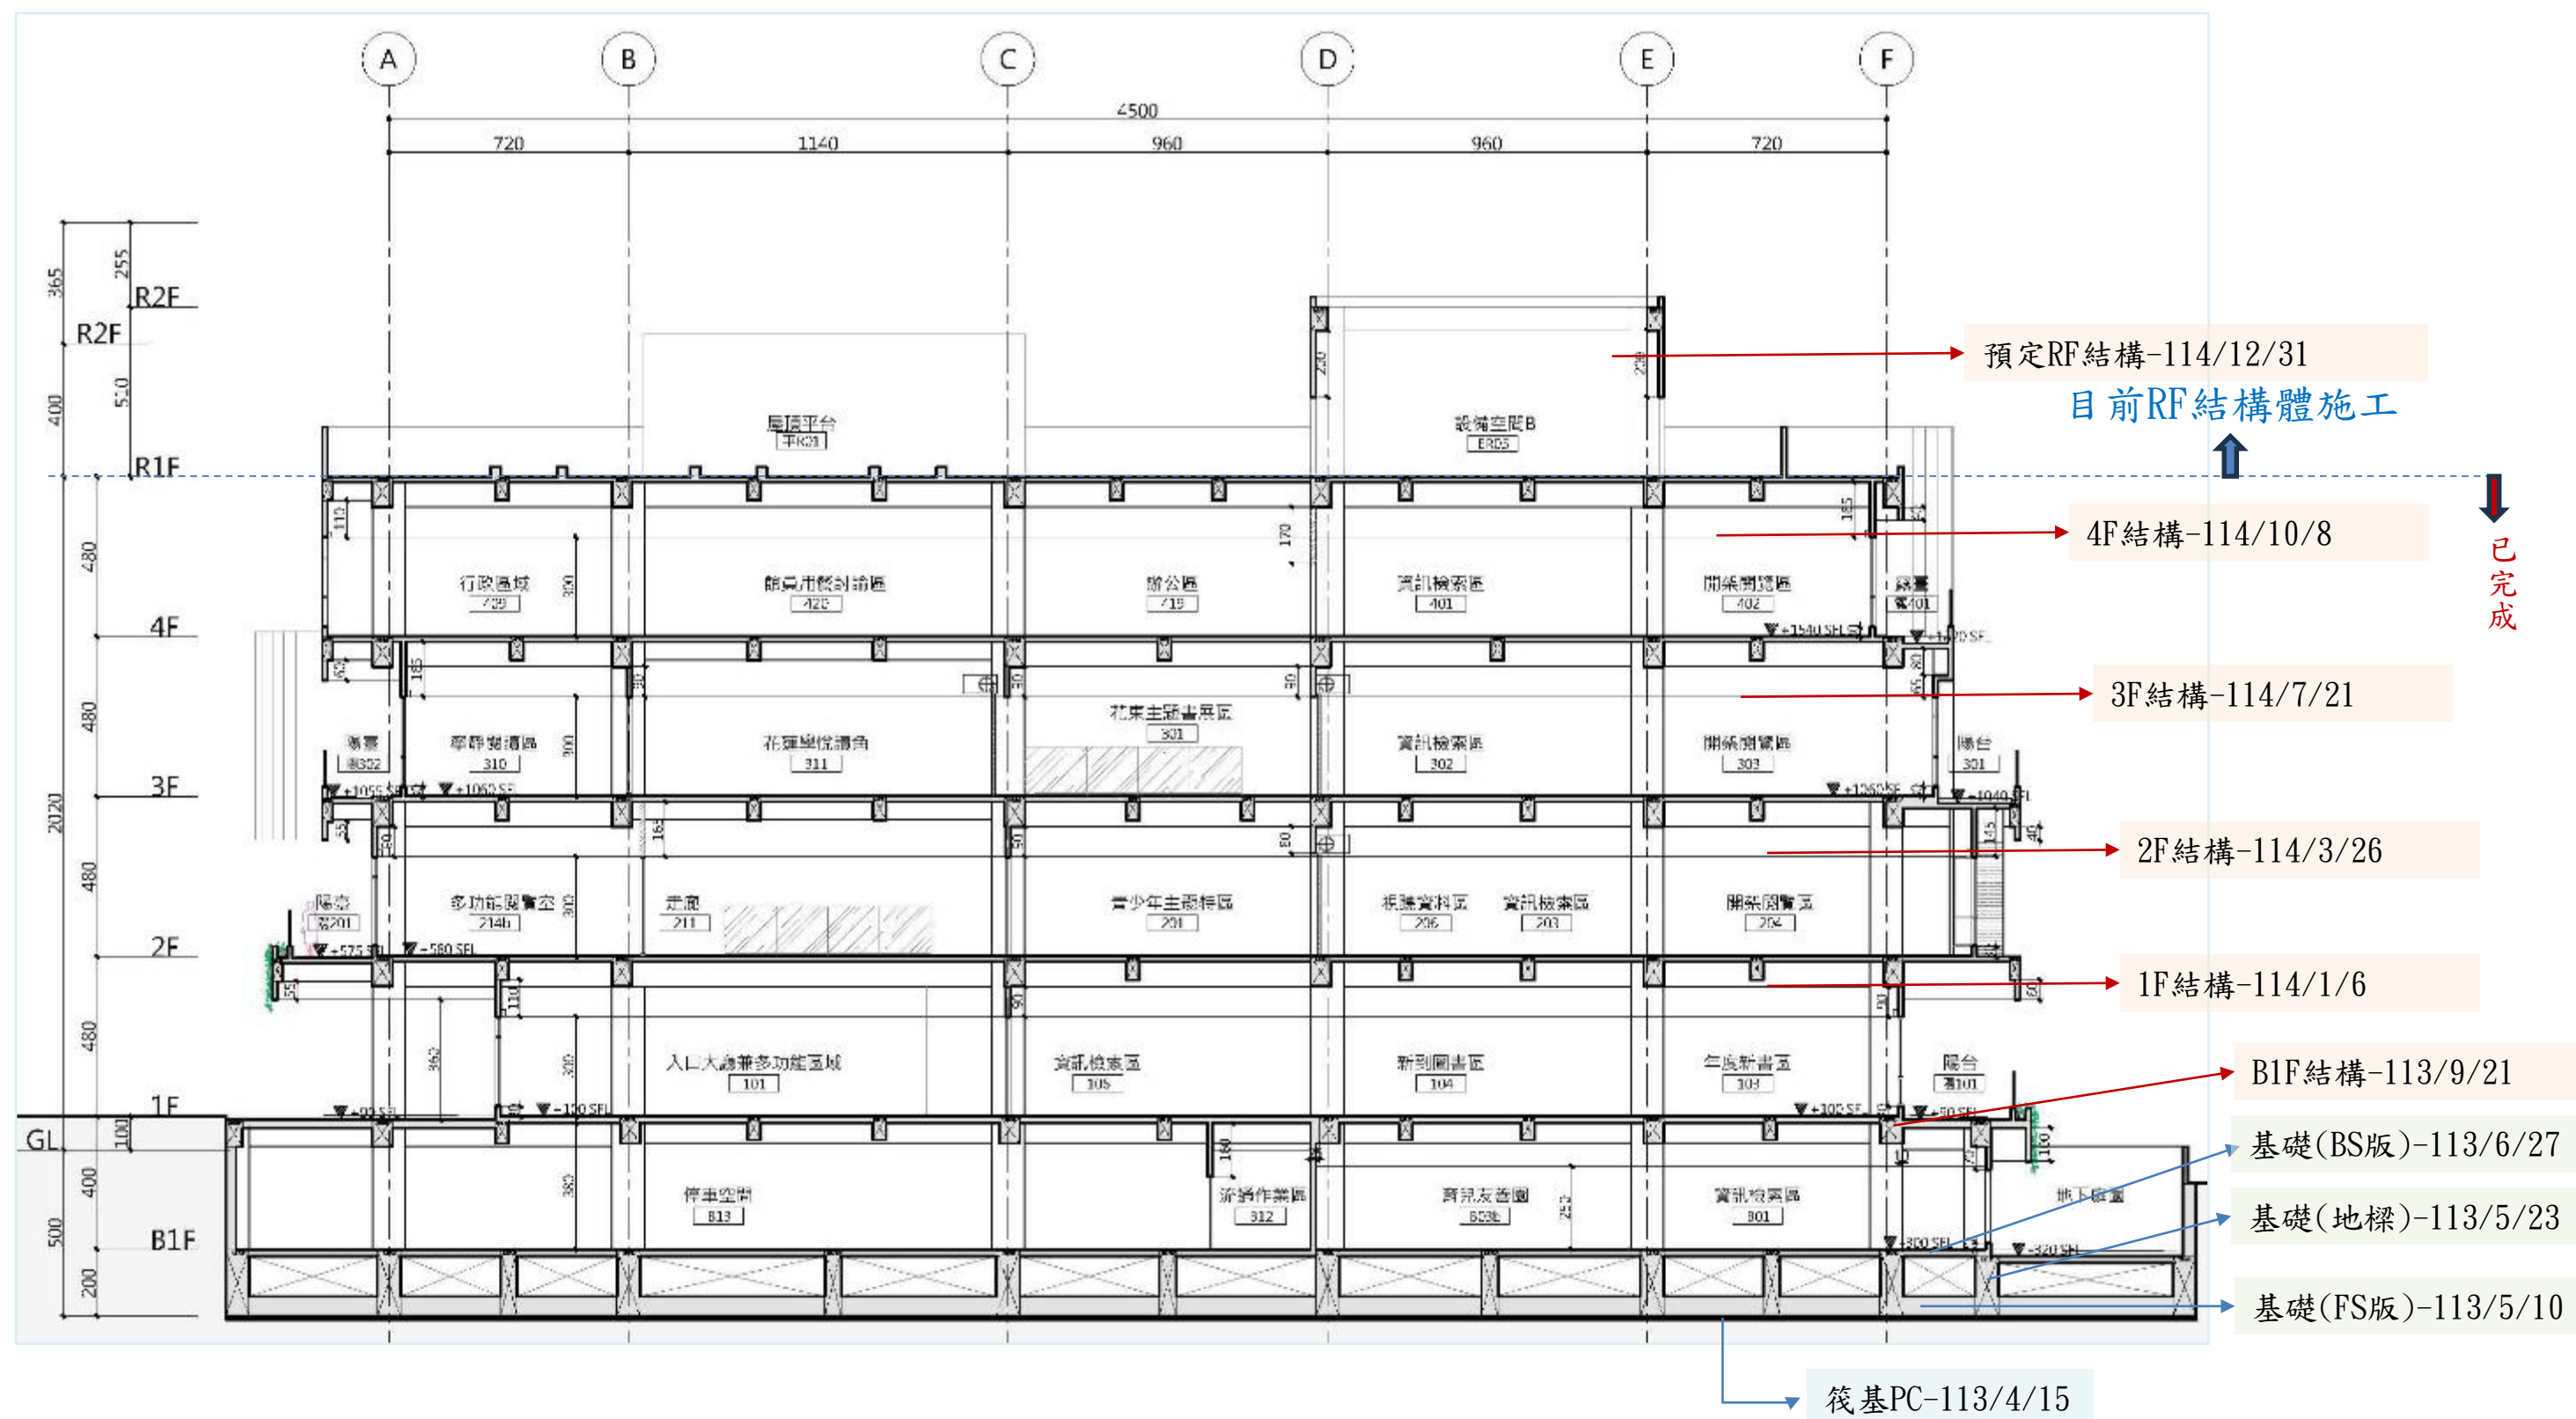

施工期程進度說明

114/10/9~115/3/8 預定施工情形概述

- 1、結構體RF層工項完成
- 2、室內外泥作工項施作
- 3、門窗框安裝施作
- 4、水電、消防、空調工程施作
- 5、材料設備送審、廠驗等作業

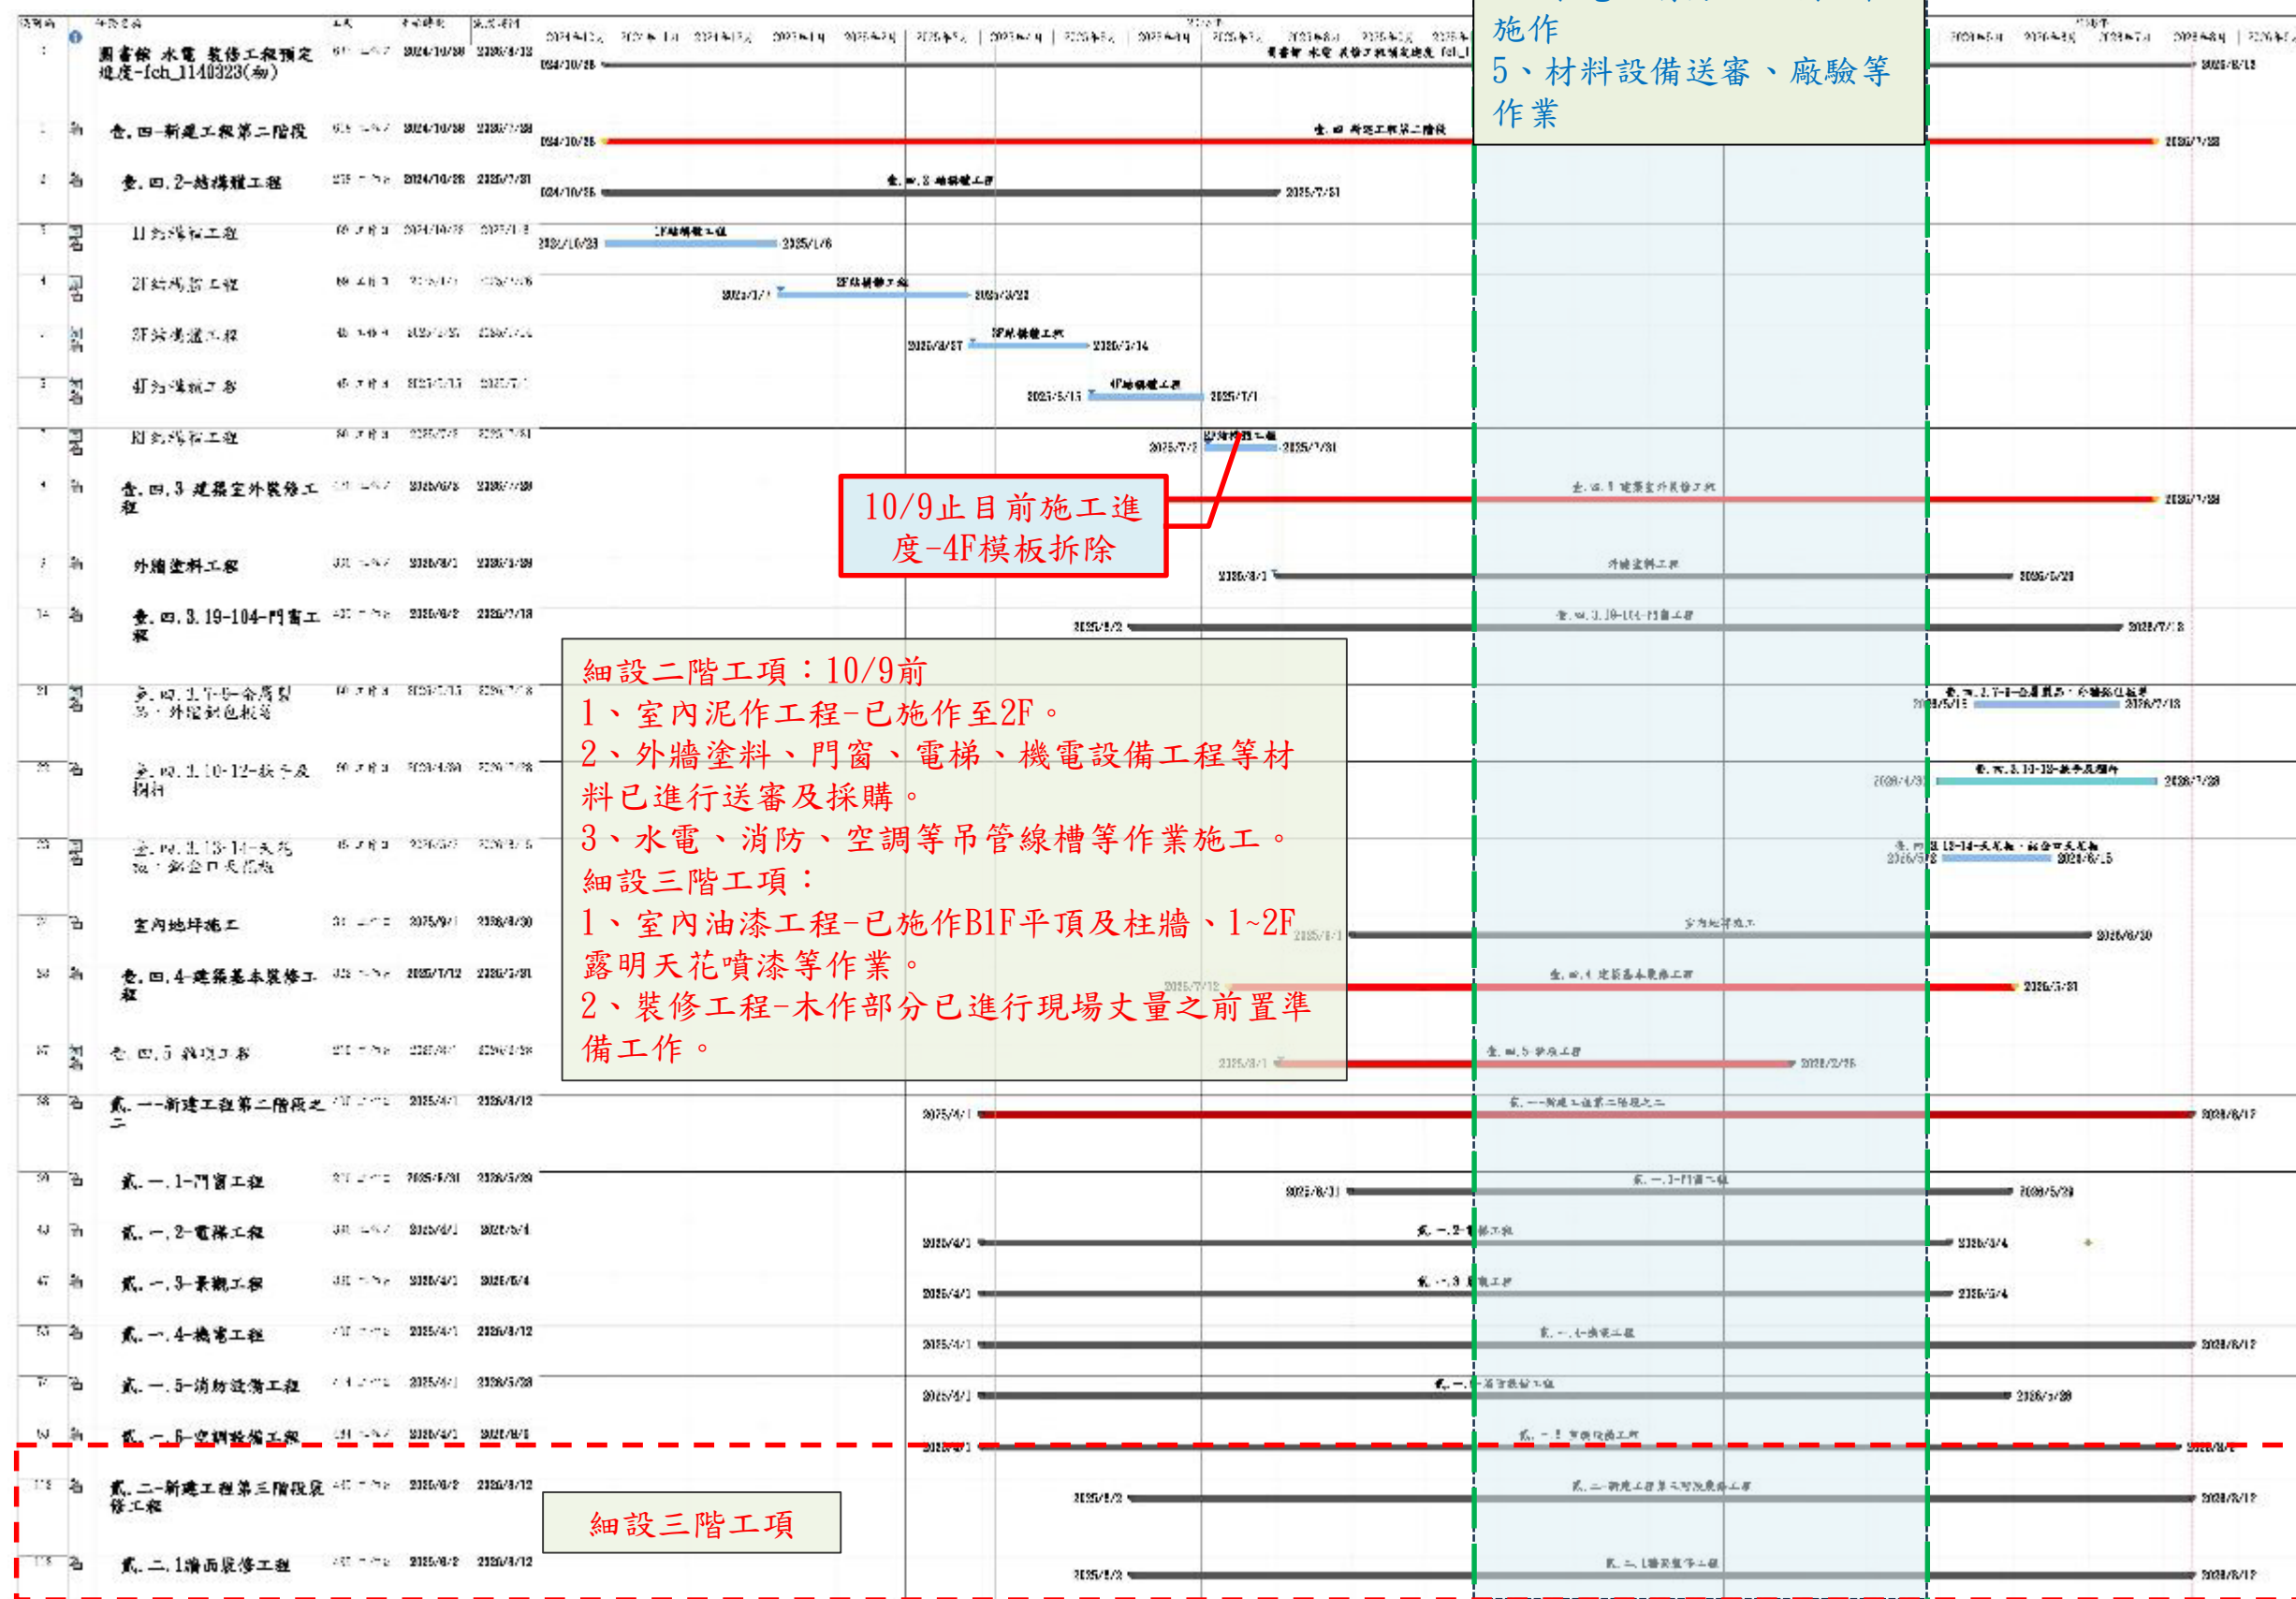

進度落後原因：

1、主體結構工程部分：

結構工程施工預定進度期程，期間因逢114/07/19-薇帕颱風、114/08/12-楊柳颱風等影響工進，又因114/09/23樺加沙颱風來襲，再於114/9/22改期至114/9/26進行4層結構體勘驗完成，預定114/9/30進行混凝土澆置；但因受樺加沙颱風造成堰塞湖溢流釀災，重創光復鄉與馬太鞍溪橋斷橋阻礙無法通行，本工程之模板、鋼筋工多人前往災區協助救災，另部分工班居住於光復、瑞穗鄉之勞工，亦無法返回工地。

協力廠商模板、鋼筋工班雖努力另行調工進行施作，仍因人力不足影響原預定114/9/30進行混凝土澆置作業，亦造成工進落後。

2、裝修、機電工程部分：

裝修一期間因配合細設三階裝修工程部分施工範圍、內容及門窗尺寸調整等因素影響施作。

機電一因主要之部分材料送審作業，雖經監造單位核定，但仍有未經業主同意備查部分材料，因工進所需故材料已先行進場，如線槽管架、消防、空調等鍍鋅鐵管等材料，未能進行查驗影響施作。

改善對策及作為：

1. 主體結構工程部分：

已於114/10/08進行4層結構混凝土澆置。屋突層結構工作因含有水箱及屋突2層等工作，將協調廠商增派人力進行趕工，期望於114/12月完成全部結構體工程。

2、裝修、機電工程部分：

裝修一泥作工作已由B1F~2F先行施作，油漆工作亦配合完成B1F平頂、牆面等可施作部分，鋁門窗亦進行現場丈量繪製製造生產尺寸圖中，鋁門窗B1F~2F框料預定114/11月底前可進場安裝。

機電一目前B1F~2F配線、廁所吊管等工作已配合陸續進行施作中，材料進場待查驗完成後，即可增派人力進行機電、消防、空調等各工項施作。

3、整體工程部分：

待細設三階核定後，配合裝修工程提送材料廠商資料、設備廠商廠驗工作、分項施工計畫等前置作業，並加速辦理合理之工期展延，經業主同意後進行整體施工預定進度網圖修正，以符實際。本公司將於後續可用工程期限內秉持如質如實的态度努力完成工作，亦請體諒因配合室裝工項，進行多次修改檢討施工圖，造成人力、工時等耗費，期望後續作業能協助排除送審作業耗時及影響施工進度之期程，圓滿完成本案。


土建工程-3F結構施工(114/03/27~114/07/21)



土建工程-3F結構施工(114/03/27~114/07/21)





土建工程-4F結構施工(114/07/22~114/10/08)

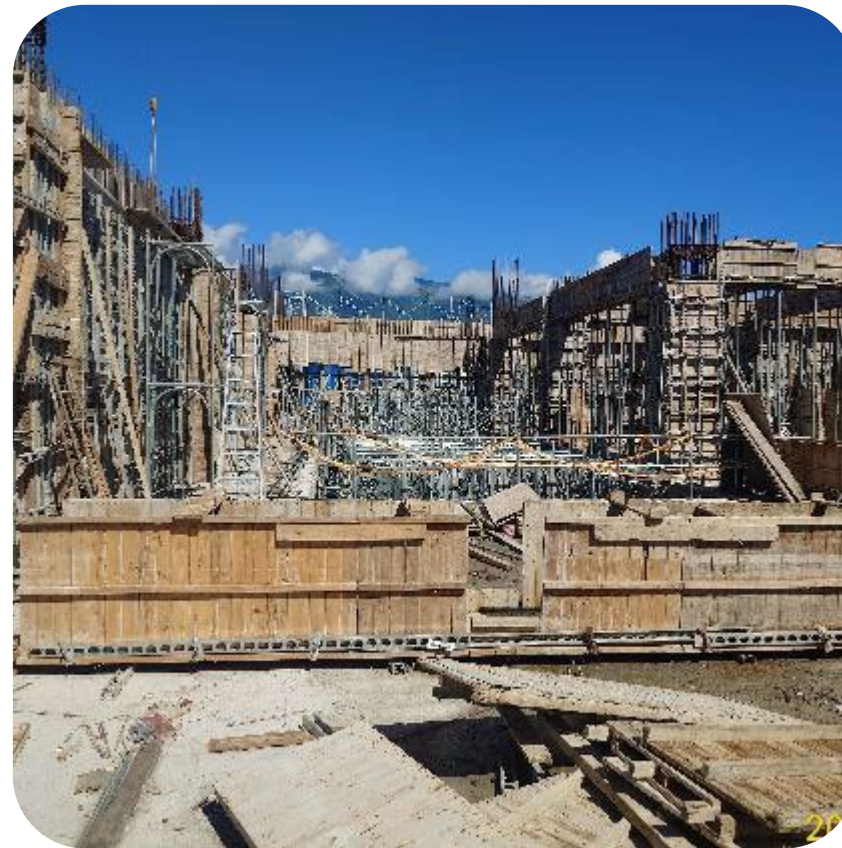


土建工程-4F結構施工(114/07/22~114/10/08)



自主檢查、查驗-3F鋼筋工項

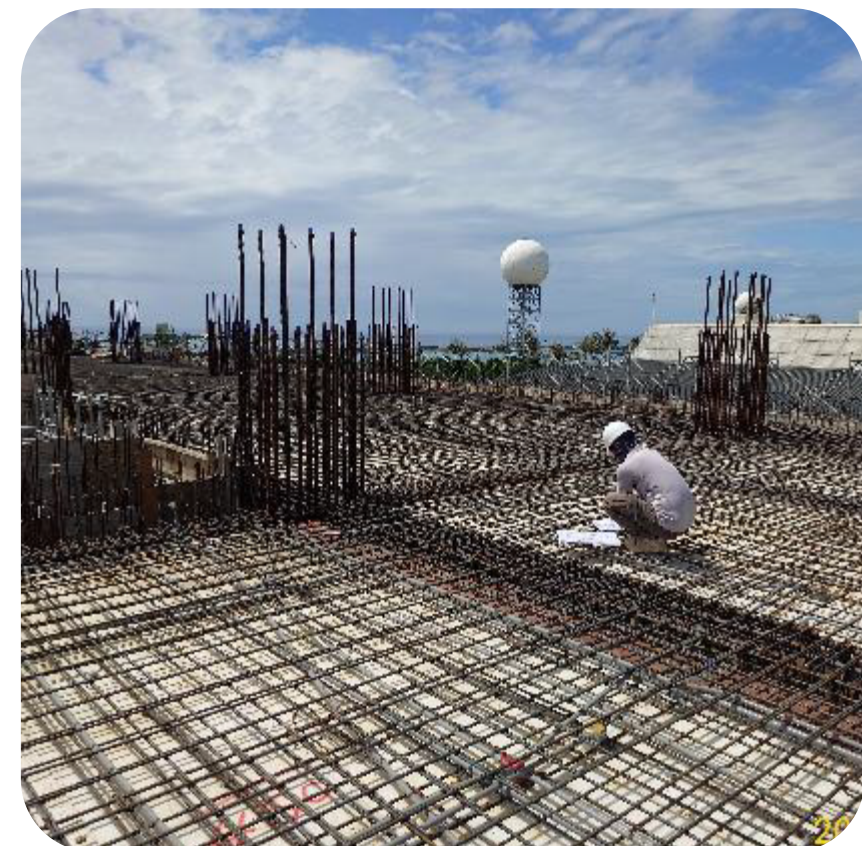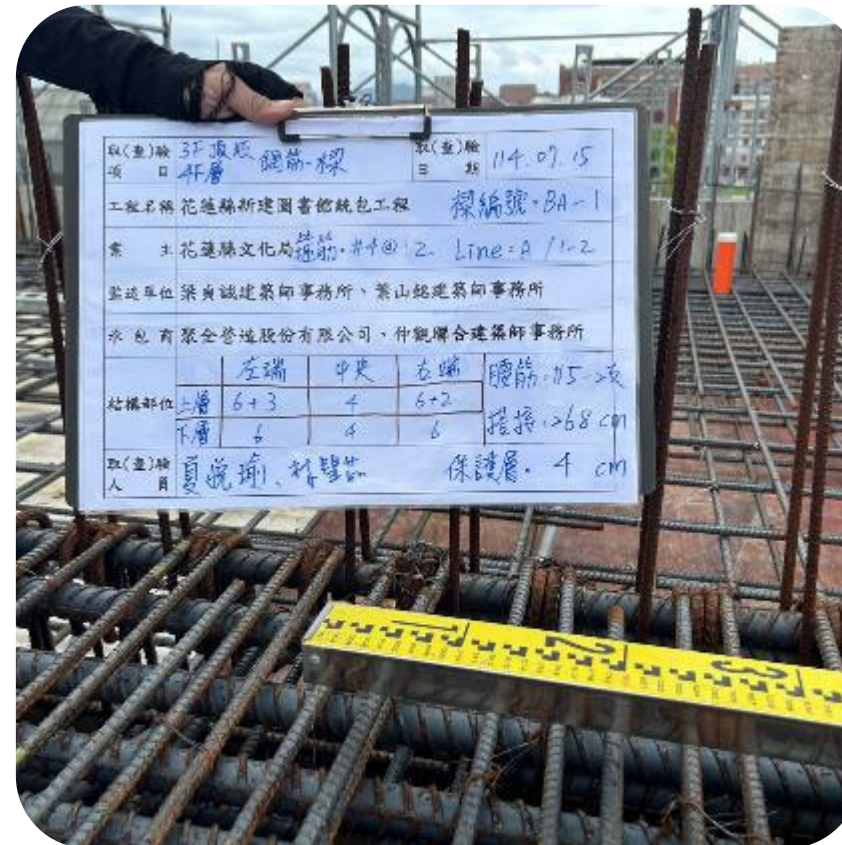


自主檢查、查驗-4F鋼筋工項

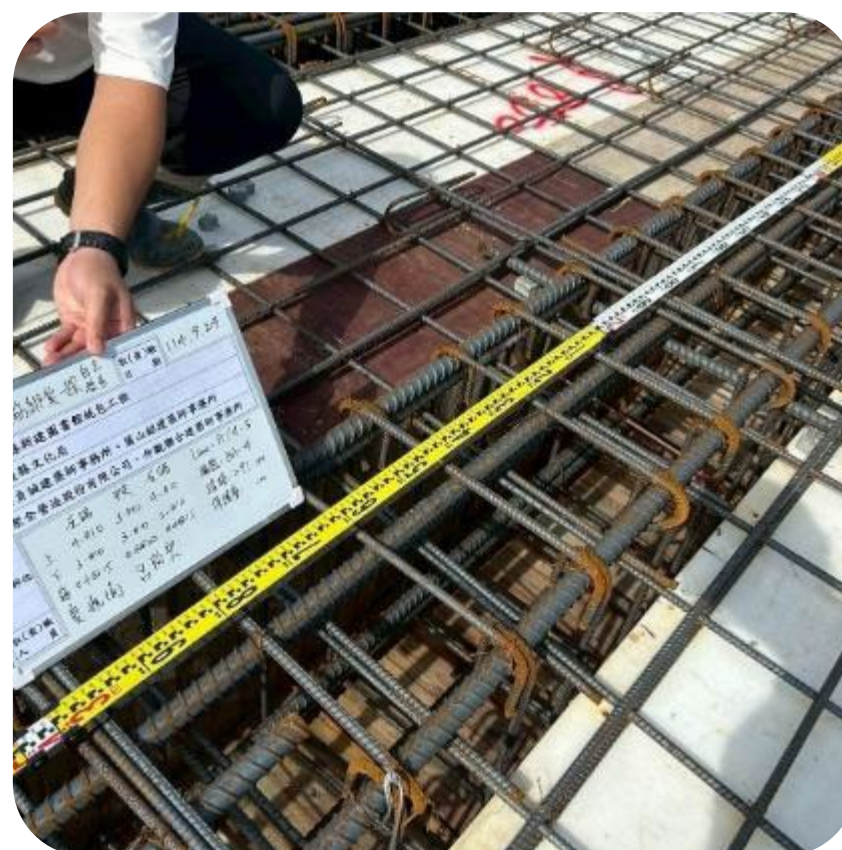

自主檢查、查驗-機電工項




檢(試)驗相關作業

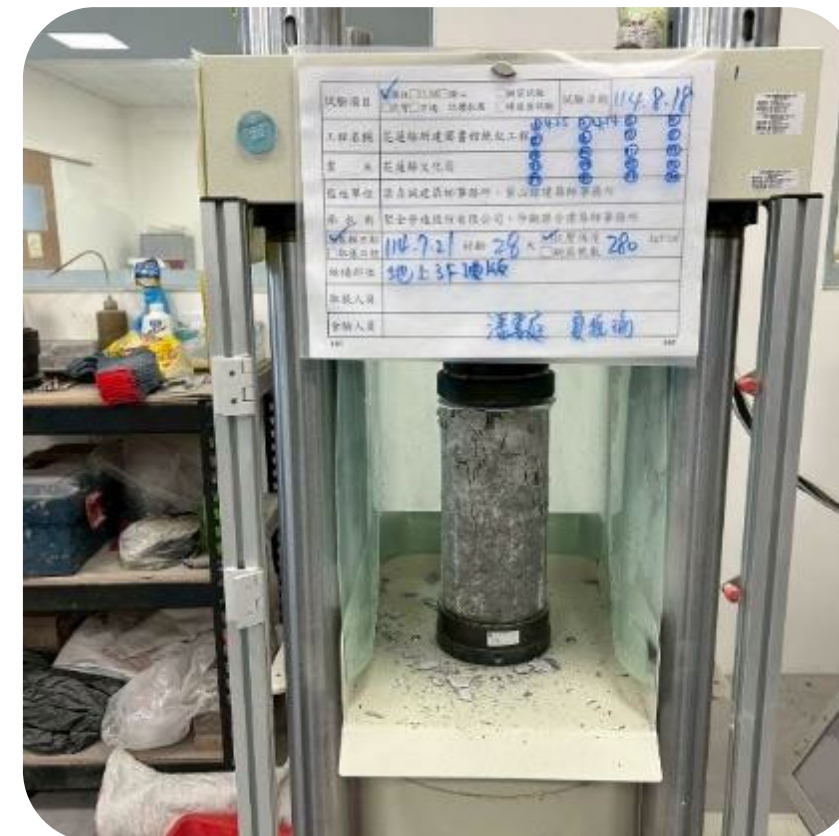

檢(試)驗相關作業



職安衛、環境保護作業

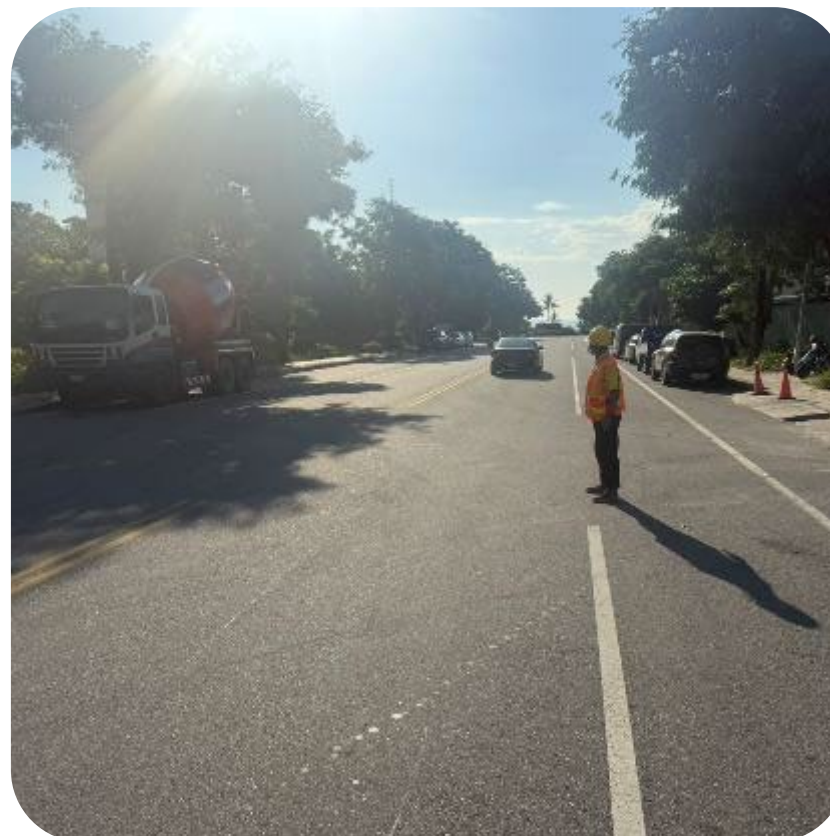

各項工程文件審查情形、 監造所見問題與年監造執 行重點

(梁貞誠建築師事務所-專案管理暨監造)

一、契約應辦事項說明

花蓮縣新建圖書館工程案

統包廠商設計及施工階段工作項目

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	廠商提報日	有無逾期	進度說明
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	無逾期	機關同意備查
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後 20 日內 由機關於招標時載明 提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
6	地質鑽探及試驗工作計畫書		-	111.12.29	無逾期	機關同意備查
7	拆除計畫	依據核定工作執行計畫書於112.1.12	112.1.12	112.1.12	無逾期	機關同意備查
8	基本設計報告書及圖冊/ BIM基本設計報告書及模型檔	依據核定工作執行計畫書於112.2.15	112.2.15	112.2.15	無逾期	機關同意備查
9	細部設計報告書及圖冊/ BIM細部設計報告書及模型檔	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.8.5	112.7.24		審查中
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.15	112.8.15	112.8.15	無逾期	審查中
11	樹木移植計畫書			112.2.6	無逾期	機關同意備查
12	地質鑽探及試驗地基調查報告書			112.3.2	無逾期	機關同意備查
13	拆除工程分項施工計畫書	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.1	112.8.1	112.5.24	無逾期	機關同意備查
14	建造執照申辦	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.23	112.8.23	112.6.27	無逾期	已於112.10.16取得

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案 統包廠商設計階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21			111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031號	貞誠公(花圖)字第1111107001號	(111)巨圖字第2203-1114號	貞誠公(花圖)字第1111121002號			蓮文行字第1110012958號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	112.07.21					112.07.28	
				(112)巨圖字第2203-0720號	貞誠公(花圖)字第1120721001號					蓮文行字第1120007986號	
				審查中	同意核定					同意備查	
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	111.11.21					111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-01號	貞誠公(花圖)字第1111121004號					蓮文行字第1110012960號	
				審查中	同意核定					同意備查	
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21			111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-02號	貞誠公(花圖)字第1111107003號	(111)巨圖字第2203-1114-01號	貞誠公(花圖)字第1111121003號			蓮文行字第1110012959號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後 20 日內由機關於招標時載明 提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	110.10.31	111.11.07	111.11.14	111.11.21			111.11.24	
				(111)巨圖字第2203-1031-03號	貞誠公(花圖)字第1111107004號	(111)巨圖字第2203-1114-02號	貞誠公(花圖)字第1111121001號			蓮文行字第1110012957號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
6	地質鑽探及試驗工作計畫書		-	111.12.29	112.01.05					112.01.16	
				(111)巨圖字第2203-1229號	貞誠公(花圖)字第1120105002號					蓮文行字第1120000271號	
				審查中	同意核定					同意備查	
7	拆除計畫	統包商應按契約規定於工作執行計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報拆除計畫。	依據核定工作執行計畫書於112.1.12	112.01.12	112.01.18	112.02.10	112.02.17	112.02.24	112.03.03	112.03.22	
				(112)巨圖字第2203-0112號	貞誠公(花圖)字第1120118001號	(112)巨圖字第2203-0210號	貞誠公(花圖)字第1120217001號	(112)巨圖字第2203-0224號	貞誠公(花圖)字第1120303001號	蓮文行字第1120002222號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定	同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商設計階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
8	基本設計報告書及圖冊/BIM基本設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「基本設計報告書及圖冊」。統包商應於提送基本設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.2.15	112.02.15/ 112.02.15	112.02.22	112.04.11	112.04.18			112.04.21	
				(112)巨圖字第2203-0215號/ (112)巨圖字第2203-0215-01號	貞誠公(花圖)字第1120222001號	(112)巨圖字第2203-0411號	貞誠公(花圖)字第1120418001號			蓮文行字第1120004132號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
9	細部設計報告書及圖冊/BIM細部設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	依據核定工作執行計畫書於112.8.5	112.07.24	112.08.04	112.08.14	112.08.21	112.10.27	112.11.03	112.12.29	
				(112)巨圖字第2203-0724號	貞誠公(花圖)字第1120804001號	(112)巨圖字第2203-0814號	貞誠公(花圖)字第1120821001號	(112)巨圖字第2203-1027號	貞誠公(花圖)字第1121103002號	蓮文行字第1120012080號	
				審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	同意備查	
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期限天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。		112.08.15	112.08.22	113.08.09	113.08.16			113.10.11	
				(112)巨圖字第2203-0815-02號	貞誠公(花圖)字第1120822001號	(112)仲建字第2203-0809號	貞誠公(花圖)字第1130816001號			蓮文行字第1130009646號	
				審查中	提供意見_後續配合機關審查會議持續修正中	審查中	同意核定			同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
11	樹木移植計畫書			112.02.06	112.02.13	112.02.20	112.02.24			112.03.01	
				(112)巨圖字第2203-0206號	貞誠公(花圖)字第1120213001號	(111)巨圖字第2203-0220號	貞誠公(花圖)字第1120224001號			蓮文行字第1120002038號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
12	地質鑽探及試驗地基調查報告書			112.03.02	112.03.09					112.03.22	
				(112)巨圖字第2203-0302號	貞誠公(花圖)字第1120309001號					蓮文行字第1120002390號	
				審查中	同意核定					同意備查	
13	拆除工程分項施工計畫書			112.05.24	112.05.30	112.06.09	112.06.16	112.07.06	112.07.13	112.08.23	
				(112)巨圖字第2203-0524號	貞誠公(花圖)字第1120530001號	(112)巨圖字第2203-0609號	貞誠公(花圖)字第1120616001號	(112)巨圖字第2203-0706號	貞誠公(花圖)字第1120713001號	蓮文行字第1120007682號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定	同意備查	
14	申請建築執照			112.06.27		112.09.07		112.09.14			112.10.16日 取得
				第一次圖審		第二次圖審		第三次圖審			
15	土方工程計畫書			112.11.30	112.11.02	112.11.24	112.11.29			112.03.01	
				(112)巨圖字第2203-103001號	貞誠公(花圖)字第1121102003號	(111)巨圖字第2203-112403號	貞誠公(花圖)字第1121129001號			蓮文行字第1120002038號	
				審查中	檢退	審查中	檢退			同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
16	拆除土方暫置計畫書			112.12.07	112.12.20	113.01.08	113.01.10			113.01.18	
				(112)巨圖字第2203-120701號	蓮文行字第1120013789號	(112)巨圖字第2203-010802號	貞誠公(花圖)字第1120110007號			蓮文行字第1130000437A號	
				審查中	檢退	審查中	同意審查			同意核定	
17	整體施工計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起30日內提送		113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29	113.01.31	113.02.01	113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-011203號	貞誠公(花圖)字第1130119001號	(113)巨圖字第2203-012203號	貞誠公(花圖)字第1130129003號	(113)巨圖字第2203-013101號	貞誠公(花圖)字第1130201001號	蓮文行字第1130001338號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定	同意備查	
18	整體品質計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起30日內提送		113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29			113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-011204號	貞誠公(花圖)字第1130119002號	(113)巨圖字第2203-012201號	貞誠公(花圖)字第1130129001號			蓮文行字第1130001338號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
19	職業安全衛生管理計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起30日內提送		113.01.22	113.01.29					113.02.06	
				(113)巨圖字第2203-012203號	貞誠公(花圖)字第1130129002號					蓮文行字第1130001338號	
				審查中	同意核定					同意備查	
20	第一階段施工要徑圖及工程預定進度網圖			113.03.04	113.03.07					113.04.18	
				(113)巨圖字第2203-030401號	貞誠公(花圖)字第1130307001號					蓮文行字第1130003458號	
				審查中	檢退					同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
21	土方開挖工程分項施工計畫書(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.01.22	113.01.29	113.02.05	113.02.07			113.03.06	
				(113)巨圖字第 2203-012204號	貞誠公(花圖)字第 1130129004號	(113)巨圖字第 2203-020501號	貞誠公(花圖)字第 1130207002號			蓮文行字第 1130001731號	
				審查中	檢退	審查中	同意審查			同意備查	
22	鋼筋工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.03.04	113.03.07	113.03.11	113.03.12			113.04.02	
				(113)巨圖字第 2203-030401號	貞誠公(花圖)字第 1130307001號	(113)巨圖字第 2203-031101號	貞誠公(花圖)字第 1130312004號			蓮文行字第 1130002864號	
				審查中	檢退	審查中	檢退			同意備查	
23	混凝土澆置工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.03.07	113.03.12					113.04.02	
				(113)巨圖字第 2203-030701號	貞誠公(花圖)字第 1120312002號					蓮文行字第 1130002860號	
				審查中	同意核定					同意備查	
24	汛期工地防災減災計畫(第一版)			113.03.08	113.03.12					113.04.16	
				(113)巨圖字第 2203-030801號	貞誠公(花圖)字第 1120312006號					蓮文行字第 1130002863號	
				審查中	同意核定					同意核定	
25	交通安全維持及管制計畫			113.03.25	113.03.27					113.04.02	
				(113)聚圖字第 2203-032501號	貞誠公(花圖)字第 1120327001號					蓮文行字第 1130003515號	
				審查中	同意核定					同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
26	安全監測分項施工計畫			113.03.28	113.03.29					113.04.16	
				(113)緊圖字第2203-032801號	貞誠公(花圖)字第1120329002號					蓮文行字第1130003641號	
				審查中	同意核定					同意備查	
27	模板工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.04.11	113.04.12					113.04.16	
				(113)緊圖字第2203-041103號	貞誠公(花圖)字第1120412001號					蓮文行字第1130004576號	
				審查中	同意核定					同意備查	
28	防水工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.04.12	113.04.15					113.04.18	
				(113)緊圖字第2203-041201號	貞誠公(花圖)字第1130415003號					蓮文行字第1130004626號	
				審查中	同意核定					同意備查	
29	施工架工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.04.12	113.04.15					113.04.18	
				(113)緊圖字第2203-041202號	貞誠公(花圖)字第1130415004號					蓮文行字第1130004627號	
				審查中	同意核定					同意備查	
30	臨時擋土設施(鋼軌樁)暨邊坡保護工程分項施工計畫書(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.04.15	113.04.17					113.04.25	
				(113)緊圖字第2203-041501號	貞誠公(花圖)字第1130417002號					蓮文行字第1130004724號	
				審查中	同意核定					同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
31	泥作工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.05.28	113.06.03					113.07.23	
				(113)聚圖字第 2203-052801號	貞誠公(花圖)字第 1130603001號					蓮文行字第 1130006614號	
				審查中	同意核定					同意備查	
32	升降機設備分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.07.15	113.07.22					113.08.02	
				(113)聚圖字第 2203-071505號	貞誠公(花圖)字第 113072201號					蓮文行字第 1130008611號	
				審查中	同意核定					同意備查	
33	接地工程分項施工計畫書	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.01.26	113.02.02					113.03.08	
				(113)巨圖字第 2203-012601號	貞誠公(花圖)字第 1130202001號					蓮文行字第 1130001541號	
				審查中	同意核定					同意備查	
34	電氣設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.19	113.12.27			114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120201號	貞誠公(花圖)字第1131210004號	(113)聚圖字第 2203-121901號	貞誠公(花圖)字第1131210004號			蓮文行字第 1140000076號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
35	弱電設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.18	113.12.26			114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120202號	貞誠公(花圖)字第1131210001號	(113)聚圖字第 2203-121802號	貞誠公(花圖)字第1140126003號			蓮文行字第 114000076號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案											
統包廠商施工階段工作項目											
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆	提送日期	專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
36	給排水設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.19	114.01.02			114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120203號	貞誠公(花圖) 字第1131210003號	(113)聚圖字第 2203-121903號	貞誠公(花圖) 字第1140102002號			蓮文行字第 114000076號	
				審查中	同意核定	審查中	同意核定			同意備查	
37	消防設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.19	114.01.02			114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120204號	貞誠公(花圖) 字第1131210002號	(113)聚圖字第 2203-121902號	貞誠公(花圖) 字第1140102001號			蓮文行字第 114000076號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	

結論說明:本案自開工111/10/11起除每月月報外統包商共計辦理 **37項** 契約應辦事項
目前共有 **0件** 逾期提送、 **37件**核定後機關同意備查、**建築執照**已於112年10月16日取得。細部設計等 **1件**持續辦理中。



未來半年監造執行重點

(一) 114年03月27日~05月14日 3F鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(二) 114年05月15日~07月01日 4F鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置

(三) 114年07月02日~07月31日 RF鋼筋組立、模板組立、混凝土澆置


(四) 115年06月02日~室內裝修

(五) 115年08月01日~室外裝修




近半年民意調查問卷 統計結果 (政風室)


性別




年齡




職業




是否支持本局成立機關採購廉政平臺？




是否清楚本局已於官網設置工程廉政平臺專區？




是否願意於廉政平臺專區獲取工程最新資訊（包括工程施工進...




是否同意重大公共工程成立廉政平臺能降低外力不當干涉？



是否同意重大公共工程成立廉政平臺能提昇工程整體品質？



如遇公務員涉犯貪瀆不法案件，是否願意向政風機構檢舉反映？



網路問卷建議事項：希望沙發要乾淨。

廉政倫理事件（請託關說、飲宴應酬、財物饋贈）：無。

民眾陳情投訴事件：無。

提案討論

提案一

案由：為確保工程品質，建請承攬廠商遇有工地主任、品管等專任人員去職情形，應儘速覓妥相等資格人員替補。

提案單位：政風室

說明：

- 一、據聞日前廠商工地主任、品管或勞安人員遇有多數同時去職，暫時無法順利銜接之空窗期情形，先予敘明。
- 二、東部地區本就招工不易，近日又遇颱風造成光復地區嚴重災情，預料明年度本縣災後復害工程可能大量增加，勢必衍生各營造業為承攬工程而四處招聘相關工程專業人員之情形。
- 三、依據本件統包工程契約，本工程相關專業人員均屬專職，須長駐工地執行契約規範之工作內容，若遇去職缺工而又無法順利銜接情形，將直接影響本件工程進度與品質，且相關材料檢驗作業，須由專任品管人員執行，按照契約規範抽（查）驗，維持渠等工程專業人員穩定在職和正常運作，至為重要。

辦法：

- 一、建請統包廠商遇有契約規定之專責人員去職時，應儘速於2週內覓妥相等資格人員替補。
- 二、請監造廠商落實監督品管作業，遇有上開所指統包商專責人員離職而未替補情形應密切掌握並予稽催，替補人員資格亦應落實審查。
- 三、採購單位請確實督導統包廠商專責人員去職與替換情形，儘速核定並依限於公共工標案系統變更相關人員資料。

臨時動議

會議結束
