

廉政平臺第六次聯繫會報

會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
10:00-10:05	5分鐘	主席致詞	陳建村局長
10:05-10:10	5分鐘	來賓致詞	
10:10-10:20	5分鐘	上次會議決議事項執行進度	政風室
10:20-10:30	10分鐘	工程督導、材料檢驗與品質管制執行情形	行政科
10:30-10:40	10分鐘	目前工程執行進度與未來半年預計進度	統包廠商
10:40-10:50	10分鐘	各項工程文件審查情形、監造所見問題與年監造執行重點	專管廠商
10:50-10:55	5分鐘	近半年民意調查問卷統計結果	政風室
10:55-11:00	5分鐘	提案討論	與會人員

會議議程說明

時間	使用時間	內容	說明單位
11:00-11:10	5分鐘	臨時動議	與會人員
11:10-11:15	5分鐘	主席結論	主席
11:20		散會	

主席致詞



來賓致詞



上次會議決議事項執行進度


(政風室)

項次	決議事項	辦理單位	執行情形	管制建議
1	<p>請統包廠商遇有契約規定之專責人員去職時，應儘速於2週內覓妥相等資格人員替補監造廠商落實監督品管作業，遇有上開所指統包商專責人員離職而未替補情形，應密切掌握並予稽催，替補人員資格亦應落實審查；採購單位請確實督導統包廠商專責人員去職與替換情形，儘速核定並依限於公共工標案系統變更相關人員資料。</p>	<p>統包廠商 監造廠商 行政科</p>	<p>「因人力因素聘請不易，目前品管人員尚缺額1名，仍持續招聘中，暫時以增聘工務助理方式，協助土建跟機電品管工作。</p>	<p>繼續列管</p>
2	<p>廉政平臺與工程會標案管理系統的資訊更新，請行政科後續務必再次檢視這兩個網站，確認資料是否已更新至最新進度，並完成前後資料的勾稽。</p>	<p>行政科</p>	<p>依會議決議辦理。</p>	<p>解除列管</p>

工程督導、材料檢驗與 品質管制執行情形

(行政暨文化設施科)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約工期

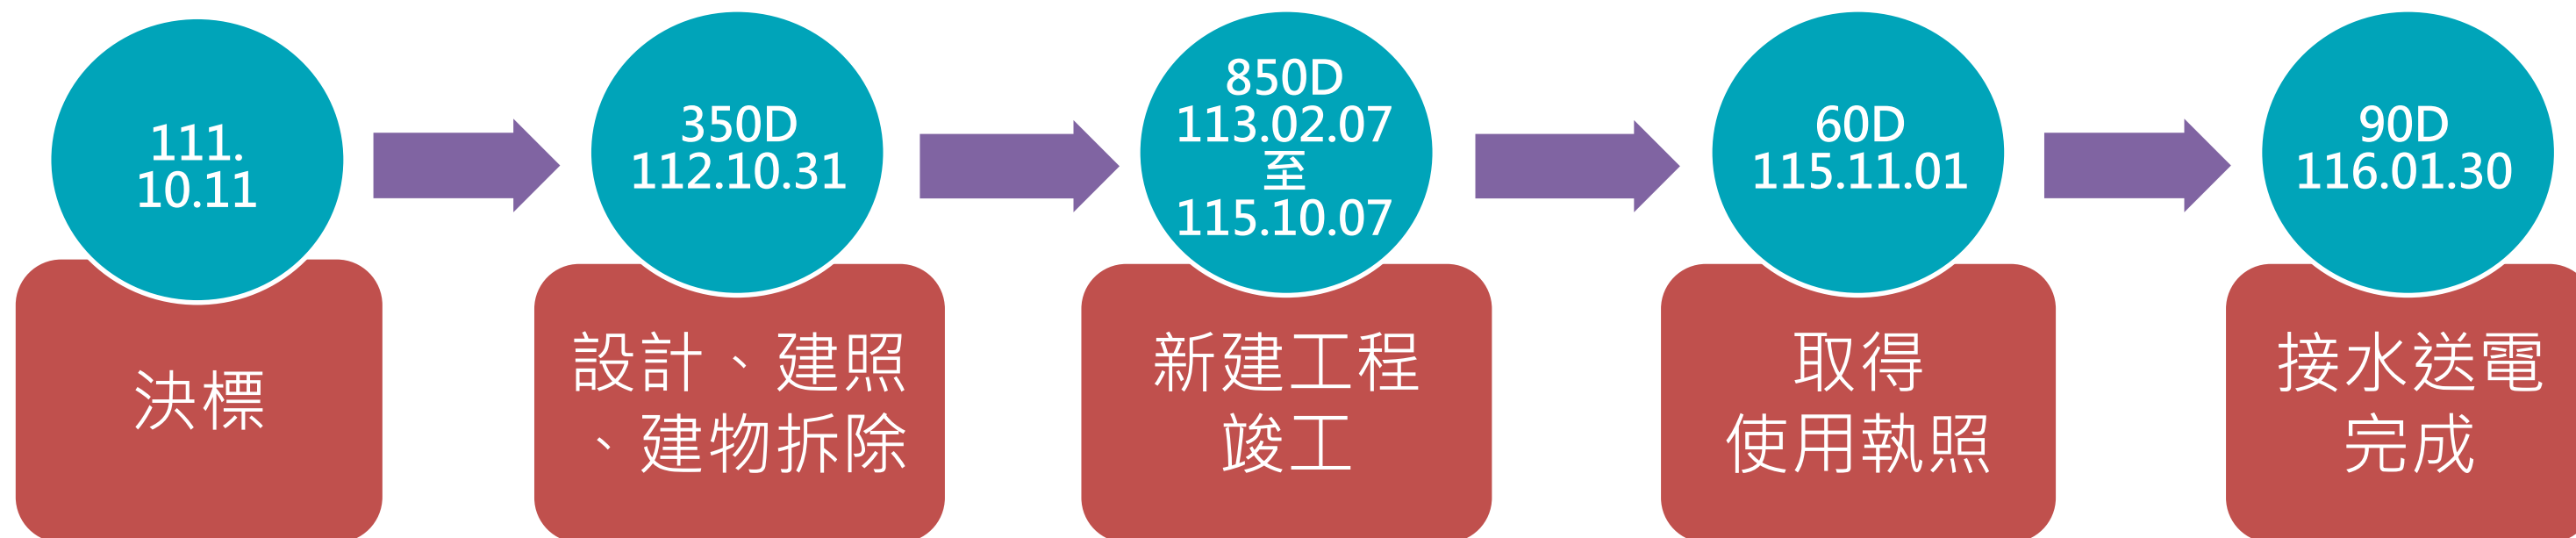

規劃設計期：決標日起350日

新建工程施工：機關通知日起7日內開工，計850日

展延及不計工期：124日(國定連假77日及自然災害47日)

取得使用執照：竣工次日起60日

完成接水送電：取得使用執照起90日

工期合計：1200日

完成建管程序合計：1350日

預計116年01月30日完成



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程規模

契約規模：8億4,942萬9,000元。

決標金額：4億2,471萬4,500元(110年10月11日)。

後續擴充金額：4億2,471萬4,500元(113年12月24日)。

設計契約價金(總包價法)：2,476萬1,200元。

工程契約價金(總包價法)：8億2,466萬7,800元。

樓地板面積：約1萬4,000坪。

樓層：地上四層，地下一層。

**115年1月
建築結構完成**



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 趕辦施工作為 - 分區同步施作



花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程督導執行概況

工程督導執行概況(115/4/30日止)

- 工程巡查85次。
- 工程督導12次。
- 工程協調會報11次(工務會議)。
- 工程專業技術協調會52次
- 工程技術協調月會24次
- 品質抽查驗會同結構27次(土建類25次、機電廠驗2次)

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 材料檢驗與品質管制會同情形

項次	項目	次數	地點
1	混凝土	10次	鳳勝(花蓮廠)
2	鋼筋	12次	工程現場
3	鋁門窗風雨試驗	1次	工程現場
4	土壤密度試驗	1次	工程現場
5	植筋強度拉拔試驗	1次	工程現場
6	機電設備廠驗	2次	工廠

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 工程查核情形

項次	日期	單位	查核結果	備註
1	113/06/03	花蓮縣政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查核分數78分(乙等)。 2. 專案管理暨監造單位扣5點、統包廠商扣6點 3. 經2次提送改善對策完成縣府備查。 	
2	113/10/09	教育部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查核分數75分(乙等)。 2. 專案管理暨監造單位扣7點、統包廠商扣7點 3. 經1次提送改善對策完成教育部備查。 	
3	114/10/20	花蓮縣政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查核分數77分(乙等)。 2. 專案管理扣2點、監造單位扣2點、統包廠商扣6點。 3. 經2次提送改善對策完成縣府備查。 	
4	114/12/19	工程會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查核分數待判定。 2. 專案管理、監造單位及統包廠商各扣2點。 3. 缺失改善辦理中。 	

花蓮縣新建圖書館統包工程 - 契約執行現況

拆除工程

拆除執照：於112年5月12日取得。

拆除開工：於112年6月26日完成建物報廢程序，112年9月20日開工。

拆除完工：於112年11月4日申報竣工，113年3月4日建管解列。

新建工程

建造執照：於112年10月11日取得。

工程開工：於113年2月7日開工。

預定完工：於115年10月7日竣工，目標115年12月驗收。

契約累計撥款：2億8,503萬0,152 元(完成5次估驗)。


第六次估驗撥款中-完成後為3億0,851萬2,395元
第七次估驗審核中

目前工程執行進度與 未來半年預計進度

(聚全營造股份有限公司-統包廠商)

執行進度概述

總工期-897日曆天(850+展延47)

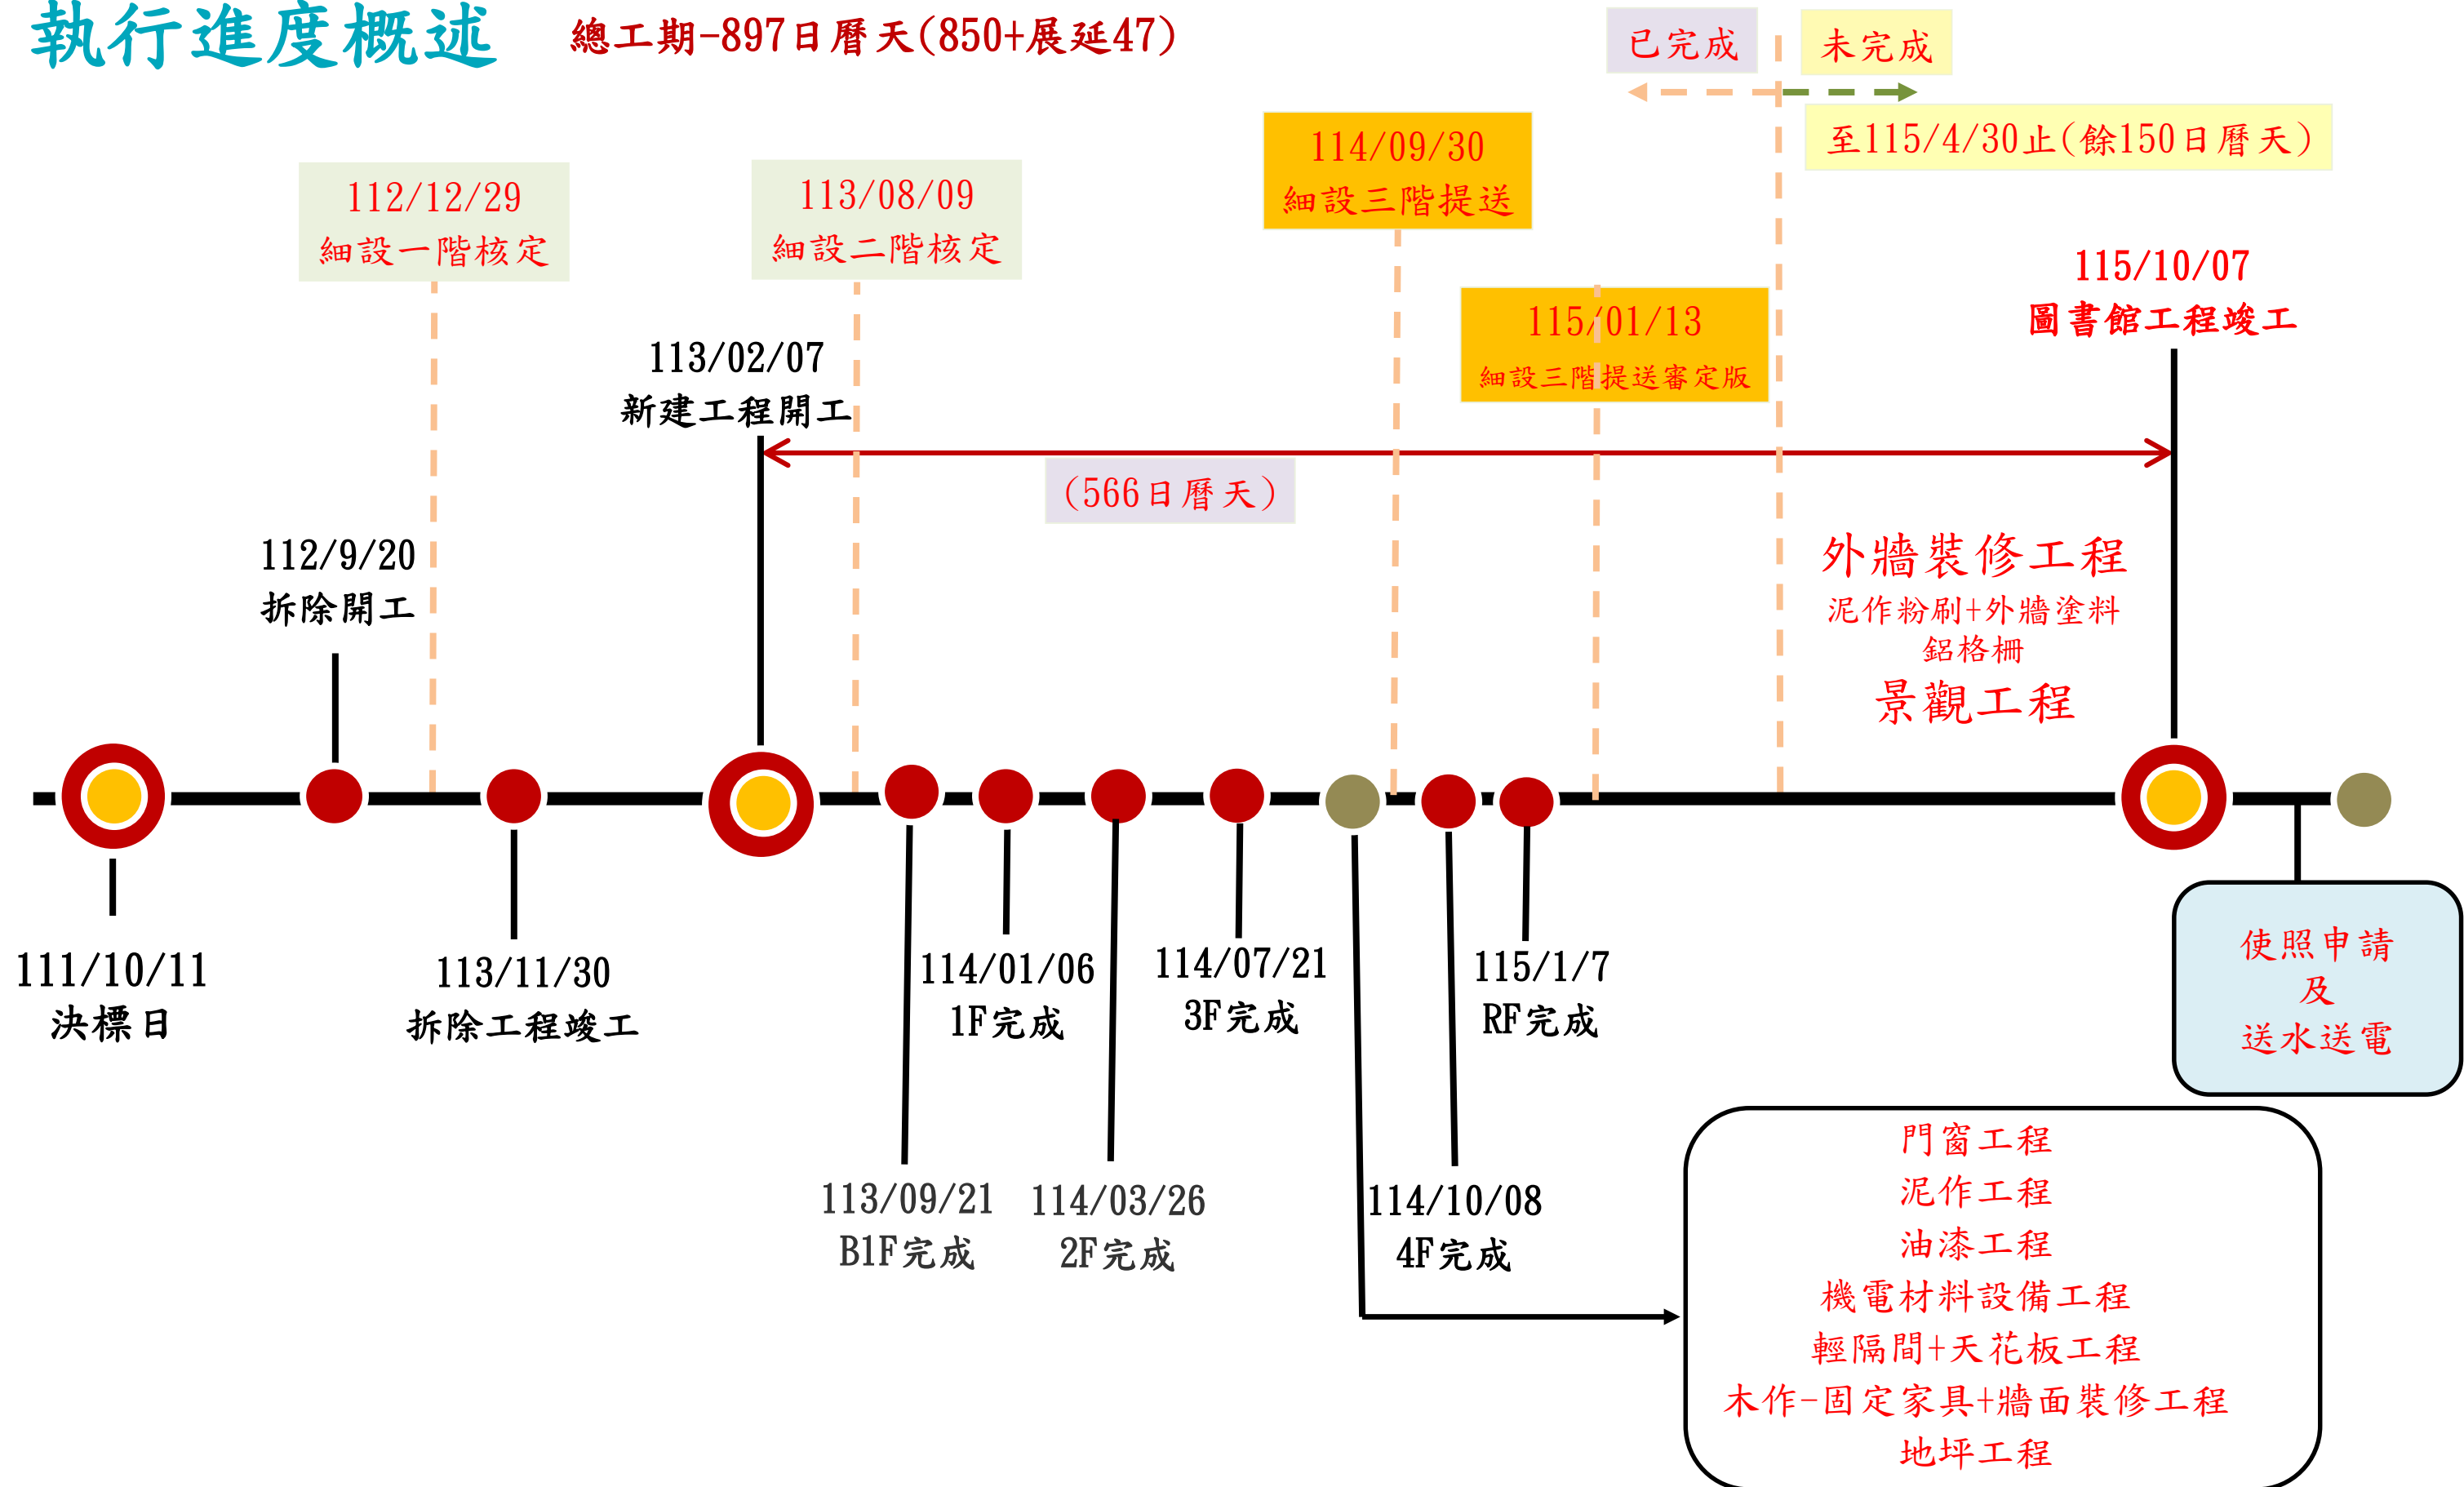

目前累計工期計算-至115/4/30止
747日曆天

工期統計表

花蓮縣圖書館新建統包工程
工期檢討表

Table with columns for year (年), month/day (日期/月份), and days (1-31). Rows are grouped by year (113, 114, 115) and include holiday annotations like '農曆春節', '清明節', '端午節', etc. Total days are 747.

115/4/30

竣工期限-115/10/7

(工期計算如下頁)

工期統計表

說明：依據113年12月6日花蓮縣文化局蓮文行字第1130015709號函

(一)展延工期：依據契約第七條第(三)款規定，累計共45日。

- 1、113年4月3日地震停班停課，計1日。
- 2、113年4月23日地震停班停課，計1日。
- 3、113年7月24日至25日凱米颱風停班停課，計2日。
- 4、113年10月1日至3日山陀兒颱風停班停課，計3日。
- 5、113年10月31日康納颱風停班停課，計1日。
- 6、113年7月26日至8月31日凱米颱風受損工項復原（可辦理復原工項），計37日。

(二)展延工期：依據契約第七條第(三)款規定，至114年10月17日止，暫計 2日。

- 1、114年8月13日楊柳颱風停班停課，計1日。
- 2、114年9月23日樺加沙颱風停班停課，計1日。

原契約工期850+展延工期47=897日曆天

(三)免計工期：依據契約第七條第(一)款第3目規定，計共17日。

- 1、113年2月8日至14日春節，計7日。
- 2、113年2月28日228紀念日，計1日。
- 3、113年4月4日至7日清明節，計4日。
- 4、113年6月8日至10日端午節，計3日。
- 5、113年9月17日中秋節，計1日。
- 6、113年10月10日國慶日，計1日。

(四)免計工期：依據契約第七條第(一)款第3目規定，人事行政總處已於114年6月13日公布114年(西元2025年)政府行政機關辦公日曆表(修正版)，計共33日。

- 1、114年1月1日元旦，計1日。
- 2、114年1月28日至2月2日春節，計9日。
- 3、114年2月28日至3月2日228紀念日，計3日。
- 4、114年4月3日至6日兒童節、民族掃墓節，計4日。
- 5、114年5月30日至6月1日端午節，計3日。
- 6、114年9月27日至29日教師節，計3日。
- 7、114年10月4日至6日中秋節，計3日。
- 8、114年10月10日至12日國慶日，計3日。
- 9、114年10月24日至26日光復節，計3日。
- 10、114年12月25日行憲紀念日，計1日。

(五)免計工期：依據契約第七條第(一)款第3目規定，人事行政總處已於114年6月13日公布114年(西元2026年)政府行政機關辦公日曆表，計共27日。

- 1、115年1月1日元旦，計1日。
- 2、115年2月14日至2月22日春節，計9日。
- 3、115年2月27日至3月1日和平紀念日，計3日。
- 4、115年4月3日至6日兒童節、清明節，計4日。
- 5、115年5月1日至3日勞動節，計3日。
- 6、115年6月19日至21日端午節，計3日。
- 7、115年9月25日至28日中秋節、教師節，計4日。

不計工期77日曆天

臨時施工圍籬向主管機關申請同意文

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

花蓮縣花蓮市公所 函

970
花蓮縣花蓮市民權路181號

地址：970花蓮市林森路252號
承辦人：陳小姐
電話：03-8322141#233
電子信箱：pei_kimi0318@nt.hualien.gov.tw

受文者：聚全營造股份有限公司 負責人:黃忠信

發文日期：中華民國115年4月21日
發文字號：花市建字第1150011231號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公司申請於本市「民享段1230、1271、1272、1230-1、1230-2、1020、1019、1019-1、1019-2等9筆地號」，工地使用道路搭建施工圍籬及臨時鷹架一案，本所原則同意，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司115年4月20日申請書辦理。
- 二、使用期限：115年4月25日至115年11月30日止。
- 三、使用路段：花蓮市民享段1230、1271、1272、1230-1、1230-2、1020、1019、1019-1、1019-2等9筆地號。
- 四、施工圍籬使用範圍：民權路(長85.8公尺、寬2公尺+寬1公尺安全通道)、文苑路(長162.8公尺、寬1.5公尺+寬1公尺安全通道)
- 五、現場連絡人員：方政雄(0911-380828)
- 六、「花蓮縣建築管理自治條例」第19條規定，建築工程使用道路者，使用道路寬度應依下列規定辦理：
 - (一)寬度在4公尺以下者，不得使用。
 - (二)寬度超過4公尺但未達6公尺者，使用寬度不得超過1公尺。
 - (三)寬度6公尺以上但未達12公尺者，使用寬度不得超過1公尺半。
 - (四)寬度12公尺以上者，使用寬度不得超過2公尺。

- 七、請貴公司依上開規定辦理，並請於起點與終點作好相關警示說明，以提醒用路人。
- 八、若貴公司未依上開說明辦理，相關交通意外，貴公司應負完全或與有過失責任。

正本：聚全營造股份有限公司 負責人:黃忠信
副本：花蓮縣政府、花蓮縣警察局花蓮分局

市長 魏嘉彥

本案依分層負責規定授權主管課長執行

臨時施工圍籬施作現況-安全通道-防撞桿施作情形



文苑路




文苑路、民權路轉角



民權路


結構體施工期程說明(已完成)

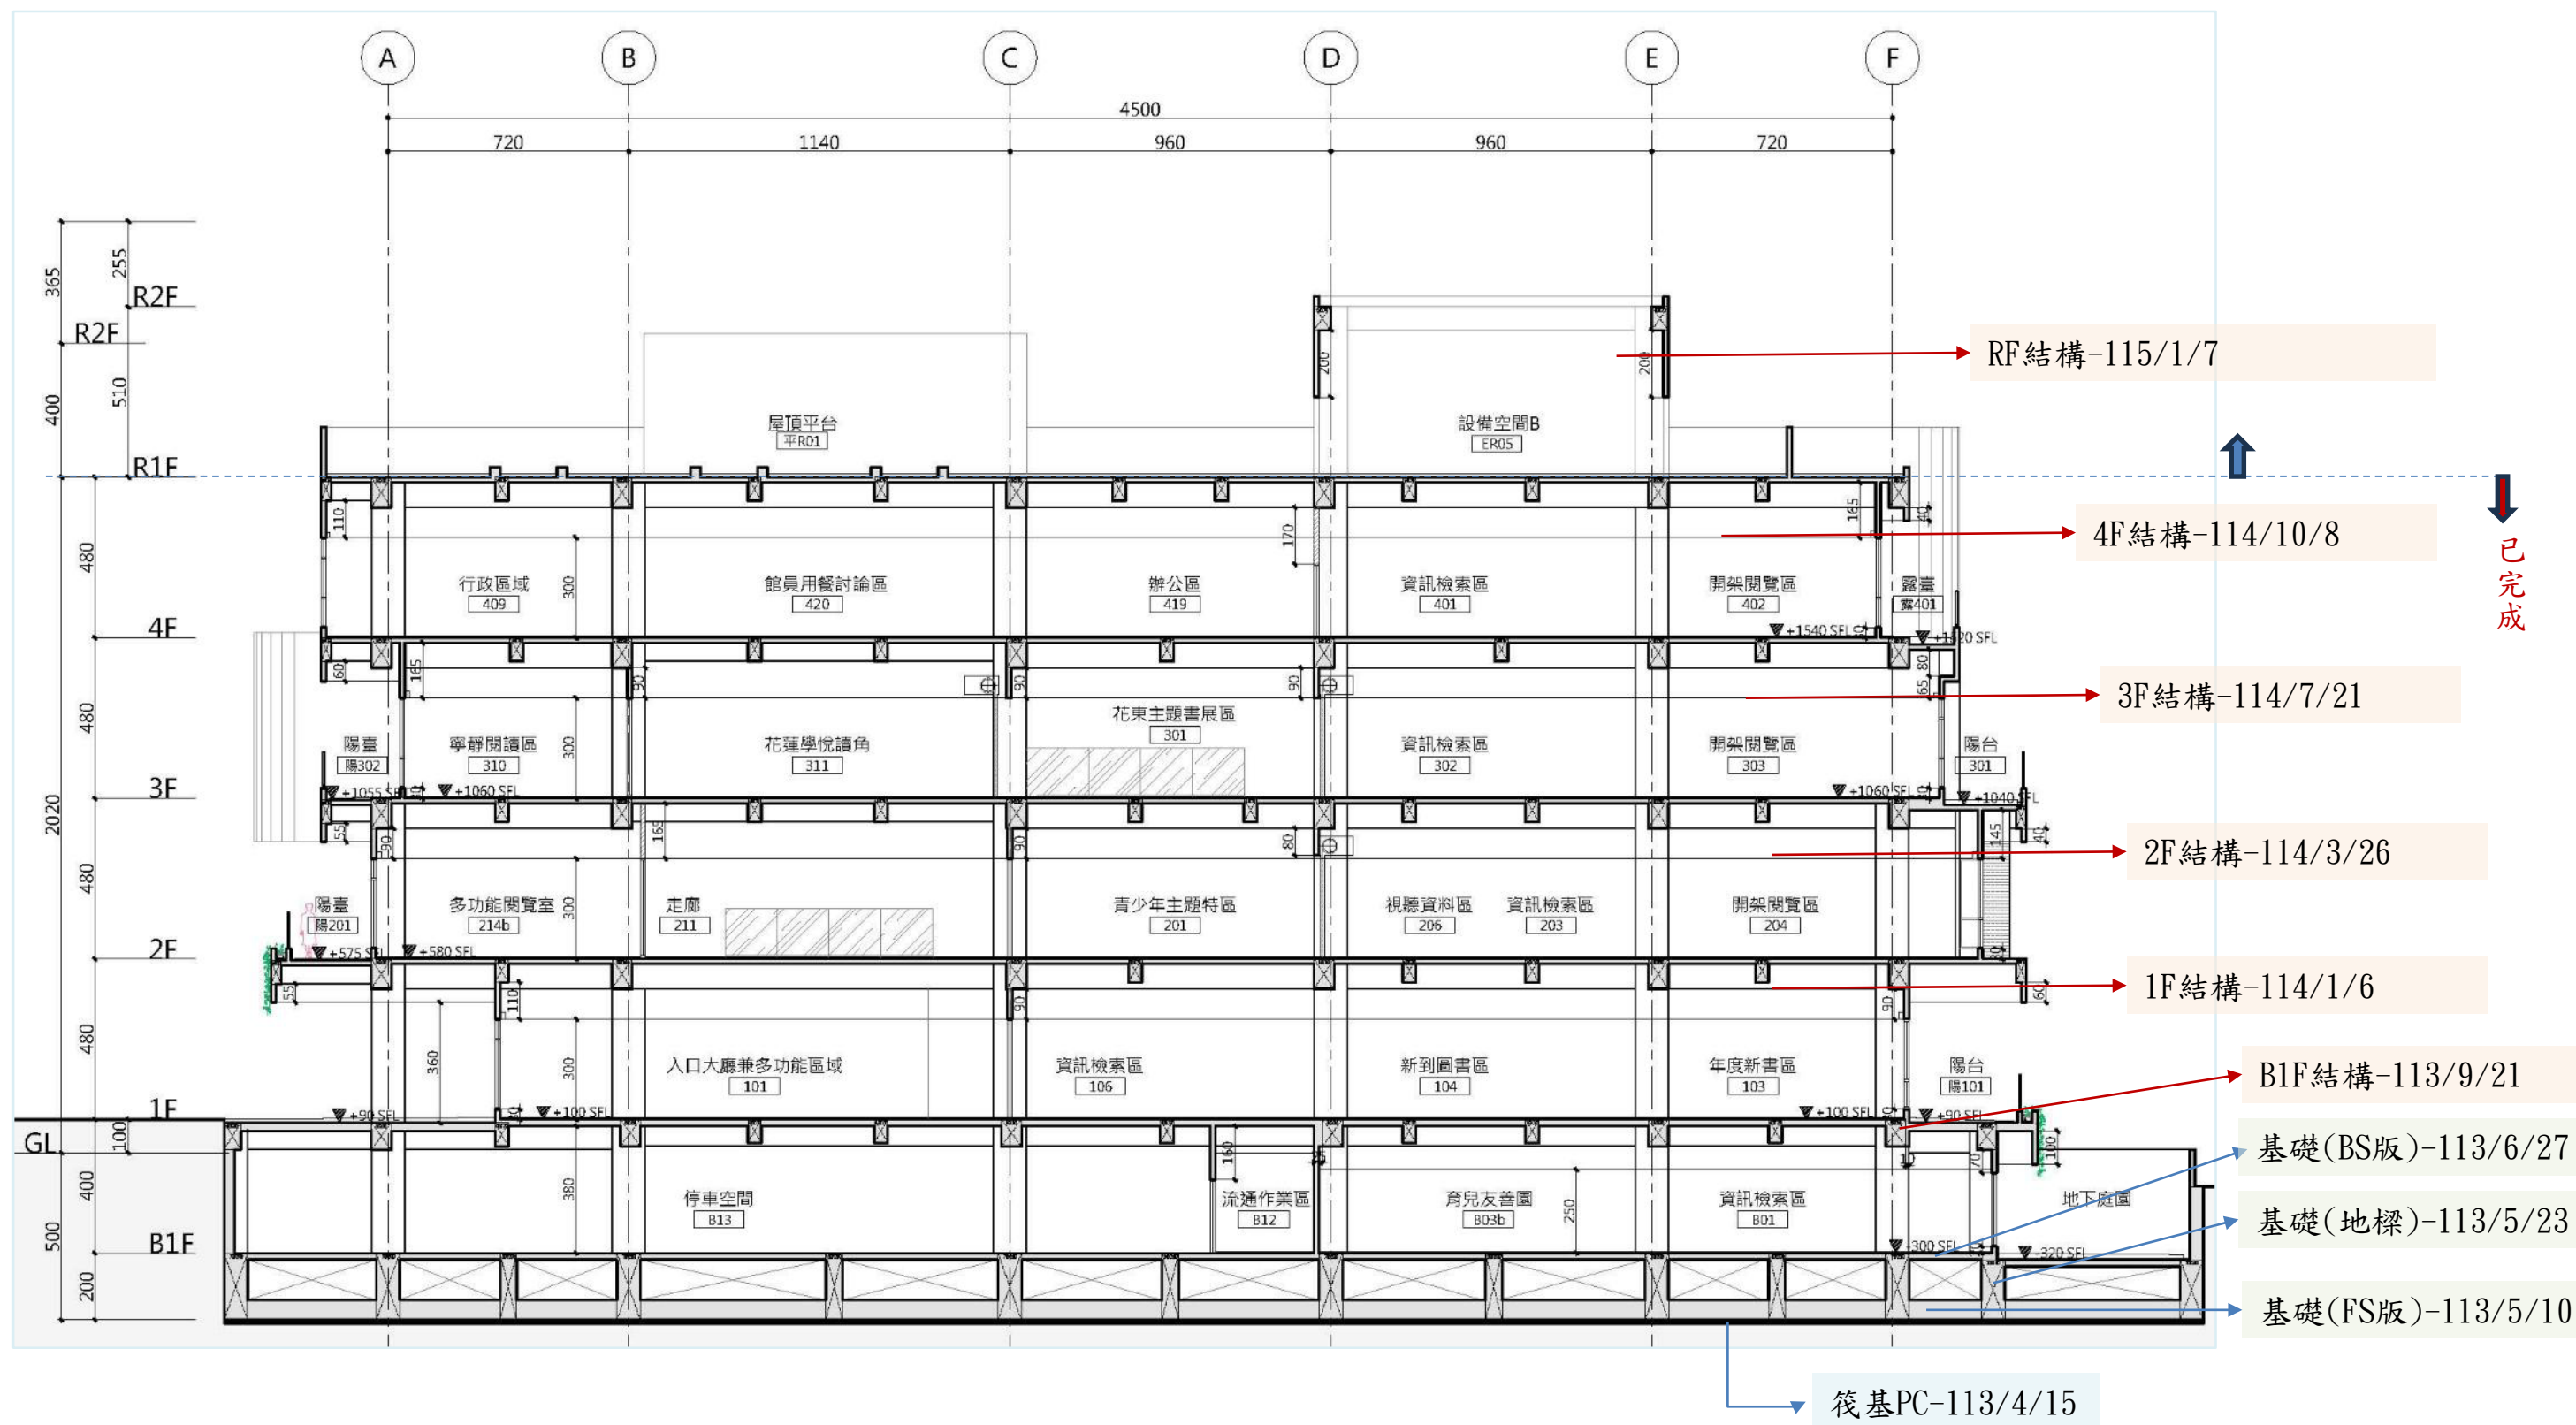

施工期程進度說明

115/4/26~115/10/7 預定施工情形概述

- 1、室內外泥作工項施作
- 2、水電、消防、空調工程施作
- 3、材料設備送審、廠驗等作業
- 4、室內裝修工程-木作工程、輕隔間、天花板、油漆、地坪等工程
- 5、五大管線接管準備作業圍籬移設

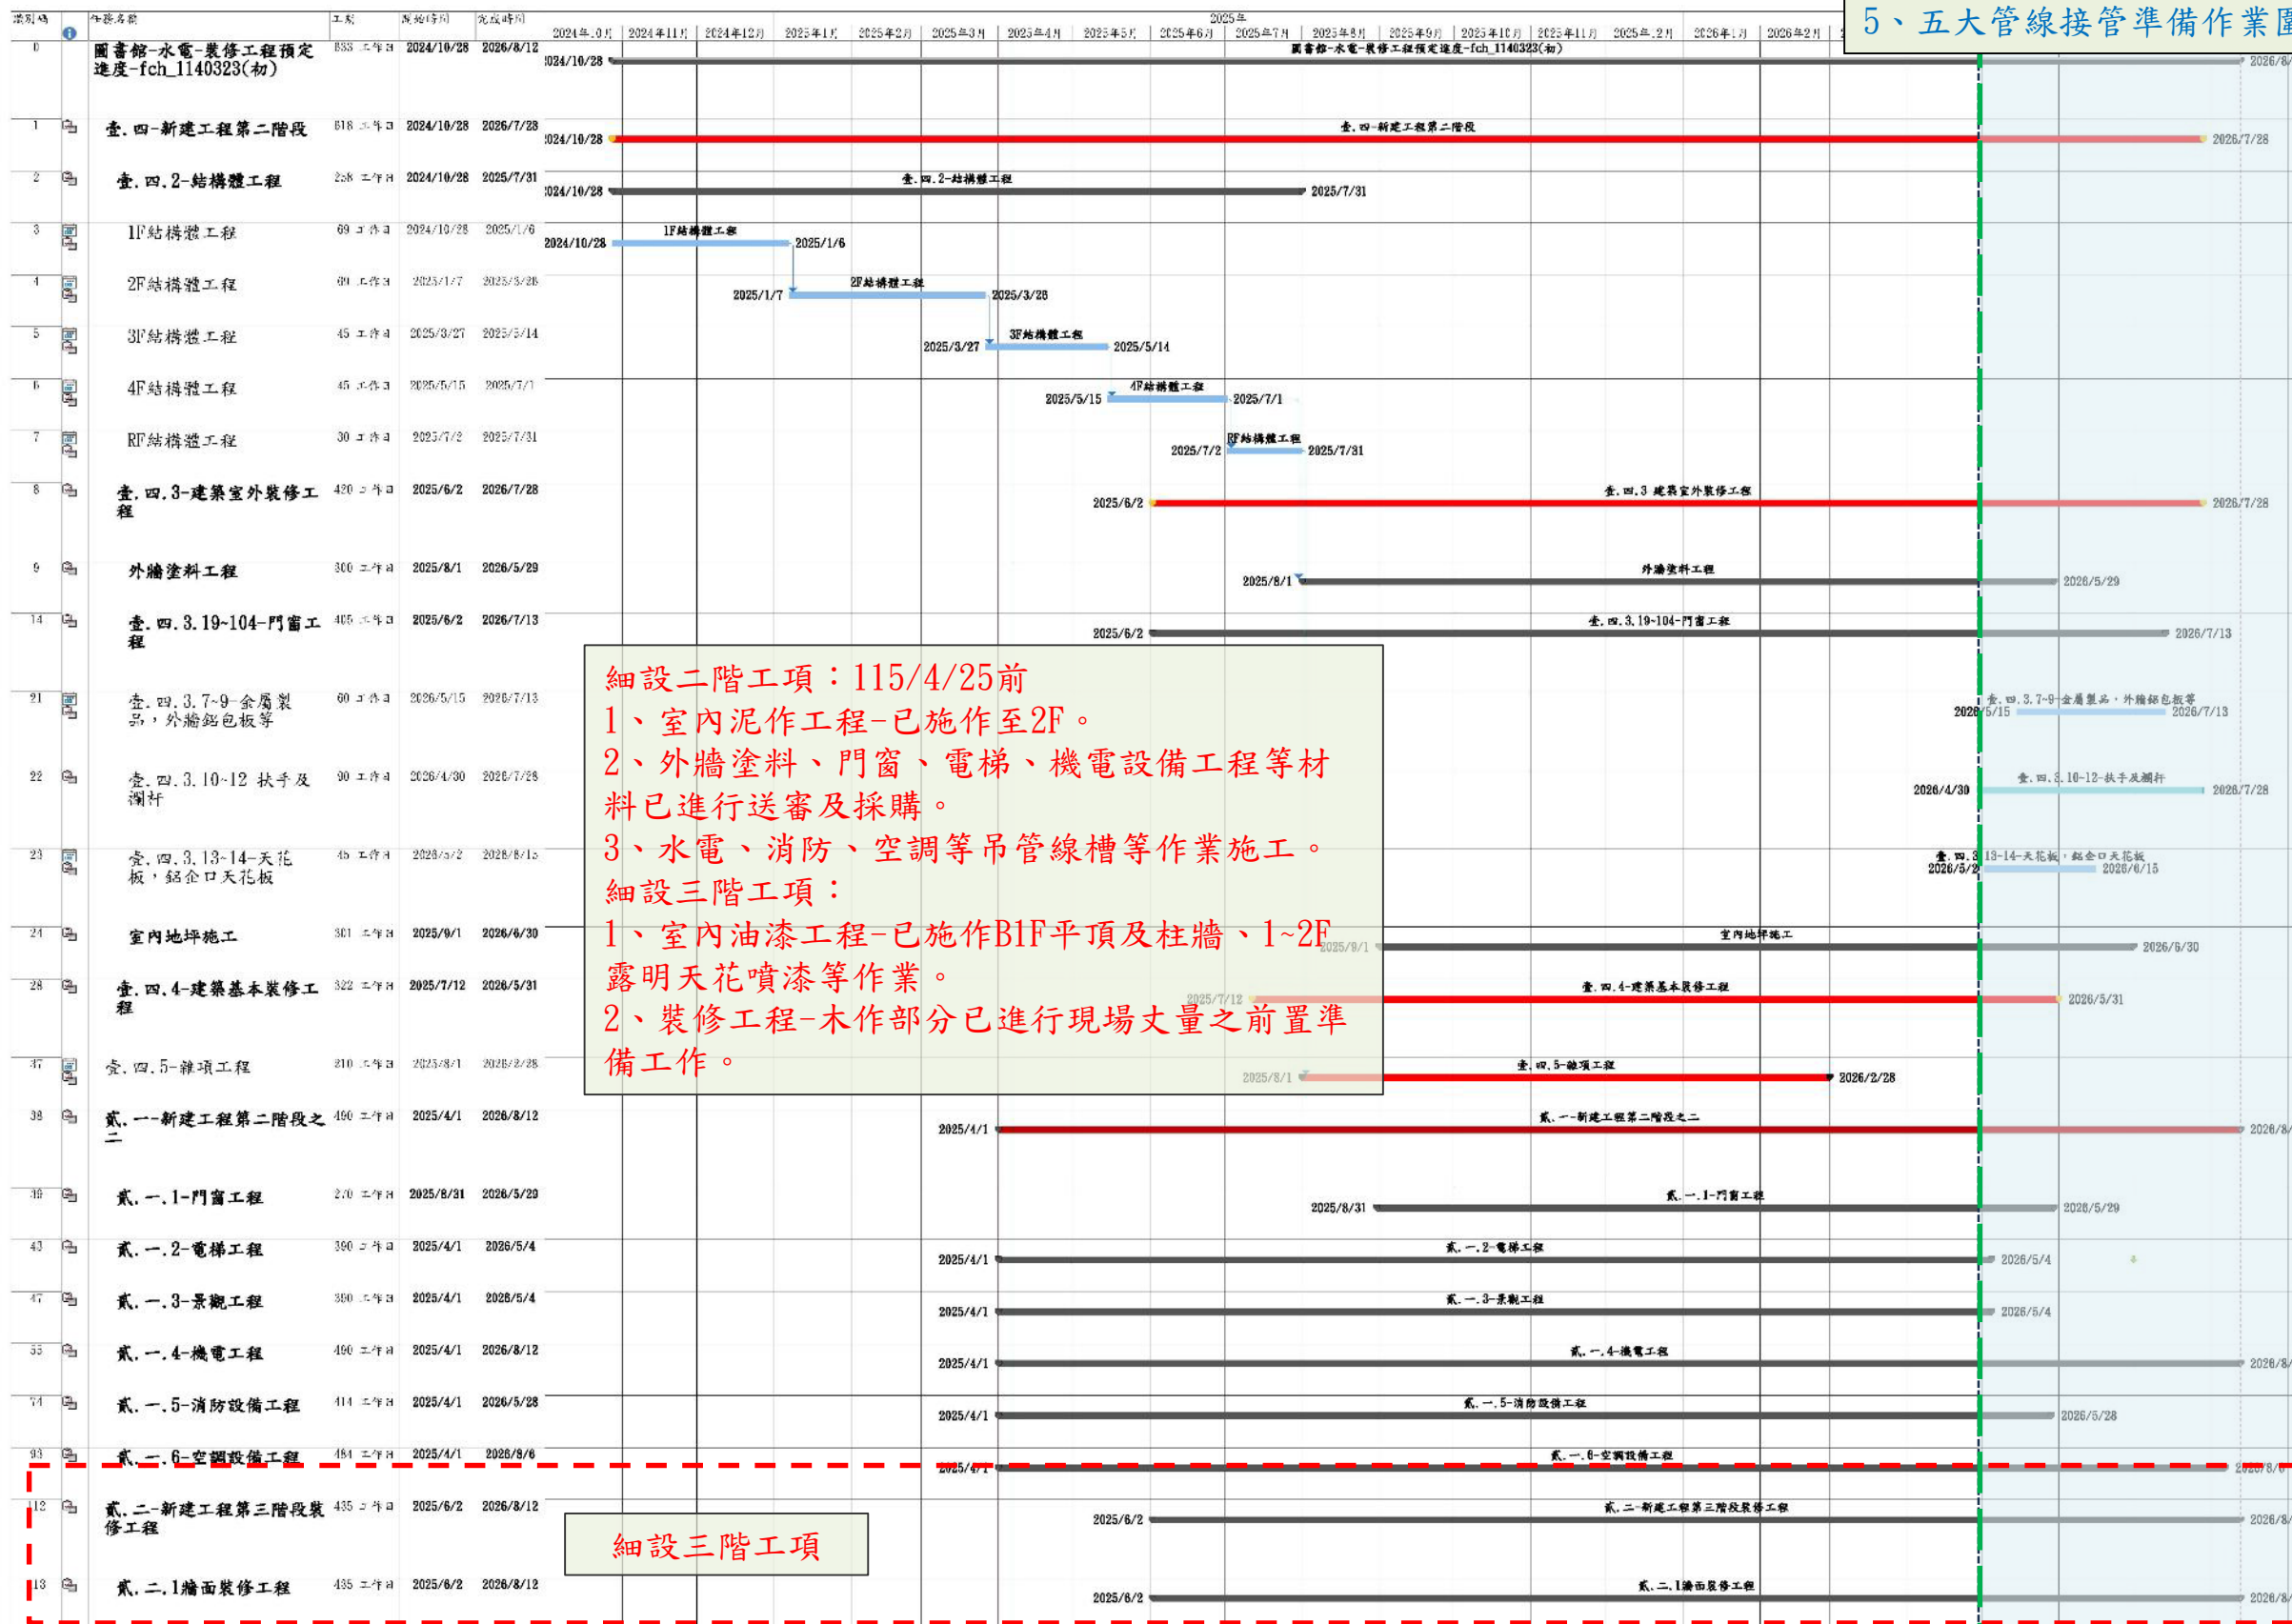

細設二階工項：115/4/25前
 1、室內泥作工程-已施作至2F。
 2、外牆塗料、門窗、電梯、機電設備工程等材
 料已進行送審及採購。
 3、水電、消防、空調等吊管線槽等作業施工。
細設三階工項：
 1、室內油漆工程-已施作B1F平頂及柱牆、1-2F
 露明天花噴漆等作業。
 2、裝修工程-木作部分已進行現場丈量之前置準
 備工作。

細設三階工項

進度落後原因：

1、裝修、機電工程部分：

裝修一期間因配合細設三階裝修工程部分施工範圍、內容及門窗尺寸調整等因素影響施作。

機電一因主要部分材料送審作業，過程經多次審查及會議研議聯審，現經監造單位核定，但部分項目材料尚未經業主同意備查，為利工進所需，於施工週會會議中經討論後，考量既經多次研議聯審並決議，爰同意材料先行進場，如線槽管架、消防、空調鍍鋅鐵管等材料設備，並辦理品質查驗作業。

改善對策及作為：

1、裝修、機電工程部分：

(一)裝修—各工作面皆同步進行中，如下：

(1)室內泥作已施作至4F約 70%，外牆泥作粉刷工程亦於屋突層施作中約 30%。

(2)外牆防水工程已完成約 90%。

(3)油漆工作亦配合牆面粉光完成部分進行中

(4)鋁門窗亦進場安裝、嵌縫完成約 95%。

(5)木作-固定家具已先行於協力廠商工廠加工進行中，部分完成之半成品業已運抵工地暫置。

(二)機電—各工作面皆同步進行中，如下：

(1)水電B1F~RF配線、廁所吊管等工作已配合陸續進行施作完成 50%。

(2)消防、空調—設備已陸續進場安裝施作完成約 70%。

(3)弱電工程業已配合佈線施作中。

(4)發電機設備-預計115/6/5進行廠驗後可進場。

(5)配電盤設備-預計115/6/11進行廠驗後可進場。


2、整體工程部分：

(一)後續配合裝修工程提送材料廠商資料、設備廠商廠驗工作、分項施工計畫等前置作業，並加速辦理合理之工期展延，經業主同意後進行整體施工預定進度網圖修正，以符實際。本公司將於後續可用工程期限內秉持如質如實的態度努力完成工作，亦請體諒因配合室裝工項，進行多次修改檢討施工圖，造成人力、工時等耗費，期望後續作業能協助排除送審作業耗時及影響施工進度之期程，圓滿完成本案。

(二)景觀工程配合五大管線連結至基地外，並期望先行向主管機關申請外管銜接事宜，力求使用執照取得後可儘速送水、送電與網路系統接通等事務，使得實質使用期程縮短。

(三)持續檢討可工廠預作項目(如系統家具櫥櫃)盡速辦理，現場採多工項分層分區施工。

土建工程-R2F結構施工(115/01/07)混凝土澆置粉光

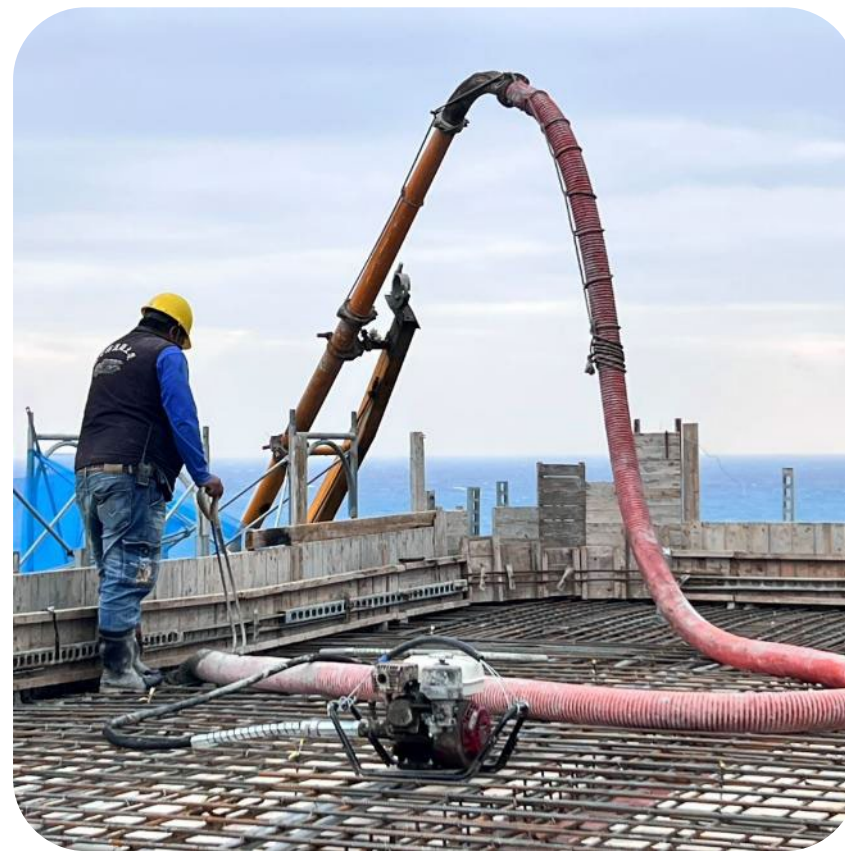

土建工程-泥作施作情形



115/3/5-3F 東側牆



115/3/12-1F 北側牆



115/3/20-2F 東側牆



115/3/21-3F 南側內牆



115/4/12-1F 東側內牆



115/4/6-1F 南側鋁窗嵌縫

土建工程-泥作施作情形



115/1/30-B1F戶外庭園



115/4/27-RF西側外牆



115/4/27-RF東側外牆



115/3/30-3F OT挑空區牆面



115/4/27-3F室內牆面



115/4/27-2F室內牆面

土建工程-鋁門窗施作情形



115/4/27-B1F北側



115/4/27-1F北側



115/4/27-2F南側



115/4/27-3F南側



115/4/27-4F北側




115/4/21-RF南側

土建工程-防水工程施工情形




115/3/23-RF

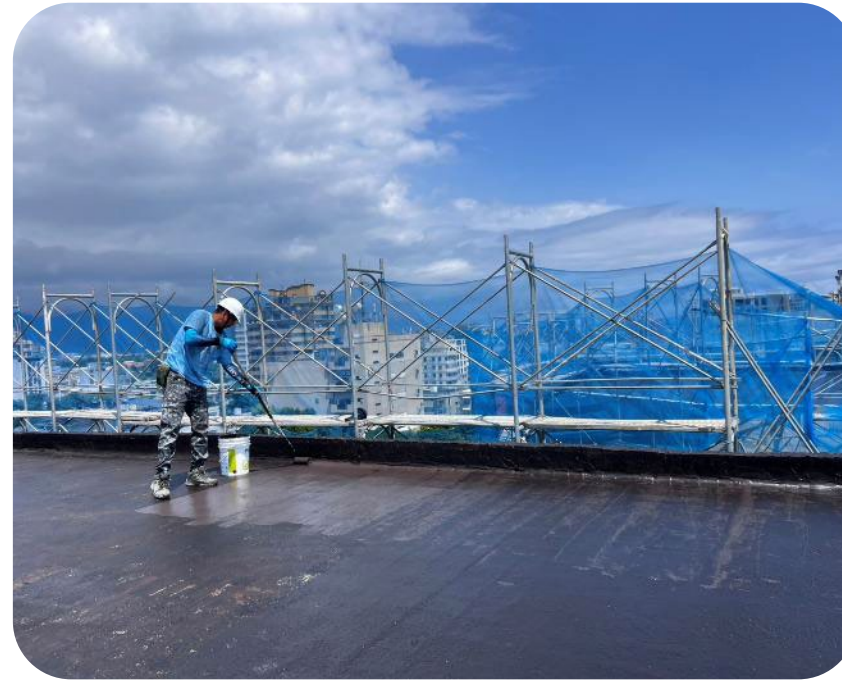

115/3/24-RF




115/1/28-4F南側

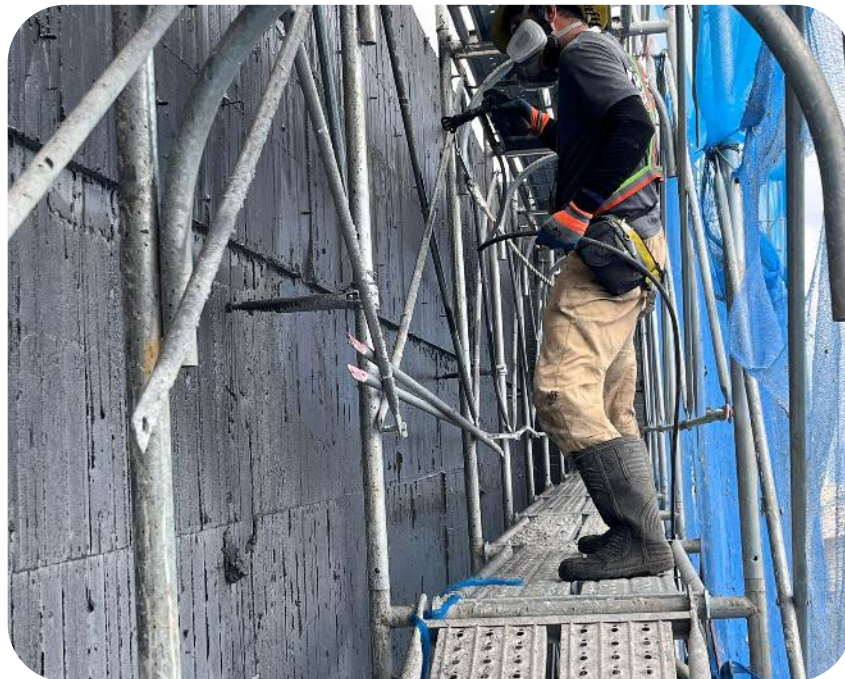

115/3/27-3F北側



115/2/4-2F南側抗裂纖維網

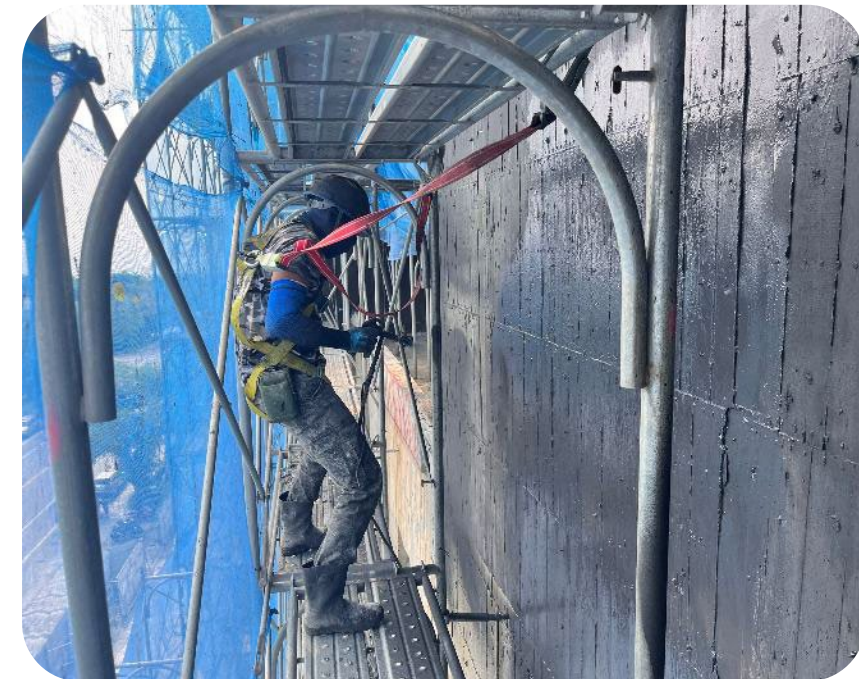

115/4/16-4F北側

土建工程-室裝工程施工情形



115/4/27-4F縱谷書牆



115/4/27-4F縱谷書牆



115/4/27-3F多功能展演空間



115/4/27-2F OT書牆




115/4/27-1F 東側電梯牆



115/4/27-B1F


機電工程-施作情形

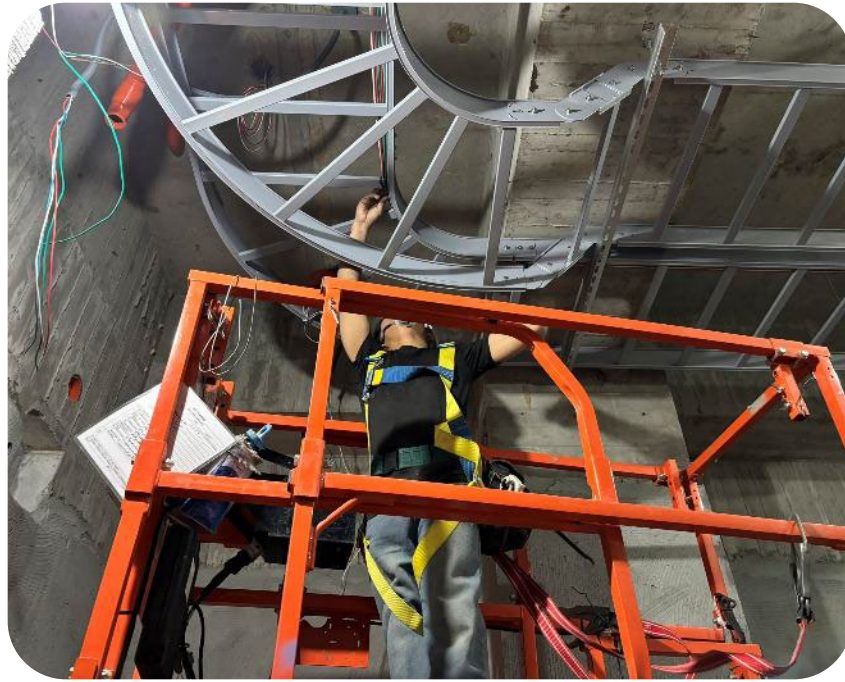


115/4/2-2F 線槽管架組裝



115/4/6-4F 管道間配管

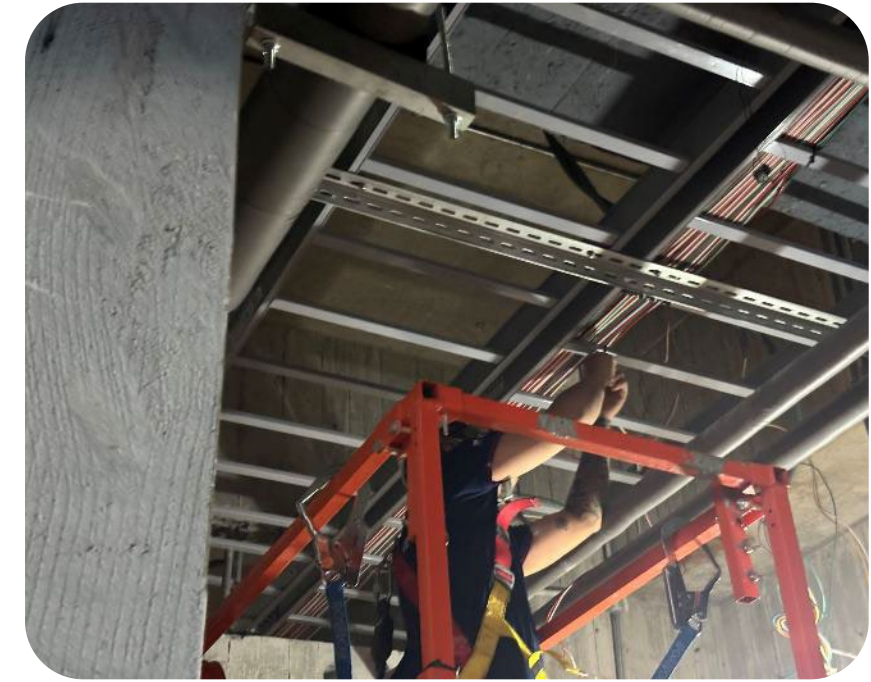

115/4/6-2F 配線

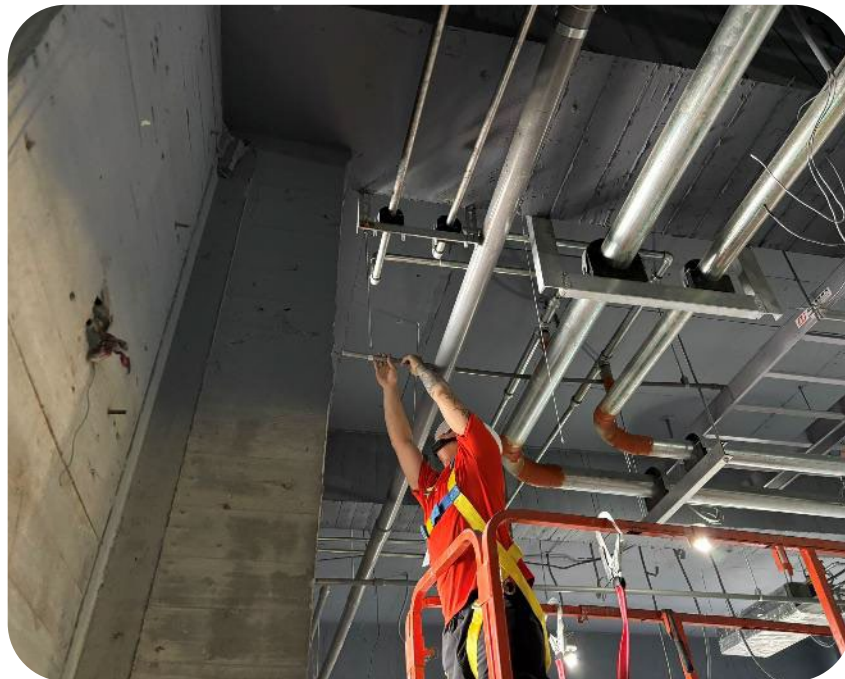

115/4/20-3F 吊管施作



115/4/20-4F配線



115/4/21-2F空調排水配管

消防、空調工程-施作情形



115/4/27-4F現況



115/4/27-3F現況



115/4/27-2F現況



115/4/27-1F現況



115/4/27-1F現況



115/4/27-B1F現況

職安衛、環境保護作業



115/4/15-第26次協議組織



115/4/2-道路沖洗



115/3/17-工區環境清潔



115/4/27-原工務所拆除情形



115/4/26-文苑路夜間警示



115/4/26-民權路夜間警示

各項工程文件審查情形、 監造所見問題與未來半年 監造執行重點

葉山銘建築師事務所-專案管理
梁貞誠建築師事務所-監造

一、契約應辦事項說明

花蓮縣新建圖書館工程案						
統包廠商設計及施工階段工作項目						
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	廠商提報日	有無逾期	進度說明
1	工作執行計畫書	決標次日起20日內提送「統包工程工作執行計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
2	工作執行計畫書(核定後修正一版)			112.07.20	無逾期	機關同意備查
3	初步設計計畫書	決標次日起20日內提送「初步設計計畫書」	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
4	統包工程BIM工作執行計畫書	統包廠商於決標次日【20日】內，必須提送BIM之構想及相關資料。提出本案之「統包工程BIM工作執行計畫書」(1式10份，含光碟)	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
5	實施簽證執行計畫書	廠商須於簽約後 20 日內 由機關於招標時載明 提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。	111.10.31	111.10.31	無逾期	機關同意備查
6	地質鑽探及試驗工作計畫書		-	111.12.29	無逾期	機關同意備查
7	拆除計畫	統包商應按契約規定於工作執行計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報拆除計畫。	112.01.12	112.01.12	無逾期	機關同意備查
8	基本設計報告書及圖冊/ BIM基本設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報「基本設計報告書及圖冊」。統包商應於提送基本設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料	112.02.15	112.02.15	無逾期	機關同意備查


一、契約應辦事項說明

花蓮縣新建圖書館工程案						
統包廠商設計及施工階段工作項目						
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	廠商提報日	有無逾期	進度說明
9	細部設計報告書及圖冊/ BIM細部設計報告書及模型檔	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	112.08.05	112.07.24		機關同意備查
10	BIM細部設計報告書及模型檔第二階段	統包商應按契約規定於工作執行計畫書及初步設計計畫書核定後次日起依據核定在案工作執行計畫書內提報期程天數提報「細部設計報告書及圖冊」。統包商應於提送細部設計書圖同時，必須提送BIM之構想及相關資料。	112.08.15	112.08.15	無逾期	機關同意備查
11	樹木移植計畫書			112.02.06	無逾期	機關同意備查
12	地質鑽探及試驗地基調查報告書			112.03.02	無逾期	機關同意備查
13	拆除工程分項施工計畫書	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.1	112.08.01	112.05.24	無逾期	機關同意備查
14	建造執照申辦	依據核定工作執行計畫書進修版於112.8.23	112.08.23	112.06.27	無逾期	已於112.10.16取得




二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案														
分項施工計畫預定送審時程表(土建)														
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明	
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	機關回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形		
1	整體施工計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送	113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29	113.01.31	113.02.01				113.02.06		
			(113)巨圖字第 2203-011203號	貞誠公(花圖)字第 1130119001號	(113)巨圖字第 2203-012203號	貞誠公(花圖)字第 1130129003號	(113)巨圖字第 2203-013101號	貞誠公(花圖)字第 1130201001號					蓮文行字第 1130001338號	
			審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定					核定	
2	整體品質計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送	113.01.12	113.01.09	113.01.22	113.01.29						113.02.06		
			(113)巨圖字第 2203-011204號	貞誠公(花圖)字第 1130109002號	(113)巨圖字第 2203-012203號	貞誠公(花圖)字第 1130129001號							蓮文行字第 1130001338號	
			審查中	檢退	審查中	同意核定							核定	
3	職業安全衛生管理計畫書	統包商應按契約規定於第一階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送	113.01.12	113.01.19	113.01.22	113.01.29						113.02.06		
			(113)巨圖字第 2203-011205號	貞誠公(花圖)字第 1130119003號	(113)巨圖字第 2203-012202號	貞誠公(花圖)字第 1130129002號							蓮文行字第 1130001338號	
			審查中	檢退	審查中	同意核定							核定	
4	土方開挖工程分項施工計畫書	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.01.22	113.01.29	113.02.05	113.02.07						113.03.06		
			(113)巨圖字第 2203-012204號	貞誠公(花圖)字第 1130129004號	(113)巨圖字第 2203-020501號	貞誠公(花圖)字第 1130207002號							蓮文行字第 1130001731號	
			審查中	檢退	審查中	同意核定							同意備查	
5	鋼筋工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.03.04	113.03.07	113.03.11	113.03.12						113.04.02		
			(113)巨圖字第 2203-030401號	貞誠公(花圖)字第 1130307001號	(113)巨圖字第 2203-031101號	貞誠公(花圖)字第 1130312004號							蓮文行字第 1130002860號	
			審查中	檢退	審查中	同意核定							同意備查	
6	第一階段施工要徑圖及工程預定進度網圖	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.03.06	113.03.12	113.03.20	113.03.26						113.04.18		
			(113)巨圖字第 2203-030601號	貞誠公(花圖)字第 1130312001號	(113)聚圖字第 2203-032001號	貞誠公(花圖)字第 1130326003號							蓮文行字第 1130003458號	
			審查中	檢退	審查中	同意審定							同意核定	
7	混凝土澆置工程分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.03.07	113.03.12								113.04.02		
			(113)巨圖字第 2203-030701號	貞誠公(花圖)字第 1130312002號									蓮文行字第 1130002864號	
			審查中	同意核定									同意備查	

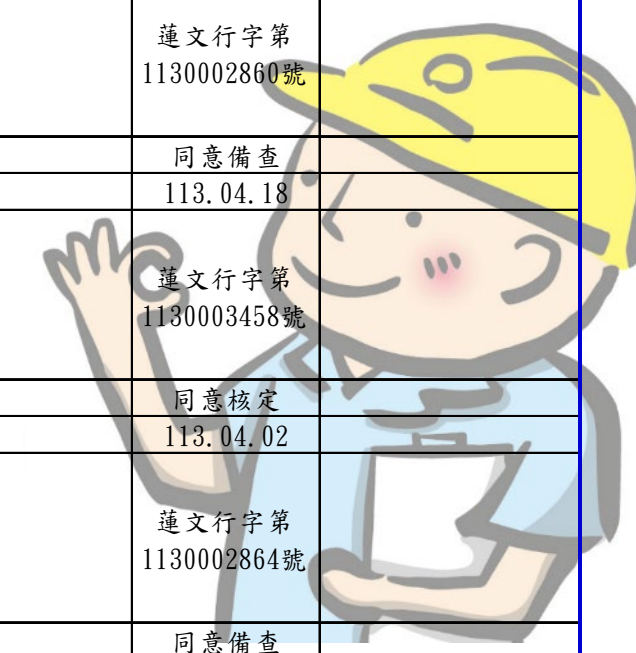

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案													
分項施工計畫預定送審時程表(土建)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
8	汛期工地 防災減災計畫 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.03.08	113.03.12							113.04.16	蓮文行字第 1130002863號 同意備查	
			(113)巨圖字第 2203-030801號	貞誠公(花圖)字 第1130312006號									
			審查中	同意核定									
9	交通安全維持 及管制計畫	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.03.25	113.03.27							113.04.02	蓮文行字第 1130003515號 同意備查	
			(113)聚圖字第 2203-032501號	貞誠公(花圖)字 第1130327001號									
			審查中	同意核定									
10	安全監測 分項施工計畫	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.03.28	113.03.29							113.04.16	蓮文行字第 1130003641號 同意備查	
			(113)聚圖字第 2203-032801號	貞誠公(花圖)字 第1130329002號									
			審查中	同意核定									
11	模板工程 分項施工計畫 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.04.11	113.04.12							113.04.16	蓮文行字第 1130004576號 同意備查	
			(113)聚圖字第 2203-041103號	貞誠公(花圖)字 第1130412001號									
			審查中	同意核定									
12	防水工程 分項施工計畫 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.04.12	113.04.15							113.04.18	蓮文行字第 1130004626號 同意備查	
			(113)聚圖字第 2203-041201號	貞誠公(花圖)字 第1130415003號									
			審查中	同意核定									
13	施工架工程 分項施工計畫 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.04.12	113.04.15							113.04.18	蓮文行字第 1130004627號 同意備查	
			(113)聚圖字第 2203-041202號	貞誠公(花圖)字 第1130415004號									
			審查中	同意核定									
14	臨時擋土設施 (鋼軌樁)暨邊坡 保護工程分項施 工計畫書 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.04.15	113.04.17							113.04.25	蓮文行字第 1130004724號 同意備查	
			(113)聚圖字第 2203-041501號	貞誠公(花圖)字 第1130417002號									
			審查中	同意核定									

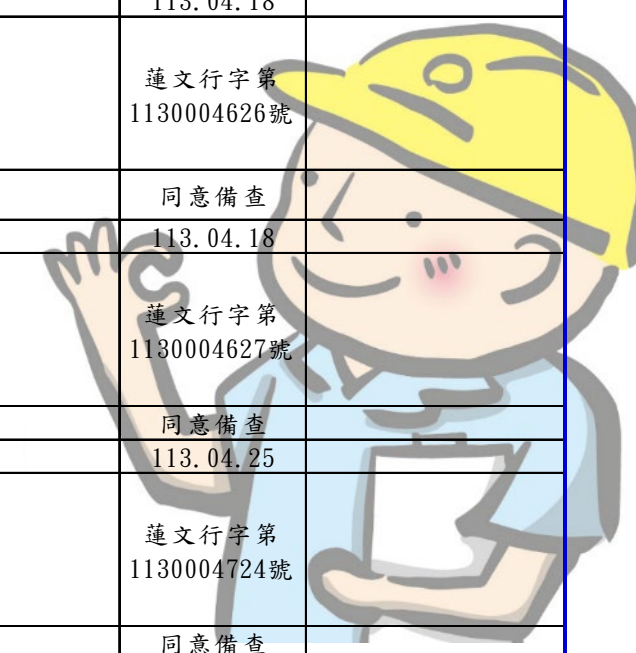

二、本案相關文件審查流程概述


花蓮縣新建圖書館工程案															
分項施工計畫預定送審時程表(土建)															
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號	進度說明		
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆				
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號				
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形				
15	泥作工程 分項施工計畫 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.05.28	113.05.28	113.06.03							113.07.23			
				(113)聚圖字第 2203-052801號	貞誠公(花圖)字 第1130603001號									蓮文行字第 1130006614號	
				審查中	同意核定									同意備查	
16	模板工程 結構計算書	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.05.28	113.05.28	113.06.03							113.07.23			
				(113)聚圖字第 2203-071002號	貞誠公(花圖)字 第1130716001號									蓮文行字第 1130008399號	
				審查中	同意核定									同意備查	
17	升降機設備分項 施工計畫	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.07.15	113.07.15	113.07.22							113.08.02			
				(113)聚圖字第 2203-071505號	貞誠公(花圖)字 第1130722001號									蓮文行字第 1130008611號	
				審查中	同意核定									同意備查	
18	整體施工計畫書 (細設二階進版)	第二階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送 (統包需求 P.23)	113.11.11	113.12.04	113.12.06	114.03.05	114.03.21	114.05.07	114.05.12			114.09.08			
				(113)聚圖字第 2203-120402號	貞誠公(花圖)字 第1131206005號	(114)聚圖字第 2203-030504號	貞誠公(花圖)字 第1140321001號	(114)聚圖字第 2203-050702號	貞誠公(花圖)字 第1140512001號					蓮文行字第 1140006256號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
19	整體品質計畫書 (細設二階進版)	第二階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送 (統包需求 P.23)	113.11.11	113.12.04	113.12.06	114.02.21	114.03.14	114.05.05	114.05.23			114.09.08			
				(113)聚圖字第 2203-120403號	貞誠公(花圖)字 第1131206006號	(114)聚圖字第 2203-022102號	貞誠公(花圖)字 第1140314001號	(113)聚圖字第 2203-050503號	貞誠公(花圖)字 第1140523001號					蓮文行字第 1140006256號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	
20	職業安全衛生管 理計畫書 (細設二階進版)	第二階段「細部設計報告書及圖冊」核定後次日起 30 日內提送 (統包需求 P.23)	113.11.11	113.12.04	113.12.06	114.02.27	114.03.17	114.06.02	114.06.06	114.06.17	114.06.19	114.09.08			
				(113)聚圖字第 2203-120404號	貞誠公(花圖)字 第1131206004號	(114)聚圖字第 2203-022703號	貞誠公(花圖)字 第1140317001號	(114)聚圖字第 2203-060203號	貞誠公(花圖)字 第1140606001號	(114)聚圖字第 2203-061704號	貞誠公(花圖)字 第1140619001號			蓮文行字第 1140006256號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定			同意備查	
21	細設三階施工 要徑圖及工程預 定進度綱圖	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	114.01.15	114.01.15	114.01.21										
				(114)聚圖字第 2203-011502號	貞誠公(花圖)字 第1140121001號										
				審查中	同意審定										

一、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案



分項施工計畫預定送審時程表(土建)

項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
22	施工架 強度搭設計算書	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.02.13	114.02.19	114.03.18	114.03.25					114.04.02	114.03.04
				(114)聚圖字第2203-021301號	貞誠公(花圖)字第1140219001號	(114)聚圖字第2203-031801號	貞誠公(花圖)字第1140325001號					蓮文行字第1140003118號	蓮文行字第1140001795號
				審查中	同意核定	審查中	同意核定					同意備查	檢退
23	泥作工程分項施工計畫 (第一版進版) (第三次修正)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.05.27	114.06.03	114.07.21	114.07.25	115.01.27	115.02.03	115.02.11	115.02.12		
				(114)聚圖字第2203-052701號	貞誠公(花圖)字第1140603001號	(114)聚圖字第2203-072102號	貞誠公(花圖)字第1140725002號	(115)聚圖字第2203-012701號	貞誠公(花圖)字第1150203002號	(115)聚圖字第2203-021101號	貞誠公(花圖)字第1150212004號		
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意核定		
24	乳膠漆及仿石質塗料 工程分項施工計畫 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.05.27	114.06.02								
				(114)聚圖字第2203-052702號	貞誠公(花圖)字第1140602002號								
				審查中	檢退								
25	門窗工程分項施工計畫 (第一版) (第一次修正)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.01.27	115.02.04	115.02.11	115.02.12						
				(115)聚圖字第2203-012702號	貞誠公(花圖)字第115020403號	(115)聚圖字第2203-021102號	貞誠公(花圖)字第1150212005號						
				審查中	檢退	審查中	同意核定						



二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案													
分項施工計畫預定送審時程表(機電)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
1	接地工程分項施工計畫書	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.01.26	113.02.02							113.03.08	
				(113)巨圖字第 2203-012601號	貞誠公(花圖)字第 1130202001號							蓮文行字第 1130001541	
				審查中	同意核定							同意備查	
2	電氣設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.19	113.12.27					114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120201號	貞誠公(花圖)字第 1131210004號	(113)聚圖字第 2203-121901號	貞誠公(花圖)字第 1131227001號					蓮文行字第 1140000076號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					原則同意	
3	弱電設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.18	113.12.26					114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120202號	貞誠公(花圖)字第 1131210001號	(113)聚圖字第 2203-121802號	貞誠公(花圖)字第 1140126003號					蓮文行字第 1140000076號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					原則同意	
4	給排水設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.19	114.01.02					114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120203號	貞誠公(花圖)字第 1131210003號	(113)聚圖字第 2203-121903號	貞誠公(花圖)字第 1140102002號					蓮文行字第 1140000076號	
				審查中	同意核定	審查中	同意核定					原則同意	
5	消防設備(管線、配件)分項施工計畫(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.02	113.12.10	113.12.19	114.01.02					114.02.10	
				(113)聚圖字第 2203-120204號	貞誠公(花圖)字第 1131210002號	(113)聚圖字第 2203-121902號	貞誠公(花圖)字第 1140102001號					蓮文行字第 1140000076號	
				審查中	檢退	審查中	同意核定					同意備查	

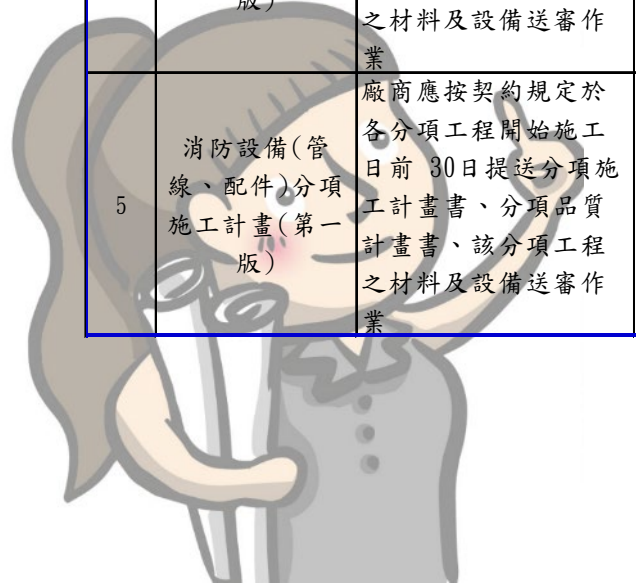

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館工程案														
分項施工計畫預定送審時程表(機電)														
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明	
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	機關回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形		
6	電氣設備 (管線、配件)分 項施工計畫(修 正二版)	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項施 工計畫書、分項品質 計畫書、該分項工程 之材料及設備送審作 業		114.05.05	114.05.22							114.06.27		
				(114)聚圖字第 2203-050504號	貞誠公(花圖)字 第1140522004號									蓮文行字第 1140005400號
				審查中	同意核定							同意備查		
7	弱電設備 (管線、配件)分 項施工計畫(修 正二版)	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項施 工計畫書、分項品質 計畫書、該分項工程 之材料及設備送審作 業		114.05.05	114.05.22							114.06.27		
				(114)聚圖字第 2203-050506號	貞誠公(花圖)字 第1140522002號									蓮文行字第 1140005398號
				審查中	同意核定							同意備查		
8	給排水設備(管 線、配件)分項 施工計畫(修正 二版)	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項施 工計畫書、分項品質 計畫書、該分項工程 之材料及設備送審作 業		114.05.07	114.05.22							114.06.27		
				(114)聚圖字第 2203-050701號	貞誠公(花圖)字 第1140522003號									蓮文行字第 1140005399號
				審查中	同意核定							同意備查		
9	消防設備 (管線、配件)分 項施工計畫(修 正二版)	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項施 工計畫書、分項品質 計畫書、該分項工程 之材料及設備送審作 業		114.05.20	114.06.03							114.06.27		
				(113)聚圖字第 2203-052001號	貞誠公(花圖)字 第1140603002號									蓮文行字第 1140005800號
				審查中	同意核定							同意備查		
10	空調設備及配管 工程分項施工計 畫書 (第一版) (第一次修正)	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項施 工計畫書、分項品質 計畫書、該分項工程 之材料及設備送審作 業		114.11.04	114.11.20	115.03.10	115.03.16							
				(113)聚圖字第 2203-110402號	貞誠公(花圖)字 第1141120001號	(113)聚圖字第 2203-031001號	貞誠公(花圖)字 第1150316003號							
				審查中	檢退	審查中	同意審定							

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案													
設備材料送審管制表(土建)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
1	混凝土	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.11.30	112.11.24	112.11.29	112.12.29	113.01.03	113.01.05	113.01.08			113.01.19	蓮文行字第 1130000323號
				(112)巨圖字第 2203-112401號	貞誠公(花圖)字 第1121129002號	(112)巨圖字第 2203-122905號	貞誠公(花圖)字 第1130103001號	(113)巨圖字第 2203-010501號	貞誠公(花圖)字 第1130108001號				
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	審定			核定	
2	工程材料 實驗室世昌	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.11.30	112.11.24	112.11.29							112.12.14	蓮文行字第 1120013176號
				(112)巨圖字第 2203-112402號	貞誠公(花圖)字 第1121129003號								
				審查中	同意審定							核定	
3	工程材料 實驗室佳暉	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.12.29	112.12.29	113.01.03							113.01.08	蓮文行字第 1130000079號
				(112)巨圖字第 2203-122902號	貞誠公(花圖)字 第1130103002號								
				審查中	同意審定							核定	
4	工程材料 實驗室今塘	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.12.29	112.12.29	113.01.03							113.01.08	蓮文行字第 1130000080號
				(112)巨圖字第 2203-122901號	貞誠公(花圖)字 第1130103003號								
				審查中	同意審定							核定	
5	工程告示牌	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.12.29	112.12.19	112.12.20							112.12.22	蓮文行字第 1120014165號
				(112)巨圖字第 2203-121901號	貞誠公(花圖)字 第1121220002號								
				審查中	同意核定							同意備查	
6	鋼筋-旭悅	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.12.29	112.12.29	113.01.04							113.01.08	蓮文行字第 1130000197號
				(112)巨圖字第 2203-122903號	貞誠公(花圖)字 第1130104001號								
				審查中	同意審定							核定	
7	鋼筋-東和	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.12.29	112.12.29	113.01.04							113.01.08	蓮文行字第 1130000198號
				(112)巨圖字第 2203-122904號	貞誠公(花圖)字 第1130104002號								
				審查中	同意審定							核定	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案														
設備材料送審管制表(土建)														
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度說明	
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆			
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號			
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形			
8	鋼筋續接器 旭悅	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.12.29	112.12.29	113.01.04							113.01.08	蓮文行字第 113000199號 核定	
				(112)巨圖字第 2203-122907號	貞誠公(花圖)字 第1130104003號									
				審查中	同意審定									
9	鋼管施工架	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.12.29	113.04.12	113.04.15							113.04.18	蓮文行字第 1130004628號 核定	
				(113)聚圖字第 2203-041203號	貞誠公(花圖)字 第1130415005號									
				審查中	同意審定									
10	防水材(1) 岳峰精密化學股 份有 限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	112.12.29	113.04.26	113.04.29	113.05.09	113.05.14	113.05.24	113.05.30			113.07.26	蓮文行字第 1130007537號 檢退	
				(113)聚圖字第 2203-042602號	貞誠公(花圖)字 第1130429002號	(113)聚圖字第 2203-050901號	貞誠公(花圖)字 第1130514001號	(113)聚圖字第 2203-052402號	貞誠公(花圖)字 第1130530002號					
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	檢退					
11	鋼筋-旭悅	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.06.06	113.06.11							113.07.12	蓮文行字第 1130006914號 核定	
				(113)聚圖字第 2203-060601號	貞誠公(花圖)字 第1130611001號									
				審查中	同意審定									
12	乳膠漆	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.06.11	113.06.17								待細部設計第二 階段審核後再行 提送	
				(113)聚圖字第 2203-061101號	貞誠公(花圖)字 第1130617003號									
				審查中	檢退									
13	仿石質複層塗料 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.06.11	113.07.17								待細部設計第二 階段審核後再行 提送	
				(113)聚圖字第 2203-061102號	貞誠公(花圖)字 第1130717004號									
				審查中	檢退									
14	鍍鋅隔柵蓋板 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.06.21	113.06.24							113.07.23	蓮文行字第 1130008481號 核定	
				(113)聚圖字第 2203-062101號	貞誠公(花圖)字 第1130624001號									
				審查中	同意審定									

二、本案相關文件審查流程概述


花蓮縣新建圖書館統包工程案														
設備材料送審管制表(土建)														
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度說明	
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆			
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號			
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形			
15	防水材 (二)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.07.05	113.07.12	113.07.15	113.07.16						113.08.01	蓮文行字第 1130008398號 核定	
			(113)聚圖字第 2203-070501號	貞誠公(花圖)字 第1130712010號	(113)聚圖字第 2203-071501號	貞誠公(花圖)字 第1130716002號								
			審查中	檢退	審查中	同意審定								
16	20x20 白色磁磚	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.07.10	113.07.11								113.07.23	蓮文行字第 1130008220號 核定	
			(113)聚圖字第 2203-071001號	貞誠公(花圖)字 第1130711004號										
			審查中	同意審定										
17	升降機設備	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.08.20	113.08.23	113.09.27	113.10.09	113.11.04	113.11.06				113.11.27	蓮文行字第 1130014806號 核定	
			(113)聚圖字第 2203-082001號	貞誠公(花圖)字 第1130823003號	(113)聚圖字第 2203-092701號	貞誠公(花圖)字 第1131009003號	(113)聚圖字第 2203-110404號	貞誠公(花圖)字 第1131106001號						
			審查中	檢退	審查中	同意審定	審查中	同意審定						
18	金屬門 (防火門、防火 百葉、防水開 門)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.09.03	113.09.18	113.09.26	113.10.09						113.10.18	蓮文行字第 1130013631號 檢退	
			(113)聚圖字第 2203-090303號	貞誠公(花圖)字 第1130918002號	(113)聚圖字第 2203-092601號	貞誠公(花圖)字 第1131009002號								
			審查中	檢退	審查中	同意審定								
19	鋁門窗	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.09.13	113.09.20								113.10.07	蓮文行字第 1130012944號 核定	
			(113)聚圖字第 2203-091301號	貞誠公(花圖)字 第1130920002號										
			審查中	同意審定										
20	鋼筋-旭悅 (協勝發、新寶 元)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.10.25	113.11.01	113.11.04	113.11.06						113.11.12	蓮文行字第 1130014806號 核定	
			(113)聚圖字第 2203-102501號	貞誠公(花圖)字 第1131101001號	(113)聚圖字第 2203-110403號	貞誠公(花圖)字 第1131106002號								
			審查中	檢退	審查中	同意審定								
21	植筋膠	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.11.28	113.12.05	113.12.19	113.12.27						114.01.16	蓮文行字第 1130017218號 核定	
			(113)聚圖字第 2203-112802號	貞誠公(花圖)字 第1131205001號	(113)聚圖字第 2203-121904號	貞誠公(花圖)字 第1131227002號								
			審查中	檢退	審查中	同意審定								

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案														
設備材料送審管制表(土建)														
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明	
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	機關回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形		
22	人孔蓋(鑄鐵)- 堅正金屬企業股 份有限公司	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項 施工計畫書、分項品 質計畫書、該分項工 程之材料及設備送審 作業		114.02.17	114.02.25	114.03.05	114.03.14	114.05.20	114.05.27			114.06.27	蓮文行字第 1140005571號	核定
				(114)聚圖字第 2203-021702號	貞誠公(花圖)字 第1140225002號	(114)聚圖字第 2203-030503號	貞誠公(花圖)字 第1140314002號	(114)聚圖字第 2203-052002號	貞誠公(花圖)字 第1140527001號					
				審查中	檢退	審查中	同意審定	審查中	同意審定					
23	外牆塗料(仿石 質複層塗料)-創 新科技塗料有限 公司 (第一版) (第二次修正)	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項 施工計畫書、分項品 質計畫書、該分項工 程之材料及設備送審 作業		114.06.04	114.06.12	114.06.19	114.06.25	115.03.16	115.03.27					
				(114)聚圖字第 2203-060401號	貞誠公(花圖)字 第1140612004號	(114)聚圖字第 2203-061901號	貞誠公(花圖)字 第1140625003號	(114)聚圖字第 2203-031601號	山銘公(花圖)字 第1150327001號					
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意審定					
24	防水工程材料 (進版) 岳峰精密化學股 份有限公司	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項 施工計畫書、分項品 質計畫書、該分項工 程之材料及設備送審 作業		114.06.11	114.06.20	114.08.14	114.08.21					114.09.08	蓮文行字第 1140009854號	核定
				(114)聚圖字第 2203-061101號	貞誠公(花圖)字 第1140620001號	(114)聚圖字第 2203-081402號	貞誠公(花圖)字 第1140821001號							
				審查中	檢退	審查中	同意審定							
25	電梯設備選色選 樣	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項 施工計畫書、分項品 質計畫書、該分項工 程之材料及設備送審 作業		114.07.02	114.07.04							114.08.21	蓮文行字第 1140007903號	核定
				(114)聚圖字第 2203-070102號	貞誠公(花圖)字 第1140704001號									
				審查中	同意審定									
26	水性水泥漆(乳 膠漆)第一版	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項 施工計畫書、分項品 質計畫書、該分項工 程之材料及設備送審 作業		114.07.23	114.08.04							114.09.08	蓮文行字第 1140009140號	核定
				(114)聚圖字第 2203-072301號	貞誠公(花圖)字 第1140804003號									
				審查中	同意審定									
27	鋼窗、鋼門扇及 門樑(防火 門)(第一版)	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項 施工計畫書、分項品 質計畫書、該分項工 程之材料及設備送審 作業		114.11.03	114.11.14	114.12.05	114.12.10							
				(114)聚圖字第 2203-110302號	貞誠公(花圖)字 第1141114001號	(114)聚圖字第 2203-120501號	貞誠公(花圖)字 第1141210002號							
				審查中	檢退	審查中	同意審定							
28	鐵捲門、防洪開 及水密門(防火 捲門、防水開 門)(第一版)	廠商應按契約規定於 各分項工程開始施工 日前 30日提送分項 施工計畫書、分項品 質計畫書、該分項工 程之材料及設備送審 作業		114.12.01	114.12.08									
				(114)聚圖字第 2203-120104號	貞誠公(花圖)字 第1141208001號									
				審查中	同意審定									



二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案													
設備材料送審管制表(土建)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
29	觀眾座椅(折疊式及可推疊式)-台裕國際股份有限公司(第一版)(第一次修正)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.03.04	115.03.09	115.04.07	115.04.13						
				(114)聚圖字第 2203-030402號	貞誠公(花圖)字第 1150309002號	(114)聚圖字第 2203-040701號	梁備字第 1150413-1號						
				審查中	檢退	審查中	同意審查						
							山銘公(花圖)字第 1150414003號						
30	隔間及小室(輕隔間)-尚金室內裝修工程有限公司(第一版)(第一次修正)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.03.09	115.03.16	115.04.01	115.04.08						
				(114)聚圖字第 2203-030901號	貞誠公(花圖)字第 1150316001號	(114)聚圖字第 2203-040103號	梁備字第 1150408-1號						
				審查中	檢退	審查中	同意審查						
							山銘公(花圖)字第 1150409001號						
31	浴廁強化美耐板隔間(廁所搗擺)-尚金室內裝修工程有限公司(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.03.09	115.03.16								115.03.20 前重新提報
				(114)聚圖字第 2203-030902號	貞誠公(花圖)字第 1150316002號								
				審查中	檢退								
32	鋪地磚(止滑石英磚地坪、車道止滑磚、石英磚、無障礙指示磚)承耀企業有限公司(第一版)(第一次修正)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.03.30	115.04.09	115.04.14							
				(114)聚圖字第 2203-033001號	貞誠公(花圖)字第 1150409001號	(114)聚圖字第 2203-041405號							
				審查中	檢退	審查中							



二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案													
設備材料送審管制表(土建)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
33	玻璃材料-全美玻璃行(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.03.31	115.04.08								
				(114)聚圖字第 2203-033101號	梁備字第 1150408-3號 同意審查 115.04.09 山銘公(花圖)字第 1150409003號								
				審查中	同意審定								
34	指標系統-有壯工程有限公司(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.04.01	115.04.08								
				(114)聚圖字第 2203-040102號	梁備字第 1150408-2號 同意審查 115.04.09 山銘公(花圖)字第 1150409002號								
				審查中	同意審定								
35	天花板材料-尚金室內裝修工程有限公司(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.04.02	115.04.14							115.04.24 前重新提報	
				(114)聚圖字第 2203-040201號	貞誠公(花圖)字第 1150414001號								
36	地坪工程(塑膠地磚、地毯、木作地坪)(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前 30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.04.10	115.04.21								
				(114)聚圖字第 2203-041001號	貞誠公(花圖)字第 1150421001號								
				審查中	檢退								



二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案													
設備材料送審管制表(機電)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
1	接地銅棒	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.01.05	113.01.05	113.01.10							113.01.25	機關已核定
				(113)巨圖字第2203-010502號	貞誠公(花圖)字第1130110004號							蓮文行字第1130000436號	
				審查中	同意審定							核定	
2	接地銅棒(第一版第一次修正)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業	113.01.05	113.03.22	113.03.26	113.03.28	113.04.02					113.04.16	機關已核定
				(113)聚圖字第2203-032201號	貞誠公(花圖)字第1130326002號	(113)聚圖字第2203-032802號	貞誠公(花圖)字第1130402002號					蓮文行字第1130003773號	
				審查中	退回	審查中	同意審定					核定	
3	接地系統 避雷設施	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.03.22	113.03.26	113.03.28	113.04.02					113.04.16	機關已核定
				(113)聚圖字第2203-032202號	貞誠公(花圖)字第1130326002號	(113)聚圖字第2203-032802號	貞誠公(花圖)字第1130402002號					蓮文行字第1130003773號	
				審查中	退回	審查中	同意審定					核定	
4	PVC-U管 (一)-紳麒企業有限公司經銷之南亞塑膠工業有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.05.31	113.06.04							113.07.29	機關已核定
				(113)聚圖字第2203-053101號	貞誠公(花圖)字第1130604002號							蓮文行字第1130006681號	
				審查中	同意審定							核定	
5	PVC-U管 -百晨企業有限公司及使特靈衛材有限公司經銷之南亞塑膠工業有限公司材料 PVC塑膠管銷售業務資料(補充)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.08.01	113.08.02							113.08.13	機關已核定
				(113)聚圖字第2203-080103號	貞誠公(花圖)字第1130802004號							蓮文行字第1130009106號	
				審查中	同意審定							核定	
5-1	PVC-U管 -峻鴻水電材料行銷之南亞塑膠工業有限公司材料 PVC塑膠管銷售業務資料(補充)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.10.23	114.10.27							114.12.05	機關已核定
				(113)聚圖字第2203-102301號	貞誠公(花圖)字第1141027002號							蓮文行字第1140012540號	
				審查中	同意審定							核定	
6	管線 (EMT管、消防用管)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.09.03	113.09.05	113.09.03	113.09.11					113.10.08	機關已核定
				(113)聚圖字第2203-090304號	貞誠公(花圖)字第1130905001號	(113)聚圖字第2203-090304號	貞誠公(花圖)字第1130911001號					蓮文行字第1130012630號	
				審查中	檢退	審查中	同意審定					核定	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案														
設備材料送審管制表(機電)														
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度說明	
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆			
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號			
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形			
7	給水管 (不鏽鋼管、被覆材)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.09.09	113.09.11							113.10.08	機關已核定	
				(113)聚圖字第2203-090901號	貞誠公(花圖)字第1130911002號									蓮文行字第1130012631號
				審查中	同意審定									核定
8	空調設備 東元機電股份有限公司資料	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		113.12.23	114.01.10	114.02.17	114.02.27						空調設備(東元)經開會討論已變更為(日立)	
				(113)聚圖字第2203-122301號	貞誠公(花圖)字第1140110001號	(114)聚圖字第2203-021701號	貞誠公(花圖)字第1140227002號							
				審查中	檢退	審查中	檢退							
8-1	空調設備 (台灣日立) 江森自控股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.06.11	114.06.19	114.07.09	114.07.14					114.09.08	蓮文行字第1140008270號	
				(114)聚圖字第2203-061102號	貞誠公(花圖)字第1140619003號	(114)聚圖字第2203-070901號	貞誠公(花圖)字第1140714001號							
				審查中	檢退	審查中	檢退	同意審定 114.09.10						
8-2	空調設備 (台灣日立) 台灣博世舒適股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業						115.01.16	115.01.22					
							(115)聚圖字第2203-011603號	貞誠公(花圖)字第1150122003號	審查中	同意審定				
9	電線及電纜-宏泰 (聚氣乙烯絕緣電線、裸硬銅絞電線、XLPE、耐熱電覽、耐熱電覽)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.03.13	114.04.18	114.04.23	114.05.02					114.07.09	機關已核定	
				(114)聚圖字第2203-031302號	貞誠公(花圖)字第1140418004號	(114)聚圖字第2203-042301號	貞誠公(花圖)字第1140502002號							蓮文行字第1140004569號
				審查中	檢退	審查中	同意審定							核定
10	配電盤 旻震企業有限公司/元旭機電有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.03.17	114.04.09	114.08.18	114.08.25	114.09.11	114.09.17					
				(114)聚圖字第2203-031702號	貞誠公(花圖)字第1140409002號	(114)聚圖字第2203-081801號	貞誠公(花圖)字第1140825003號	(114)聚圖字第2203-091103號	貞誠公(花圖)字第1140917001號					
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	檢退					

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案													
設備材料送審管制表(機電)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	機關回覆	
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	審查文號	
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	審查情形	
10	配電盤 日富金屬工業有限公司(第一版)(第四次修正)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.01.02	115.01.09	115.01.30	115.02.05						
				(115)聚圖字第2203-010202號	貞誠公(花圖)字第1150109002號	(114)聚圖字第2203-013004號	貞誠公(花圖)字第1150205001號						
				審查中	檢退	審查中	同意審定						
11	泵浦-1 宏旭泵浦企業股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.03.19	114.04.07								已更換廠商 (川源股份有限公司)
				(114)聚圖字第2203-031901號	貞誠公(花圖)字第1140407002號								
				審查中	檢退								
11-1	泵浦-2 川源股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.07.29	114.08.12	114.08.21	114.09.03					114.11.06	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-072901號	貞誠公(花圖)字第1140812002號	(114)聚圖字第2203-082105號	貞誠公(花圖)字第1140903005號						
				審查中	檢退	審查中	同意審定					核定	
11-2	泵浦-3 宏奇泵浦工業股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.08.06	114.08.12	114.08.21	114.09.03						114.09.18前重新提報
				(114)聚圖字第2203-080601號	貞誠公(花圖)字第1140812002號	(114)聚圖字第2203-082106號	貞誠公(花圖)字第1140903006號						
				審查中	檢退	審查中	檢退						
11-3	泵浦-3 經濟實業股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.01.02	115.01.05	115.01.16	115.01.21						
				(115)聚圖字第2203-010201號	貞誠公(花圖)字第1150109001號	(115)聚圖字第2203-011601號	貞誠公(花圖)字第1150121001號						
				審查中	檢退	審查中	同意審定						
12	電線及電纜 大亞電線電纜股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.04.14	114.05.21							114.07.09	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-041402號	貞誠公(花圖)字第1140521001號								
				審查中	同意審定							核定	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案													
設備材料送審管制表(機電)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號 審查情形	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
13	柴油引擎發電機耀昌機電有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.04.25	114.05.08	114.06.17	114.06.25						已更換廠商 (祐旭有限公司)
				(114)聚圖字第2203-042501號	貞誠公(花圖)字第1140508003號	(114)聚圖字第2203-061703號	貞誠公(花圖)字第1140625002號						
				審查中	檢退	審查中	檢退						
13-1	柴油引擎發電機組-祐旭有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.07.21	114.7.30							114.11.06	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-072101號	貞誠公(花圖)字第1140730001號							蓮文行字第1140008925號	
				審查中	同意審定							核定	
13-2	柴油引擎發電機組-中興電工機械有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.11.06	114.11.21								
				(114)聚圖字第2203-110601號	貞誠公(花圖)字第1141121002號								
				審查中	同意審定								
13-2	柴油引擎發電機組-經濟股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.12.24	114.12.31								
				(114)聚圖字第2203-122402號	貞誠公(花圖)字第1141231001號								
				審查中	同意審定								
14	空調材料 (管類、電線類、閥類)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.05.15	114.05.23	114.06.11	114.06.20	114.08.07	114.08.15	114.08.19	114.08.25	114.11.06	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-051501號	貞誠公(花圖)字第1140523002號	(114)聚圖字第2203-061104號	貞誠公(花圖)字第1140620002號	(114)聚圖字第2203-080702號	貞誠公(花圖)字第1140815001號	(114)聚圖字第2203-081901號	貞誠公(花圖)字第1140825005號	蓮文行字第1140009952號	
				審查中	檢退不予審查	審查中	檢退不予審查	審查中	檢退	審查中	同意審定	核定	
15	空調材料 (風管類)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.05.15	114.05.23	114.08.08	114.08.20	114.09.04	114.09.12			114.10.17	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-051502號	貞誠公(花圖)字第1140523002號	(114)聚圖字第2203-080801號	貞誠公(花圖)字第1140820001號	(114)聚圖字第2203-090401號	貞誠公(花圖)字第1140912001號			蓮文行字第1140010816號	
				審查中	檢退不予審查	審查中	檢退	審查中	同意審定			核定	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案													
設備材料送審管制表(機電)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
16	空調材料 (配電盤)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.05.15	114.05.23	114.08.08	114.08.15					114.10.17	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-051503號	貞誠公(花圖)字第1140523002號	(114)聚圖字第2203-080802號	貞誠公(花圖)字第1140815002號					蓮文行字第1140009646號	
				審查中	檢退不予審查	審查中	同意審定					核定	
17	空調材料 (自動控制) 明立科技股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.05.20	114.05.28	114.06.11	114.06.24	114.08.07	114.08.14	114.08.21	114.09.03	114.11.06	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-052003號	貞誠公(花圖)字第1140528002號	(114)聚圖字第2203-061103號	貞誠公(花圖)字第1140624001號	(114)聚圖字第2203-080704號	貞誠公(花圖)字第1140814002號	(114)聚圖字第2203-082101號	貞誠公(花圖)字第1140903003號	蓮文行字第1140010434號	
				審查中	檢退不予審查	審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意審定	核定	
18	消防排煙設備(消防)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.06.17	114.06.25	114.06.26	114.07.08					114.11.07	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-061702號	貞誠公(花圖)字第1140625001號	(114)聚圖字第2203-062603號	貞誠公(花圖)字第1140708005號					蓮文行字第1140008031號	
				審查中	檢退	審查中	同意審定					核定	
19	鋁製電纜托架 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.07.30	114.08.06							114.10.18	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-073001號	貞誠公(花圖)字第1140806001號							蓮文行字第1140009217號	
				審查中	同意審定							核定	
20	消防材料設備 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.08.12	114.08.26	114.11.03	114.11.19						機關已核定
				(114)聚圖字第2203-081201號	貞誠公(花圖)字第1140826003號	(114)聚圖字第2203-110301號	貞誠公(花圖)字第1141119001號						
				審查中	檢退	審查中	同意審定						
21	消防材料(管類、電線類、閥類)(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.08.12	114.08.25	114.09.03	114.09.11	114.09.18	114.10.02			114.10.17	機關已核定
				(114)聚圖字第2203-081202號	貞誠公(花圖)字第1140825004號	(114)聚圖字第2203-090301號	貞誠公(花圖)字第1140911001號	(114)聚圖字第2203-091801號	貞誠公(花圖)字第1141002001號			蓮文行字第1140011645號	
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意審定			核定	

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案														
設備材料送審管制表(機電)														
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號	進度說明	
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆			
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號			
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形			
22	弱電工程材料 (第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.08.18	114.08.26	114.11.14	114.11.28	114.12.10	114.12.23	114.12.24	114.12.26			
				(114)聚圖字第2203-081802號	貞誠公(花圖)字第1140826004號	(114)聚圖字第2203-111402號	貞誠公(花圖)字第1141128001號	(114)聚圖字第2203-121002號	貞誠公(花圖)字第1141223003號	(114)聚圖字第2203-122403號	貞誠公(花圖)字第1141226001號			
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意審定			
23	自來水用鋼管(不鏽鋼管)材料(第一版)彰源企業股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.08.26	114.08.27							114.10.17		
				(114)聚圖字第2203-082602號	貞誠公(花圖)字第1140827002號									蓮文行字第1140010092號
				審查中	同意審定							核定		
24	塑膠管(PVC)材料(第一版)-華夏海灣塑膠股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.08.26	114.09.03							114.10.17		
				(114)聚圖字第2203-082603號	貞誠公(花圖)字第1140903004號									蓮文行字第1140014035號
				審查中	同意審定							核定		
25	離心式冰水機組及小型冷風機(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.08.27	114.09.04	114.09.22	114.10.02					114.11.06	機關已核定	
				(114)聚圖字第2203-082701號	貞誠公(花圖)字第1140904001號	(114)聚圖字第2203-092201號	貞誠公(花圖)字第1141002002號							蓮文行字第1140011646號
				審查中	檢退	審查中	同意審定					核定		
26	冷卻水塔膨脹水箱ET-1(第一版)良機實業股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.09.11	114.09.16	114.10.01	114.10.14	114.10.22	114.10.27			114.11.06	機關已核定	
				(114)聚圖字第2203-091104號	貞誠公(花圖)字第1140916001號	(114)聚圖字第2203-100101號	貞誠公(花圖)字第1141014004號	(114)聚圖字第2203-102201號	貞誠公(花圖)字第1141027001號					蓮文行字第1140012541號
				審查中	檢退	審查中	檢退	審查中	同意審定			核定		
27	空氣調節箱及小型送風機(第一版)-昶利空調工程股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		114.11.14	114.11.20	114.12.02	114.12.15							
				(114)聚圖字第2203-111401號	貞誠公(花圖)字第1141120002號	(114)聚圖字第2203-120201號	貞誠公(花圖)字第1141215001號							
				審查中	檢退	審查中	同意審定							

二、本案相關文件審查流程概述

花蓮縣新建圖書館統包工程案													
設備材料送審管制表(機電)													
項次	分項名稱	契約規定	提送時限	第一次		第二次		第三次		第四次		花蓮縣文化局 機關回覆 審查文號	進度說明
				提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆	提送日期	監造/專管回覆		
				送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號	送審文號	審查文號		
				辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形	辦理情形	審查情形		
28	消防設備(廣播主機)第一版-永揚消防安全設備股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.01.16	115.01.23								
				(115)聚圖字第2203-011602號	貞誠公(花圖)字第1150123001號								
				審查中	同意審定								
29	空調設備(熱泵節能型除濕機)第一版-台灣博世舒適股份有限公司	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.02.05	115.02.13								
				(115)聚圖字第2203-020503號	貞誠公(花圖)字第1150213003號								
				審查中	同意審定								
30	陸上型揚水泵浦(全不鏽鋼直立式揚水泵)-黑牛企業有限公司(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.03.13	115.03.18								
				(115)聚圖字第2203-031304號	貞誠公(花圖)字第1150318001號								
				審查中	同意審定								
31	接線裝置(插座)及照明控制開關-台灣松下電材股份有限公司(第一版)(第一次修正)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.03.31	115.04.02	115.04.14							
				(115)聚圖字第2203-033102號	貞誠公(花圖)字第1150402002號	(115)聚圖字第2203-041404號							
				審查中	檢退	審查中							
32	溫熱水飲水機設備(賀眾牌)-賀安企業股份有限公司(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.04.14	115.04.14								
				(115)聚圖字第2203-041402號	梁備字第1150414-1號								
				審查中	同意審定								
33	分電箱(MRS總集中監控盤)-盛廣工業股份有限公司(第一版)	廠商應按契約規定於各分項工程開始施工日前30日提送分項施工計畫書、分項品質計畫書、該分項工程之材料及設備送審作業		115.04.14	115.04.15								
				(115)聚圖字第2203-041403號	梁備字第1150415-2號								
				審查中	同意審定								

結論說明:本案自開工111/10/11起除每月月報外統包商共計辦理 **114項** 契約應辦事項目前共有 **0件** 逾期提送、**74件**核定後機關同意備查、**建築執照**已於112年10月16日取得。細部設計第三階段持續辦理中。

未來半年監造執行重點

- (一) 115年04月30日~115年08月31日 室外裝修(含粉刷及仿石漆)
- (二) 115年04月30日~115年05月08日 室內裝修-輕隔間(1F~RF)
- (三) 115年04月30日~115年06月30日 室內裝修-粉刷及水泥漆(1F~RF)
- (四) 115年04月30日~115年09月17日 室內裝修-木作及水泥漆(1F~RF)
- (五) 115年04月30日~115年09月22日 室內裝修-天花版工程(1F~RF)
- (六) 115年04月30日~115年09月14日 室內裝修-地坪工程(1F~RF)
- (七) 115年04月30日~115年09月17日 景觀工程



防水隔熱工程施工抽查紀錄表

編號：

工程名稱	花蓮縣新建圖書館統包工程			
分項工程名稱	防水工程 查驗 4F			
抽查位置	A~B/2 (男廁-A區)	檢查日期	115年01月15日	
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢查			
抽查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目			
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	
施工前	承商是否辦理自主檢查	承商有無檢附自主檢查表	已檢附自檢表 ○	
施工中	施工範圍是否清理乾淨	現場無突出物	平整 ○	
	施工面是否乾燥	施工面不積水	乾燥無積水 ○	
	轉角處是否圓角及補強	抗裂纖維網鋪貼(10+10cm) 轉角處圓角	現場施作符合 ○	
	底塗施作	<input type="checkbox"/> 滲透結晶型防水材料 1層 <input checked="" type="checkbox"/> 壓克力樹脂改質劑 1層 <input type="checkbox"/> PU底油 1層	底塗壓克力樹脂層 ○	
	面塗施作	<input type="checkbox"/> 無毒性硬質高分子防水膠 2層 <input checked="" type="checkbox"/> 高分子彈性防水材料 2層 <input type="checkbox"/> 防水膠嵌縫 2層	面塗高分子防水材料 2層 ○	
	隔離層厚度及是否完整	PS隔熱板5cmTH		
	屋頂防水抗裂網材質	點焊鋼絲網 20cmx20cmx0.4cm		
施作面滲漏測試	<input type="checkbox"/> 室內試水靜置 100 小時 <input type="checkbox"/> 屋頂試水靜置 72 小時 <input type="checkbox"/> 其他 48 小時			
現場垃圾	清除	現場垃圾清除	○	
施工後	施工完成面	目視確認	目視無滲漏無孔洞 ○	
	現場垃圾	清除	現場垃圾清除 ○	

缺失複查結果：
已完成改善（檢附改善前中後照片）
未完成改善，填至「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： 簽名：

備註：

- 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
- 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。
- 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後真實記載簽認。
- 4.檢查項目註記“*”者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。

監造主任簽名：

王潤元 115.01.15

監造現場人員簽名：

王騰宏 01/15

施工照片查驗紀錄表


4F 防水工程查驗


工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

日期：115.01.15



備註：本表亦適用於各項施工查驗表單之佐證資料，並由監造工地現場人員實地檢查後真實記載簽認。



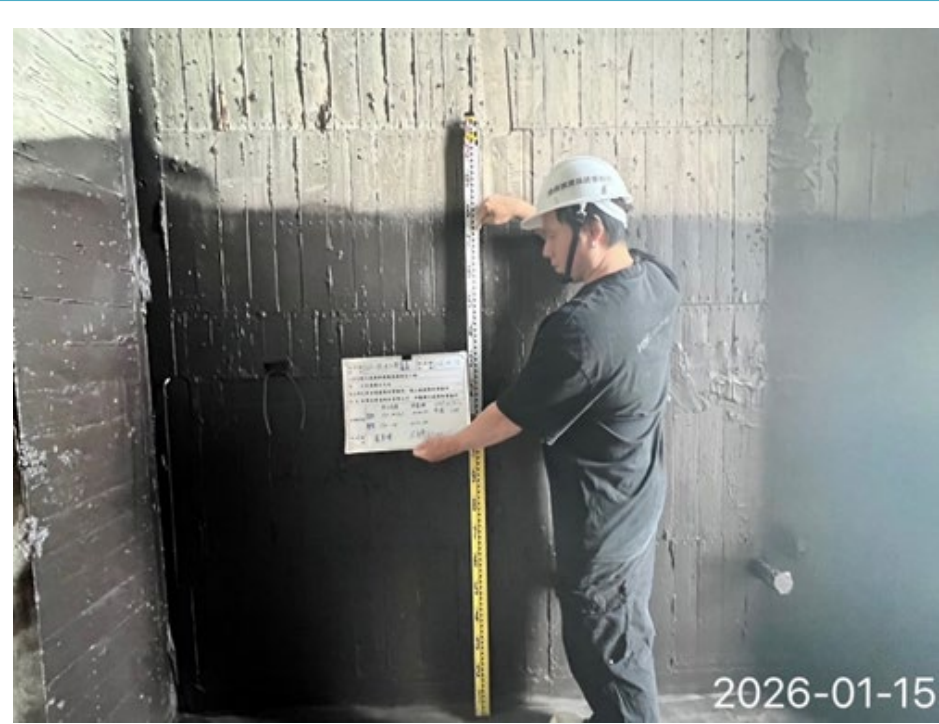


115.01.15
 4F防水工程查驗




115.03.14
 4F泥作灰誌放樣查驗



115.04.16
 3F鋁門窗工程查驗

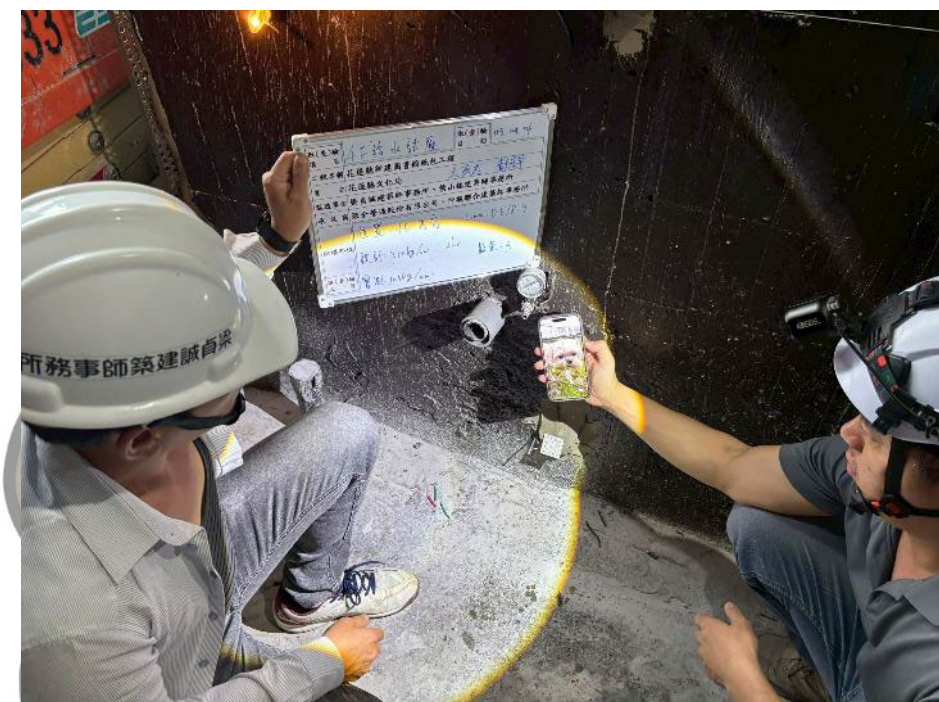

115.04.14
 4F給水試壓查驗

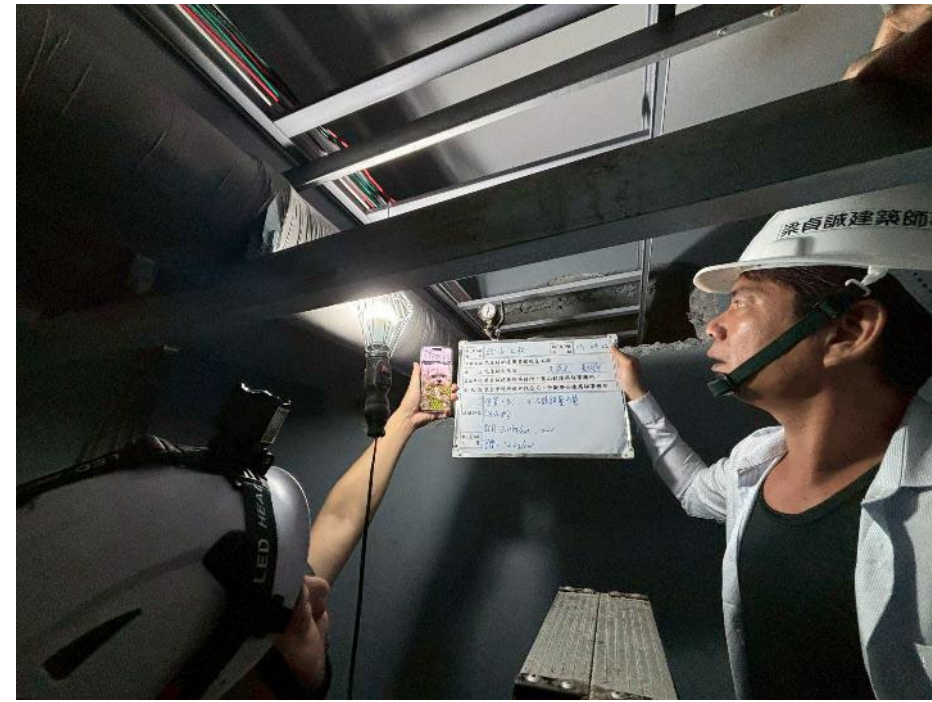

115.04.22
 B1污水池給水試壓查驗




115.04.22
 B1電力系統查驗(線槽)



114.11.21
防水材料進場查驗



115.02.04
客梯及貨梯電梯材料進場查驗

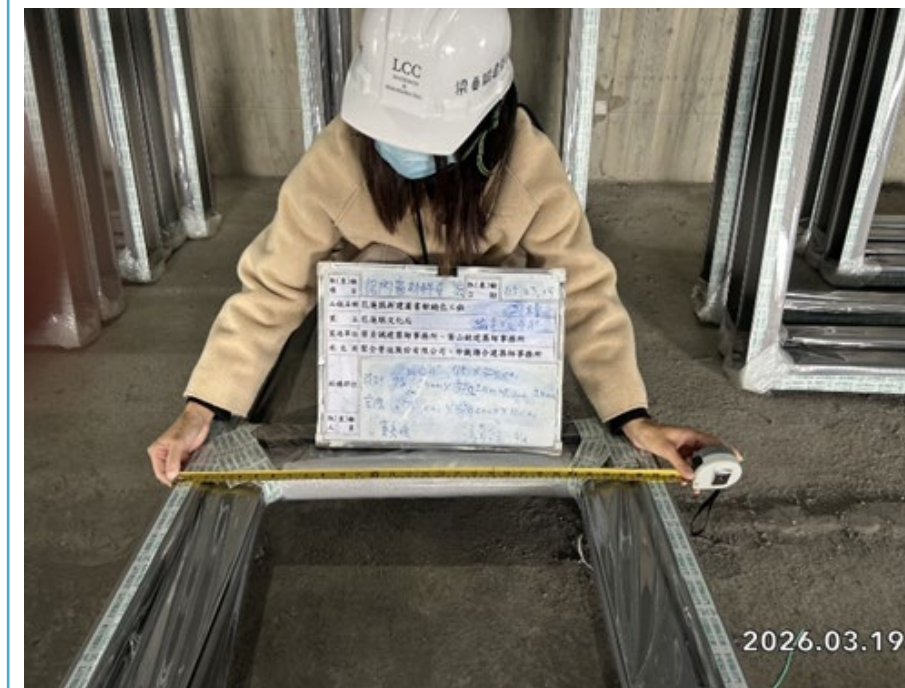

115.03.19
4F鋁門窗材料進場查驗



115.03.03
全熱交換器材料進場查驗




115.03.05
電線及電纜 (600V 380°C 15分耐熱線)材料進場查驗




115.03.20
鋁製電纜托架材料進場查驗

近半年民意調查問卷 統計結果 (政風室)


性別-42則回應




年齡-42則回應




職業-42則回應




是否支持本局成立機關採購廉政平臺-42則回應




是否清楚本局已於官網設置工程廉政平臺專區-42則回應




是否願意於廉政平臺專區獲取工程最新資訊-42則回應



是否同意重大公共工程成立廉政平臺能降低外力不當干涉-42則回應




是否同意重大公共工程成立廉政平臺能提昇工程整體品質-42則回應



如遇公務員涉犯貪瀆不法案件，是否願意向政風機構
檢舉反映-42則回應

願意
11.9%



非常願意
88.1%

網路問卷建議事項：無。

廉政倫理事件（請託關說、飲宴應酬、財物饋贈）：無。

民眾陳情投訴事件：

- 1.現任圖書館B1區櫃台圖書館館員態度很差，詢問相關借閱問題時，口氣很差、很不耐煩，斜眼瞪人，好像很瞧不起人的樣子～讓人感覺很冒犯不舒服。
- 2.將原館藏所有圖書（包括這幾年因改建遷移下架的項目）全部重新上架，編列經費修理演藝廳前的玻璃門及通往樓下書庫的階梯。

提案討論

提案一

案由：為確保官網廉政平臺專區各項工程適時公開，建請業務單位針對每月工作報告、縮時攝影及檢驗報告等文件，能即時上傳更新。

提案單位：政風室

說明：

- 一、依據本廉政平臺實施計畫目的之一，在於透過機關網站適時主動公開資訊落實行政透明，先予敘明。
- 二、目前本局官網廉政平臺專區公開之每月工作報告及檢驗報告等文件，均至114年8月，縮時攝影檔案僅至114年第2季，資料距今已逾半年。

辦法：

- 一、為符合廉政平臺成立目的，適時公開工程相關文件與進度，建請業務科針對已核定之文件，即時上傳官網廉政平臺專區更新資料。

提案二

案由：為紀錄本案工程期間執行團體施工狀況、廉政平臺運作情形，建議視經費狀況籌劃拍攝紀錄短片，保存工程紀實與推廣廉政平臺執行成效。

提案單位：政風室

說明：

- 一、本案工程規模為近年來本縣重大公共工程，亦為推動成立廉政平臺首例，設計與施工團隊多年辛勞值得予以紀錄留念，而本案推動廉政平臺執行多年，結果相關機關定期召開聯繫會研究提升與保障工程品質措施，亦有成效，先予敘明。
- 二、為詳實紀錄本案施工期間工程團隊之辛勞，與留存廉政平臺推廣執行之成效，可做為日後落成啟用典禮播放表揚，亦可提供予日後本縣其他重要工程做為借鏡，參考成立廉政平臺，維護本縣各項重要公共工程施工品質，和政府機關工程採購案件清廉施政之形象。

辦法：

- 一、考量拍攝紀錄短片需由專業團隊製作，建請業務科先行評估工程剩餘經費或利用工程管理費，會請藝文推廣科推薦適合廠商或協助估價。
- 二、若預算經費允許，建請委由圖書管理科召商辦理紀錄短片拍攝工作，有關短片拍攝腳本內容可視需求，召集施工團隊、行政科與本室共同協商後，簽報鈞長定案。

臨時動議

會議結束
