

8月鋼筋試驗報告紀錄表

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

承攬廠商：聚全營造股份有限公司

項次	類別	取樣位置	取樣日期	取樣數量 (組)	爐號	試驗日期	試驗報告	試驗 結果	備註
1	結構體工程	B1F~1F	113/05/31	1	CW1205060	113/06/13 113/06/14	2402914	合格	SD420W D25母材 拉伸試驗 #8
				6	0159401 0158444				SD420W D25單向 拉伸及滑動 #2
				4	ZW1122020				SD420W D32母材 拉伸試驗 #12
				23	0159341 0158600				SD420W D32單向 拉伸及滑動 #6
				4	0159341 0158601				SD420W D32高塑 性反覆負載 #10
2	地下結構體工程	BS版	113/06/17	2	ZX0117017	112/06/20	24S03458	合格	SD420W D13 #4
3	地下結構體工程	BS版、預留筋	113/06/19	1	3518	113/06/20	24S03534	合格	SD420W D10 #3
				1	4866				SD420W D13 #4
				1	ZW1111014				SD420W D16 #5
				1	8733				SD420W D25 #8
4	地下結構體工程	B1F柱	113/07/12	1	3411	113/07/16	24S04152	合格	SD420W D10 #3
				1	4982				SD420W D13 #4
				1	4678				SD420W D13 #4
				1	5871				SD420W D16 #5
				1	6781				SD420W D19 #6
				1	8733				SD420W D25 #8
				1	1644				SD420W D32 #10
				1	1744				SD420W D32 #10





8月工地密度試驗報告紀錄表

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

承攬廠商：聚全營造股份有限公司

項次	類別	取樣位置	取樣日期	取樣數量 (組)	試驗日期	試驗報告	試驗 結果	備註
1	地下結構體工程	外梯01	113/05/29	2	113/05/29- 113/05/30	24S02987	合格	
		車道						



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.



精確・真實・公正・服務

今塘工程顧問有限公司 台北實驗室

LEO LABORATORY ENGINEERING OFFICE



鋼筋續接器接合鋼筋試驗報告

試驗地址：台北市塔悠路205號
電話：(02)2715-3011

Address: NO.205, Tayou Rd, Taipei Taiwan
Tel: (02)2715-3011

本報告共 4 頁 第 1 頁

報告編號: 2402914

壹、案件說明

委託單位：花蓮縣文化局/梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所/
地址：聚全營造股份有限公司
NA/NA/NA

報告日期: 113/6/14

測試時間: 113/6/13 10:47~
113/6/14 10:34

業主：花蓮縣文化局

完成收件時間: 113/6/5 13:43

監造單位：梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所

種類/型式：摩擦銲接

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

試驗等級：SA級

施工位置：第一階段B1F~1F主筋續接器

承包商：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

供料商：旭悅鋼鐵有限公司、東和鋼鐵企業股份有限公司

送驗人員：花蓮縣文化局-郭苓珊
梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所-高綸宇
聚全營造股份有限公司-莫彥浩

取樣人員：花蓮縣文化局-郭苓珊
梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所-高綸宇
聚全營造股份有限公司-莫彥浩

會驗者簽名欄：梁貞誠建築師事務所-孟幼琳 06150957
聚全營造股份有限公司-莫彥浩 06150957

貳、樣品名稱：鋼筋續接器

- 母材：#8-1支、#10-4支
- 續接器：#8-6支、#10-27支

參、試驗規範：公共工程委員會公共工程施工綱要規範第03210章2.2.2節(2018)

肆、試驗方法(SA級)：

- 母材基本拉伸試驗依CNS560「鋼筋混凝土用鋼筋」
- 單向拉伸及滑動試驗試驗：0 → 0.6 P_y → 0.02 P_y → 拉至破壞
- 高塑性反復負載試驗：
0 → (0.95 P_y ↔ -0.5 P_y)_{16回} → (6 δ_y ↔ -0.5 P_y)_{8回} → (12 δ_y ↔ -0.5 P_y)_{8回} → 拉至破壞
* * 母材標稱直徑：25.4mm、32.2mm
鋼筋種類：CNS 560 SD420W，D25、D32
母材標稱降伏f_yn：420 N/mm²~540 N/mm²

伍、儀器與量測設備：

- 加載試驗機：係採用本實驗室之鋼筋續接器動態試驗機配合油壓夾具。
- 延伸計(長度變化量測設備)：
係以特製量具(MITUTOYO光電感應延伸計)LVDT-2支鎖緊於鋼筋上連接電腦，量具解析度0.001mm，
試驗時以此設備直接測量變形量。
- 鋼筋續接器續接性能試驗之量測長度(gage length)L_g取續接器長度加續接器兩側各2d_b，
夾距長度為續接器長度兩側各加6d_b。
續接器設於量測長度之中央位置。

#8、#10 續接器 L_g=180mm、230mm

報告簽署人：

檢驗報告判定審核章

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程
廠商名稱：聚全營造股份有限公司
試驗結果：☒符合 ☐不符合
契約規範，如有偽造文書情事，均由文件上
公司及簽名人員負刑事及民事所有責任。
判讀依據即符合情況：CNS第03210章CNS 560

郭苓珊
如同

邱柏如
0808
柏邱

檢驗報告判定審核章

監造單位：梁貞誠建築師事務所
本件業經核對無誤並符合
契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上
公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

監造單位核判人員簽名：
☒合格 ☐不合格



章 蘇 審 案 詳 告 聯 創	
對 工 司 經 理 處 經 辦 處 辦 事 處 辦 事 處 辦 事 處	辦 事 處 辦 事 處 辦 事 處 辦 事 處 辦 事 處
合 辦 不 同 合 辦 不 同 合 辦 不 同 合 辦 不 同 合 辦 不 同	合 辦 不 同 合 辦 不 同 合 辦 不 同 合 辦 不 同 合 辦 不 同
。 且 經 查 所 屬 另 外 處 理 員 人 等 數 以 同 公	
： 經 辦 合 辦 組 織 均 屬 詳	

章 蘇 審 案 詳 告 聯 創	
所 辦 事 務 業 務 經 辦 員 業 務 經 辦 員 業 務 經 辦 員	業 務 經 辦 員 業 務 經 辦 員 業 務 經 辦 員 業 務 經 辦 員
合 辦 並 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦	辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦 辦
。 且 經 查 所 屬 另 外 處 理 員 人 等 數 以 同 公	
： 經 辦 合 辦 組 織 均 屬 詳	



精確・真實・公正・服務

今塘工程顧問有限公司 台北實驗室

LEO LABORATORY ENGINEERING OFFICE

鋼筋續接器接合鋼筋試驗報告



陸、試驗數據分析與結果

報告編號:2402914

一、**母材**基本拉伸試驗

本報告共 4 頁 第 2 頁

試片稱號	降伏強度 f_{ya} (N/mm^2)	抗拉強度 f_{ua} (N/mm^2)	f_{ua}/f_{ya}	伸長率 ϵ_{ua} (%)	降伏應變 ϵ_{ya} (%)
D25	468	650	1.39	23	0.2350
D32-1	453	631	1.39	26	0.2276
D32-2	463	637	1.38	23	0.2325
D32-3	456	629	1.38	23	0.2291
D32-4	454	627	1.38	22	0.2281
CNS 560 SD420W 規範值	≥ 420 & ≤ 540	≥ 550	≥ 1.25	≥ 14	—

二、**單向拉伸及滑動試驗 - 續接器**

試片稱號	滑動量 (δ_s) $0.6 f_y$ (mm)	抗拉強度 f_{uc} (N/mm^2)	f_{uc}/f_y	續接處外鋼筋之 伸長率 ϵ_{su} (%)	破壞模式
D25-1	0.037	681	1.62	20	斷在續接處外14cm
D25-2	0.014	662	1.58	19	斷在續接處外16cm
D25-3	0.018	657	1.56	28	斷在續接處外13cm
D25-4	0.036	679	1.62	23	斷在續接處外14cm
D25-5	0.018	670	1.60	23	斷在續接處外18cm
D25-6	0.014	677	1.61	24	斷在續接處外16cm
D32-1	0.023	653	1.55	29	斷在續接處外13.5cm
D32-2	0.018	652	1.55	31	斷在續接處外9cm
D32-3	0.023	654	1.56	26	斷在續接處外14cm
D32-4	0.007	652	1.55	29	斷在續接處外11cm
D32-5	0.002	654	1.56	28	斷在續接處外10.5cm
D32-6	0.036	651	1.55	28	斷在續接處外9.5cm
D32-7	0.002	652	1.55	28	斷在續接處外9.5cm
規範值	≤ 0.1 ✓	≥ 550 ✓	≥ 1.25 ✓	≥ 14 ✓	

報告簽署人：

呂學榮



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings. The names are listed in alphabetical order of the last name. The names are: [illegible]



精確・真實・公正・服務

今塘工程顧問有限公司 台北實驗室

LEO LABORATORY ENGINEERING OFFICE



鋼筋續接器接合鋼筋試驗報告

陸、試驗數據分析與結果

報告編號:2402914


二、單向拉伸及滑動試驗 - 續接器

本報告共 4 頁 第 3 頁

試片稱號	滑動量 (δ_s) 0.6 f_y (mm)	抗拉強度 f_{uc} (N/mm ²)	f_{uc}/f_y	續接處外鋼筋之 伸長率 ϵ_{su} (%)	破壞模式
D32-8	0.001	653	1.55	27	斷在續接處外12.5cm
D32-9	0.004	652	1.55	29	斷在續接處外12cm
D32-10	0.007	652	1.55	27	斷在續接處外13.5cm
D32-11	0.019	652	1.55	23	斷在續接處外5cm
D32-12	0.041	652	1.55	26	斷在續接處外14.5cm
D32-13	0.025	651	1.55	27	斷在續接處外12cm
D32-14	0.010	654	1.56	28	斷在續接處外8cm
D32-15	0.054	651	1.55	26	斷在續接處外7cm
D32-16	0.018	653	1.55	29	斷在續接處外10.5cm
D32-17	0.004	652	1.55	29	斷在續接處外13.5cm
D32-18	0.001	652	1.55	23	斷在續接處外16.5cm
D32-19	0.069	654	1.56	28	斷在續接處外13cm
D32-20	0.017	653	1.55	29	斷在續接處外14cm
D32-21	0.009	653	1.55	27	斷在續接處外14cm
D32-22	0.024	651	1.55	27	斷在續接處外13.5cm
D32-23	0.030	658	1.57	23	斷在續接處外8cm
以下空白					
規範值	$\leq 0.1 \checkmark$	$\geq 550 \checkmark$	$\geq 1.25 \checkmark$	$\geq 14 \checkmark$	

報告簽署人：

呂守榮





精確・真實・公正・服務

今塘工程顧問有限公司 台北實驗室

LEO LABORATORY ENGINEERING OFFICE

鋼筋續接器接合鋼筋試驗報告



陸、試驗數據分析與結果

報告編號:2402914

三、高塑性反復負載試驗

本報告共 4 頁 第 4 頁

(彈性模數 $E_j = 29323 \text{ kgf/mm}^2$ 、 23001 kgf/mm^2 、 19375 kgf/mm^2 、 25304 kgf/mm^2)

試片稱號	(δs)16c (mm)	(δs)24c (mm)	δs 32c (mm)	抗拉強度 f_{uc} (N/mm^2)	f_{uc}/f_y	續接處外鋼筋 之伸長率 ϵ_{su} (%)	破壞模式
D32-SA24	0.059	0.198	0.245	657	1.56	25	斷在續接處外9cm
D32-SA25	0.001	0.135	0.176	662	1.58	24	斷在續接處外8cm
D32-SA26	0.065	0.255	0.285	662	1.58	24	斷在續接處外13cm
D32-SA27	0.033	0.194	0.215	662	1.58	24	斷在續接處外10cm
以下空白							
規範值 (SA級)	$\leq 0.3 \checkmark$	$\leq 0.9 \checkmark$	$\leq 1.8 \checkmark$	$\geq 550 \checkmark$	$\geq 1.25 \checkmark$	$\geq 14 \checkmark$	——

※本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

附 (1)收件場所: ☐實驗室 ☐工地收件 ☒郵遞收件 ☐其他。

(2)本試驗件由委託者提供,所列記錄僅對送驗樣品負責。

(3)本試驗對外僅供參考,並不得作為商業廣告及法律訴訟之證明。

註 (4)本報告若有提供規範值時係依顧客之要求依該試驗規範載入,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為主。

(5)本報告不得塗改及摘錄複製,未蓋鋼印無效。

(6)轉送來源單位世昌檢驗科技有限公司工程材料實驗室以郵遞收件,壹、案件說明欄位係依據該實驗室鋼筋續接器試驗委託單繕打。

報告簽署人:

呂學榮



11

11

11

花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋取樣



日期：113 年 05 月 31 日

位置：旭悅鋼鐵有限公司

備註：

鋼筋續接器及母材 SD420W
D25*1、SD420W D32*4 取樣。



日期：113 年 05 月 31 日

位置：旭悅鋼鐵有限公司

備註：

鋼筋續接器及母材取樣。



日期：113 年 05 月 31 日

位置：旭悅鋼鐵有限公司

備註：

鋼筋續接器及母材取樣，
SD420W D25*1(母材)，共計 1
組。
SD420W D25*6(續接器)，共計
6 組。
SD420W D32*4(母材)，共計 4
組。
SD420W D32*27(續接器)，共計
27 組。

花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋抗拉、抗彎試驗




日期：113 年 06 月 13 日

位置：今塘工程顧問有限公司
台北實驗室

備註：

續接器單向拉伸及滑動試驗。

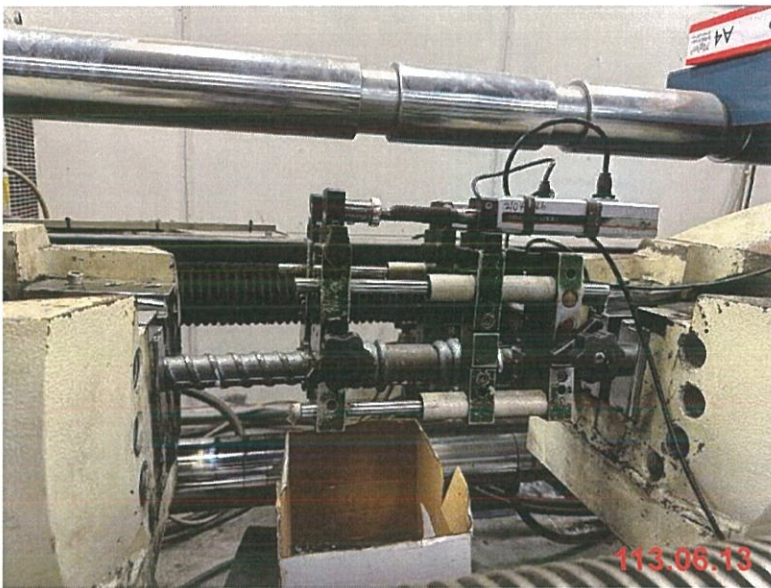


日期：113 年 06 月 13 日

位置：今塘工程顧問有限公司
台北實驗室

備註：

續接器單向拉伸及滑動試驗。

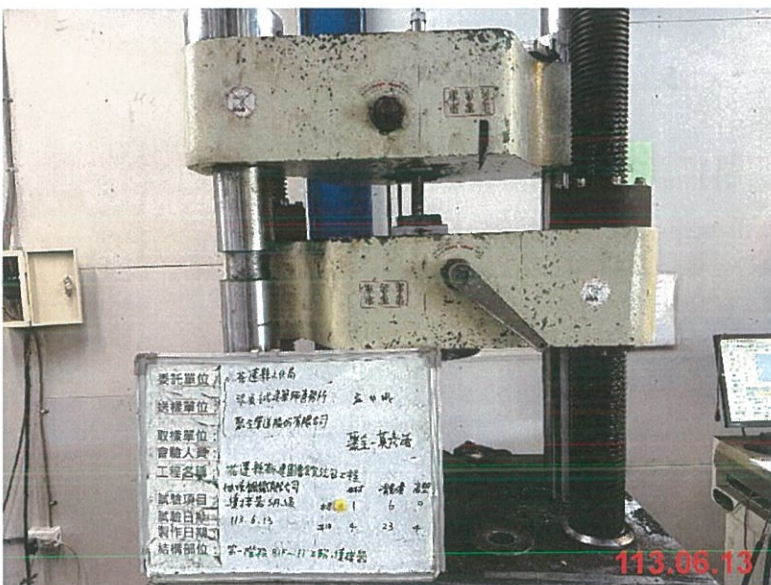

日期：113 年 06 月 13 日


位置：今塘工程顧問有限公司
台北實驗室

備註：

母材基本拉伸試驗。

花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋抗拉、抗彎試驗

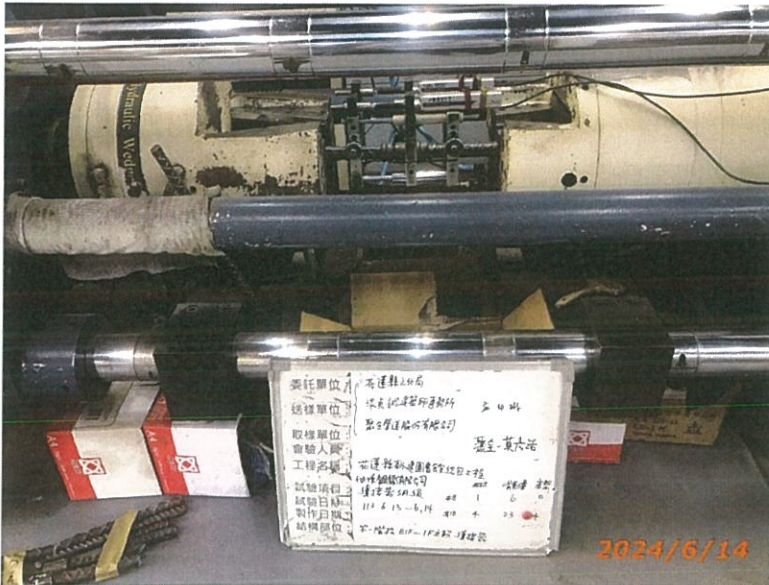

日期：113 年 06 月 14 日

位置：今塘工程顧問有限公司
台北實驗室

備註：

續接器單向拉伸及滑動試驗。



日期：113 年 06 月 14 日

位置：今塘工程顧問有限公司
台北實驗室

備註：

續接器單向拉伸及滑動試驗。



日期：113 年 06 月 14 日

位置：今塘工程顧問有限公司
台北實驗室

備註：

續接器試驗後。

2

1

世昌檢驗科技有限公司 工程材料實驗室



實驗室地址：花蓮縣吉安鄉民治路351號

電話：(03)8463972 傳真：(03)8463975

鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告

* 工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

報告編號：24S03458

* 業主：花蓮縣文化局

頁次：第01頁；共01頁

* 監造單位：梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所

收件日期：113/06/18 08:35

* 承包商：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

試驗日期：113/06/20 14:16

* 委託單位：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

報告日期：113/06/20

* 聯絡資訊：NA

* 結構部位：BS版

* 取樣人員：文化局-郭苓珊；事務所-潘書庭；聚全-高郁茹

送驗人員：聚全-高郁茹

送驗時間：113/06/18 08:35

會驗人員：文化局-郭苓珊；事務所-潘書庭；聚全-高郁茹

會驗時間：113/06/20 14:16

檢驗報告判定審核章

監造單位：梁貞誠建築師事務所
 本件業經核對無誤並符合
 契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上
 公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

監造單位簽判人員簽名：潘書庭

合格 ☒ 不合格 ☐

試驗方法：CNS 560：2018

日期：113/06/17

漢泰鋼鐵廠股份有限公司

試樣編號 (*爐號)	鋼筋 規格	節高 平均值 (mm)		節距 平均值 (mm)		間隙寬 平均值 (mm)		單位 質量 (kg/m)	降伏點 N/mm ²	抗拉 強度 N/mm ²	伸長率 %	拉降比	斷點 區域	彎曲 試驗 (180°)
	稱號	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗	試驗
	符號	*規範值		*規範值		*規範值		*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	結果	結果
ZX0117017	D13	0.7	0.7	8.1	8.1	2.2	2.2	1.01	455	624	27	1.37	B區	無裂痕
	SD420W	0.5~1.0		≤8.9		≤5.0		0.934~1.05	420~540	550以上	13以上	1.25以上		
ZX0117017	D13	0.9	0.8	8.2	8.2	2.8	2.8	1.01	452	623	27	1.38	A區	無裂痕
	SD420W	0.5~1.0		≤8.9		≤5.0		0.934~1.05	420~540	550以上	13以上	1.25以上		
以下空白														

檢驗報告判定審核章

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

廠商名稱：聚全營造股份有限公司

試驗結果：☒符合 ☐不符合

契約規範：如有偽造文書情事，均由文件上

公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

判讀依據即符合情況：符合CNS 560

附註：(1). 本實驗室報告不具符合性聲明；若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

(2). 本報告結果僅適用於收取的樣品，另未經書面許可，不可部分複製。

(3). 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室；"*"部分為實驗室依據顧客所提供之資料登載。

(4). 執行試驗場所同實驗室地址。

邱柏宏
0805


報告簽署人



章時審字許吉聯錄錄

附錄中明樂數類真樂：卦單並益
合替並知無後難難業特本
土有文由興，章謝書文並謝書哈，家照廣照照照
。到貴許酒車月不重所負員人各養其其陸公
：各務員人其養其其陸公
聯合不 ☐ 聯合 ☐

章時審字許吉聯錄錄
附錄中明樂數類真樂：卦單並益
合替並知無後難難業特本
土有文由興，章謝書文並謝書哈，家照廣照照照
。到貴許酒車月不重所負員人各養其其陸公
：各務員人其養其其陸公
聯合不 ☐ 聯合 ☐



花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋取樣



日期：113 年 06 月 17 日

位置：工區現場

備註：

BS 版鋼筋取樣。



日期：113 年 06 月 17 日

位置：工區東側工務所前

備註：

BS 版鋼筋取樣。



日期：113 年 06 月 17 日

位置：工區東側工務所前

備註：

BS 版鋼筋取樣，SD420W

D13*2，共計 2 組。

花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋抗拉、抗彎試驗



日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版鋼筋抗拉試驗。



日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版鋼筋抗彎試驗。




日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版鋼筋抗拉、抗彎試驗後。



世昌檢驗科技有限公司 工程材料實驗室



實驗室地址：花蓮縣吉安鄉民治路351號
電話：(03)8463972 傳真：(03)8463975

鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告

* 工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

報告編號：24S03534

* 業主：花蓮縣文化局

頁次：第01頁；共01頁

* 監造單位：梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所

收件日期：113/06/19 16:10

* 承包商：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

試驗日期：113/06/20 14:28

* 委託單位：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

報告日期：113/06/20

* 聯絡資訊：NA

試驗方法：CNS 560：2018

* 結構部位：BS版、預留筋

* 取樣日期：113/06/19

* 取樣人員：聚全-莫彥浩

* 供料廠商：D10、D13、D25為
宜聯鋼鐵股份有限公司，D16為漢泰
鋼鐵股份有限公司

送驗人員：文化局-郭苓珊；事務所-潘書庭；聚全-莫彥浩

送驗時間：113/06/19 16:10

會驗人員：文化局-郭苓珊；事務所-潘書庭；聚全-高郁茹

會驗時間：113/06/20 14:28

檢驗報告判定審核章

監造單位：梁貞誠建築師事務所

本件業經核對無誤並符合
契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上
公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

監造單位複判人員簽名：

☒合格 ☐不合格

潘書庭

試樣編號 (*爐號)	鋼筋 規格	節高 平均值 (mm)		節距 平均值 (mm)		間隙寬 平均值 (mm)		單位 質量 (kg/m)	降伏點 N/mm ²	抗拉 強度 N/mm ²	伸長率 %	拉降比	斷點 區域	彎曲 試驗 (180°)
	稱號	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗	試驗
	符號	*規範值		*規範值		*規範值		*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	結果	結果
1 (3518)	D10 SD280W	0.5	0.6	6.1	6.1	2.7	2.7	0.551	375	495	26	1.32	B區	無裂痕
		0.4~0.8 ✓		≤6.7 ✓		≤3.7 ✓		0.526~0.594	280~380	420以上	18以上	1.25以上		
2 (4866)	D13 SD420W	0.8	0.8	8.1	8.1	3.2	3.1	0.974	492	688	15	1.40	B區	無裂痕
		0.5~1.0 ✓		≤8.9 ✓		≤5.0 ✓		0.934~1.05	420~540	550以上	13以上	1.25以上		
3 (1111014)	D16 SD420W	0.9	1.0	10.4	10.4	3.8	3.8	1.56	483	657	22	1.36	B區	無裂痕
		0.7~1.4 ✓		≤11.1 ✓		≤6.2 ✓		1.48~1.64	420~540	550以上	13以上	1.25以上		
4 (8733)	D25 SD420W	1.7	1.8	16.4	16.5	3.3	3.4	4.05	482	669	22	1.39	B區	無裂痕
		1.3~2.6 ✓		≤17.8 ✓		≤10.0 ✓		3.78~4.18	420~540	550以上	14以上	1.25以上		
以下空白														

檢驗報告判定審核章

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

廠商名稱：聚全營造股份有限公司

試驗結果：☒符合 ☐不符合

契約規範：如有偽造文書情事，均由文件上

公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

判讀依據即符合情況：符合CNS 560:2018

如不符，請於2024年6月25日前

提出異議，逾期不予受理。

如無異議，請於2024年6月25日前

簽名確認，逾期不予受理。

簽名：高郁茹

日期：113/06/20

地點：世昌檢驗科技有限公司

簽名：高郁茹

附註：(1). 本實驗室報告僅供參考，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

(2). 本報告結果僅適用於收取的樣品，另未經書面許可，不得部分複製。

(3). 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室；"*"部分為實驗室依據顧客所提供之資料登載

(4). 執行試驗場所同實驗室地址。

邱柏松
0805
柏邱
凱

報告簽署人



章刻審家伴吉聯銀銀

內附車輪藥對編頁樂益單查證
合部並販藥機蘇熟養料本
土料文由與，有部書文動機商味，支與蘇熟機
。拍賣部部用茶葉計自買入各得其及佳公

各從得入性書對單件書
聯合不 ☐ 聯合 ☐

章刻審家伴吉聯銀銀

蘇工部部用茶葉計自買入各得其及佳公
同，有部書文動機商味，支與蘇熟機
。拍賣部部用茶葉計自買入各得其及佳公
土料文由與，有部書文動機商味，支與蘇熟機
。拍賣部部用茶葉計自買入各得其及佳公



花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋取樣



日期：113 年 06 月 19 日

位置：工區東側材料放置區

備註：

BS 版、預留筋鋼筋取樣。



日期：113 年 06 月 19 日

位置：工區東側材料放置區

備註：

BS 版、預留筋鋼筋取樣。



日期：113 年 06 月 19 日

位置：工區東側工務所前

備註：

BS 版、預留筋鋼筋取樣，SD420W D10*1；SD420W D13*1；SD420W D16*1；SD420W D25*1，共計 1 組。

花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋抗拉、抗彎試驗



日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版、預留筋鋼筋抗拉試驗。



日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版、預留筋鋼筋抗彎試驗。



日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版、預留筋鋼筋抗拉、抗彎試驗後。



世昌檢驗科技有限公司 工程材料實驗室



實驗室地址:花蓮縣吉安鄉民治路351號

電話:(03)8463972 傳真:(03)8463975

鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告

* 工程名稱:花蓮縣新建圖書館統包工程

報告編號:24S04152

* 業主:花蓮縣文化局

頁次:第01頁;共02頁

* 監造單位:梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所

收件日期:113/07/12 16:10

* 承包商:聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

試驗日期:113/07/16 14:06

* 委託單位:聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

報告日期:113/07/16

* 聯絡資訊:NA

試驗方法:CNS 560:2018

* 結構部位:B1F柱牆

* 取樣日期:113/07/12

* 取樣人員:事務所-潘書庭;聚全-莫彥浩

* 供料廠商:旭悅鋼鐵有限公司

送驗人員:聚全-高郁茹

送驗時間:113/07/12 16:10

會驗人員:文化局-郭苓珊;事務所-潘書庭;聚全-高郁茹

會驗時間:113/07/16 14:06

試樣編號 (*爐號)	鋼筋規格	節高 平均值 (mm)		節距 平均值 (mm)		間隙寬 平均值 (mm)		單位 質量 (kg/m)	降伏點 N/mm ²	抗拉 強度 N/mm ²	伸長率 %	拉降比	斷點 區域	彎曲 試驗 (180°)
	稱號	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗	試驗
	符號	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	結果	結果
1 (3411)	D10 SD280W	0.6' / 0.4~0.8'	0.6' / 0.4~0.8'	6.1' / ≤6.7	6.1' / ≤6.7	2.4' / ≤3.7	2.4' / ≤3.7	0.555' / 0.526~0.594	372' / 280~380	509' / 420以上	29' / 18以上	1.37' / 1.25以上	A區	無裂痕
2 (4982)	D13 SD420W	0.9' / 0.5~1.0'	0.8' / 0.5~1.0'	8.3' / ≤8.9	8.3' / ≤8.9	2.5' / ≤5.0	2.5' / ≤5.0	0.997' / 0.934~1.05	481' / 420~540	649' / 550以上	25' / 13以上	1.35' / 1.25以上	B區	無裂痕
3 (4678)	D13 SD420W	0.9' / 0.5~1.0'	0.8' / 0.5~1.0'	8.3' / ≤8.9	8.3' / ≤8.9	2.5' / ≤5.0	2.5' / ≤5.0	0.998' / 0.934~1.05	474' / 420~540	655' / 550以上	25' / 13以上	1.38' / 1.25以上	B區	無裂痕
4 (5871)	D16 SD420W	1.1' / 0.7~1.4'	1.1' / 0.7~1.4'	10.5' / ≤11.1	10.4' / ≤11.1	3.6' / ≤6.2	3.6' / ≤6.2	1.55' / 1.48~1.64	465' / 420~540	637' / 550以上	25' / 13以上	1.37' / 1.25以上	B區	無裂痕
5 (6781)	D19 SD420W	1.8' / 1.0~2.0'	1.8' / 1.0~2.0'	12.6' / ≤13.3	12.6' / ≤13.3	4.9' / ≤7.5	4.9' / ≤7.5	2.28' / 2.14~2.36	456' / 420~540	668' / 550以上	15' / 13以上	1.47' / 1.25以上	C區	無裂痕
6 (8733)	D25 SD420W	2.0' / 1.3~2.6'	2.0' / 1.3~2.6'	16.3' / ≤17.8	16.3' / ≤17.8	3.9' / ≤10.0	4.0' / ≤10.0	3.97' / 3.78~4.18	476' / 420~540	649' / 550以上	17' / 14以上	1.36' / 1.25以上	B區	無裂痕
7 (1644)	D32 SD420W	2.6' / 1.6~3.2'	2.6' / 1.6~3.2'	19.7' / ≤22.6	19.7' / ≤22.6	4.9' / ≤12.6	4.9' / ≤12.6	6.27' / 6.13~6.65	465' / 420~540	644' / 550以上	21' / 14以上	1.38' / 1.25以上	B區	無裂痕

附註: 1. 本報告係根據客戶提供之樣品及規格進行試驗, 若客戶提供之規格與本報告所列規格不符時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果僅適用於此項工程, 另未經客戶許可, 不可部分複製。

3. 本報告係根據客戶提供之樣品及規格進行試驗, 若客戶提供之規格與本報告所列規格不符時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為主。

4. 本報告係根據客戶提供之樣品及規格進行試驗, 若客戶提供之規格與本報告所列規格不符時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為主。

契約規範: 如有偽造文書情事, 均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

判讀依據即符合情況: 113/03/21 CNS 560

報告簽署人

柏邱
0805



1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

實驗室地址：花蓮縣吉安鄉民治路351號
電話：(03)8463972 傳真：(03)8463975



花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋取樣



日期：113 年 07 月 12 日

位置：工區現場

備註：

B1F 柱鋼筋取樣。



日期：113 年 07 月 12 日

位置：工區現場

備註：

B1F 柱鋼筋取樣。



日期：113 年 07 月 12 日

位置：工區東側工務所前

備註：

B1F 柱鋼筋取樣，SD420W

D32*2；SD420W D25*1；SD420W

D19*1；SD420W D16*1；SD420W

D13*2；SD280W D10*1，共計 8

組。

花蓮縣新建圖書館統包工程

鋼筋抗拉、抗彎試驗



日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版鋼筋抗拉試驗。




日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版鋼筋抗彎試驗。

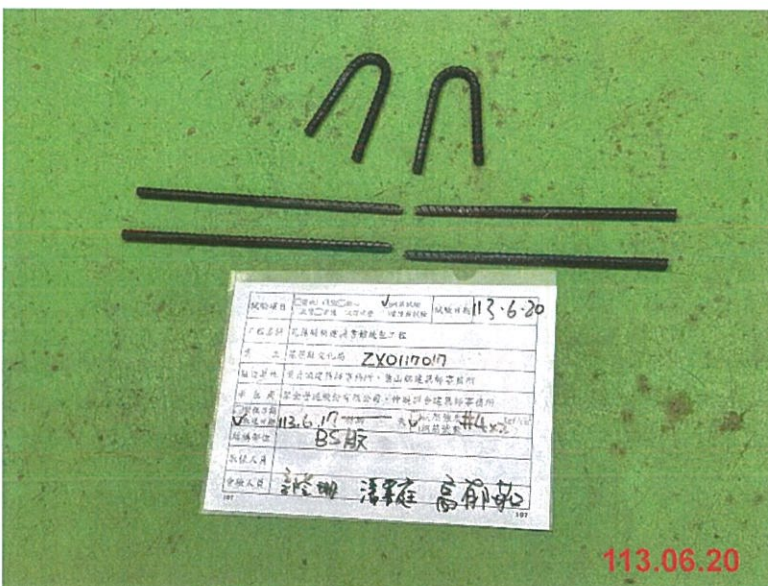

日期：113 年 06 月 20 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

BS 版鋼筋抗拉、抗彎試驗後。

世昌檢驗科技有限公司 工程材料實驗室



實驗室地址:花蓮縣吉安鄉民治路351號

電話:(03)8463972~3 傳真:(03)8463975

工地密度試驗報告

* 工程名稱: 花蓮縣新建圖書館統包工程

報告編號: 24S02987

* 業主: 花蓮縣文化局

頁次: 第02頁; 共02頁

* 監造單位: 梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所

收件日期: 113/05/29 14:25

* 承包商: 聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

試驗日期: 起 113/05/29 14:25
迄 113/05/30 09:36

* 委託單位: 聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

報告日期: 113/06/07

* 聯絡資訊: NA

試驗方法: CNS 14732: 2005
CNS 14733: 2005

* 結構部位: 取樣位置如下

品描述: 褐色土壤含礫石

* 取樣人員: 事務所-高倫宇; 聚全-莫

設計規範: $\geq 95\%$

會同人員: 事務所-高倫宇; 聚全-莫

會同時間: 113/05/29 14:25

檢驗報告判定審核章

監造單位: 梁貞誠建築師事務所

本件業經核對無誤並符合

契約規範規定, 如有偽造文書情事, 均由文件上

簽字及其簽名人員負刑事及民事所有責任

監造單位複判人員簽名: 潘雲友

☒合格 ☐不合格

樣品編號 (*取樣位置)	最大 粒徑 (in)	試驗 孔體積 (cm ³)	工地			留篩百分率 3/4" 篩 (%)	調整後 最大乾密度 kg/m ³	工地 壓實度 (%)
			乾密度 kg/m ³	濕密度 kg/m ³	含水量 (%)			
1. 外梯01 E Line 10 Line 車道	2"	2984	2123	2301	8.4	21.6	2175	98 ✓
2. E-F Line 8-9 Line	2"	3006	2070	2246	8.5	20.2	2170	95 ✓
以下空白								

附註:

* (1). 最佳含水量及最大乾密度引用世昌檢驗科技有限公司 工程材料實驗室(TAF 2887)

報告編號: 24S02987-P1 ; 報告日期: 113/06/07 ; 最佳含水量: 8 % ; 最大乾密度: 2100 kg/m³

(2). 調整公式為試驗室夯實試驗之最大乾密度調整至與工地試樣粗料含量相同之乾密度。

(3). 本報告結果僅適用於收取的試驗件, 未蓋報告章者無效, 另未經書面許可, 報告不得塗改及摘錄複製。

(4). 本實驗室報告不具符合性聲明; "*" 部分為實驗室依據顧客所提供之資訊登載。

(5). 試驗位置由顧客指定, 執行試驗場所: 23.9899939, 121.6291287。

(6). 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人



檢驗報告判定審核章

工程名稱: 花蓮縣新建圖書館統包工程

廠商名稱: 聚全營造股份有限公司

試驗結果: ☒符合 ☐不符合契約規範, 如有偽造文書情事, 均由文件上
公司及簽名人員負刑事及民事所有責任。

判讀依據即符合情況: 113/05/29




邱柏松
0805

章封官印

印信等項均加蓋印信
合併並無權無業利
土井文由中，專請官大印信等項，多與印信等項
。封貴官印信，用印信印信人各樣印信

印信人
印信人



章封官印

印信等項均加蓋印信：印信等項
印信等項均加蓋印信：印信等項
合併並無權無業利：合併並無權無業利
土井文由中，專請官大印信等項，多與印信等項
。封貴官印信，用印信印信人各樣印信
：印信等項均加蓋印信



花蓮縣新建圖書館統包工程

工地密度試驗




日期：113 年 05 月 29 日

位置：工區外梯 01

備註：

外梯 01 工地密度試驗。

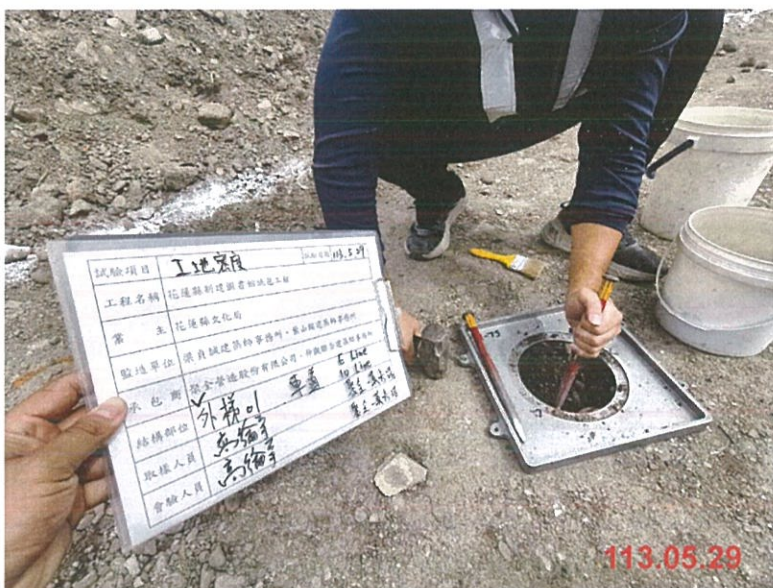

日期：113 年 05 月 29 日

位置：工區外梯 01

備註：

外梯 01 工地密度試驗。



日期：113 年 05 月 29 日

位置：工區外梯 01

備註：

外梯 01 工地密度試驗，共計 1 處。

花蓮縣新建圖書館統包工程

工地密度試驗



日期：113 年 05 月 29 日

位置：工區車道

備註：

車道工地密度試驗。




日期：113 年 05 月 29 日

位置：工區車道

備註：

車道工地密度試驗，共計 1 處。

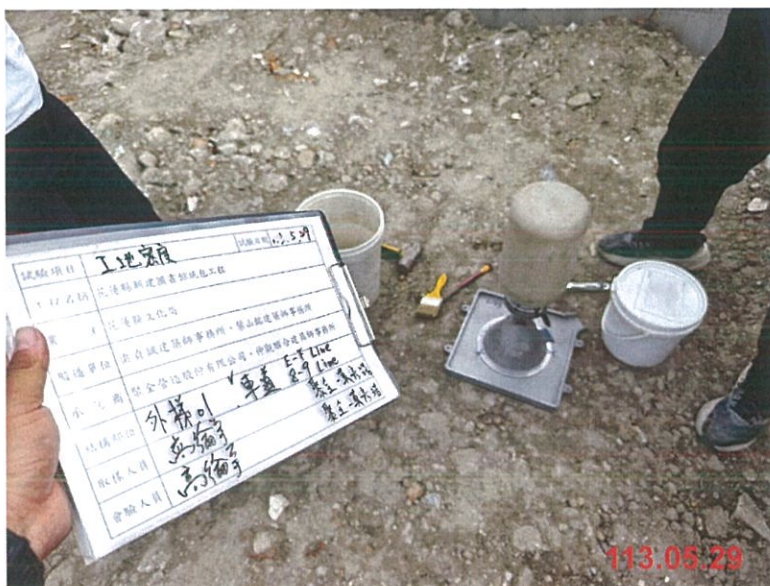

日期：113 年 05 月 29 日

位置：工區車道

備註：

車道工地密度試驗後。

10. 11. 1950

11. 11. 1950

12. 11. 1950

13. 11. 1950

14. 11. 1950

15. 11. 1950

16. 11. 1950

17. 11. 1950

18. 11. 1950

19. 11. 1950

20. 11. 1950
